

함께 여는 미래!
생동하는 당진

- 2023년 2분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과



당진시
[기획예산담당관]

【 목 차 】

■ 공약사항 자체 점검 결과

1. 공 약 사 항 이 행 현 황		1
2. 공 약 사 항 변 경 현 황		3
3. 공 약 사 항 세 부 현 황		5
4. 공 약 사 항 예 산 현 황		12
5. 공 약 사 항 향 후 계 획		13

■ 공약사항 추진실적 및 관리카드

1. 시 민 중 심 소 통 행 정		14
2. 활 력 있 는 당 진 경 제		21
3. 풍 요 로 운 농 어 촌		40
4. 생 활 속 의 문 화 · 체 육		69
5. 함 께 누 리 는 교 육 · 복 지		102
6. 살 기 좋 은 도 시 · 환 경		139

- 2023년 2분기 -

민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과

1 공약사항 이행현황

■ 분야별 : 6대 분야 91건

○ 완 료 : 8건 (8.8%) ※ 2023년 1분기 : 5건 (5.5%)

○ 정상추진 : 82건

○ 보 류 : 1건

구분	단위사업	완료			정상추진	일부추진	보류
		소계	완료	이행 후 계속추진			
합계	91	8	2	6	82	0	1
시민 중심 소통 행정	3	2	-	2	1	-	-
활력있는 당진 경제	9	0	-	-	9	-	-
풍요로운 농어촌	14	1	1	-	13	-	-
생활 속의 문화·체육	16	0	-	-	16	-	-
함께 누리는 교육·복지	17	4	-	4	13	-	-
살기 좋은 도시·환경	32	1	1	-	30	-	1

■ 완료 공약 목록

○ 완료

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
③-11	농업기술센터 조직개편	·농업정책과·축산지원과 본청 이관	'22.08.08.
⑥-32	산업단지 환경감시기구 설치	·환경관리사업소 신설 및 운영	'22.08.08.

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약명	추진내용	완료일자
①-2	시민 중심의 소통행정 강화	·함께여는 열린시정실 지속 운영 ·시민·단체 회의·간담 지속 운영	'23.06.30.
①-3	민원 처리 기간 획기적 개선	·허가과 폐지 ·복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	'22.10.01.
⑤-4	출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	·더모아센터 리모델링 준공	'23.01.17.
⑤-9	노인회 활동비 지원	·대한노인회 당진시지회 보조금 지급	'23.01.30.
⑤-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대	·경로당 260개소, 프로그램 30개 운영	'23.06.30.
⑤-17	주·야간 아동 전문 병동 설치	·소아 야간응급진료센터 운영 개시	'23.04.01.

■ 보류 공약 목록

관리번호	공약명	문제점 및 대책
⑥-22	시곡교차로 지하차도 건설	[문제점] 국도 병목지점 개선을 요청하였으나, 동 지역 위임국도는 원천 제적 대상이며, 시 재정으로 추진하기에는 재정부담이 크고, 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정(시곡동 → 송악읍)이 필요하나, 주민 반대 집단 민원 발생 [대 책] 장기적으로 국도 32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영하여 추진하거나, 단기적으로 도시계획도로(구 원용선) 조기 개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통 정체 해소 도모

2 공약사항 변경현황

■ 기타(추진목표 · 사업목표 · 사업주체 등)

관리번호	공약명	변경내용
2-6	현대제철 본사 이전	[사업비] 현대제철 본사와 협의 진행 중 (기존) 예산(민자 30,000백만원) (변경) 비예산
2-8	신규산업단지 조성	[사업기간][사업목표] 사업시행자 MOU 협약 체결로 사업 구체화 (기존) 2022~2027, 착공 (변경) 2022~2029 합덕순성 착공, 송산 산업단지계획 지정고시
3-1	수산식품 클러스터 조성	[사업기간] 23년도 예타대상사업 미선정으로 사업기간 변경 (기존) 2023~2027 (변경) 2025~2029
3-2	스마트양식 클러스터 조성	[추진목표][사업기간] 스마트양식단지 조성사업 기본계획 수립용역 반영 (기존) 임기내 착수, 2023~2027 (변경) 임기내 완료, 2024~2026

관리번호	공약명	변경내용
③-3	장고항 어촌 6차산업 기지화	[사업기간] 3개 단위사업 사업기간 재산정 (기존) 2023~2027 (변경) 2021~2026
④-13	당진 시내권 체육공원 조성	[추진목표] 사업위치 구체화 (기존) 시내권 체육공원, 준공 (변경) 채운공원, 준공 / 원당동 하수종말처리장, 준공
⑤-16	산후조리비 지원	[추진목표] 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례」 입법 절차 기간으로 1회 추경 미반영 (기존) 2023년 1,000명 (변경) 2023년 500명
⑥-1	면천권역 도시가스 공급 추진	[추진목표] 면천면 성상리 일원 도시가스 수요세대 재산정 (기존) '25년 400세대 (변경) '24년 385세대
⑥-7	오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성	[사업기간] 마스터플랜 수립 추진 중 변경 (기존) 2021~2026 (변경) 2021~2028

3 공약사항 세부현황

■ 종괄표

구분	단위 사업	임기목표			사업성격		사업주체			예산구분	
		완료	착수	기반 조성	신규	계속	국가 광역	자체	민자 기타	예산	비예산
합계	91	53	20	18	54	37	11	66	14	83	8
시민 중심 소통 행정	3	3	-	-	1	2	-	3	-	1	2
활력있는 당진 경제	9	5	3	1	4	5	-	6	3	7	2
풍요로운 농어촌	14	9	3	2	8	6	-	11	3	13	1
생활 속의 문화·체육	16	10	2	4	12	4	-	14	2	16	-
함께 누리는 교육·복지	17	12	2	3	10	7	4	10	3	17	-
살기 좋은 도시·환경	32	14	10	8	19	13	7	22	3	29	3

■ 분야별

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
① 시민 중심 소통 행정 (3건)					
①-1 과감한 행정규제 완화	완료	계속	자체	비예산	감사법무담당관
①-2 시민 중심의 소통행정 강화	완료	계속	자체	예산	자치행정과
①-3 민원 처리 기간 획기적 개선	완료	신규	자체	비예산	민원정보과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
② 활력있는 당진 경제 (9건)					
②-1 기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-2 경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-3 원도심 및 전통시장 활성화	완료	계속	자체	예산	지역경제과
②-4 석문국가산업단지 100% 분양	완료	계속	자체	예산	투자유치과
②-5 기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출	완료	계속	자체	비예산	투자유치과
②-6 현대제철 본사 이전	기반 조성	신규	민간	비예산	투자유치과
②-7 수소산업 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	투자유치과
②-8 신규산업단지 조성	착수	신규	민간	예산	기업지원과
②-9 당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정	착수	신규	민간	예산	항만수산과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
③ 풍요로운 농어촌 (14건)					
③-1 수산식품 클러스터 조성	착수	신규	자체	예산	항만수산과
③-2 스마트양식 클러스터 조성	완료	신규	자체	예산	항만수산과
③-3 장고항 어촌 6차산업 기지화	완료	계속	자체	예산	항만수산과
③-4 스마트팜 원예 단지 조성	완료	계속	자체	예산	농업정책과
③-5 공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	완료	신규	자체	예산	농업정책과
③-6 대형 저온 저장고 설치 및 농산물 전량 구매	착수	신규	자체	예산	농식품유통과
③-7 농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)	완료	신규	민간	예산	농식품유통과
③-8 기존 축사를 스마트 축산단지로 전환	완료	계속	민간	예산	축산지원과
③-9 6차 산업화 축산 체험단지 조성	착수	신규	민간	예산	축산지원과
③-10 농촌융복합산업 육성 (가화포도 로컬와인 개발)	완료	신규	자체	예산	농촌진흥과
③-11 농업기술센터 조직개편	완료	신규	자체	비예산	자치행정과
③-12 농촌개발 사업추진	기반 조성	계속	자체	예산	공동체새마을과
③-13 지역특화작목 육성지원	기반 조성	계속	자체	예산	기술보급과
③-14 디지털 농업기술 확대 보급	완료	계속	자체	예산	미래농업과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
④ 생활 속의 문화·체육 (16건)					
④-1 기지시줄다리기박물관 주차장 확대 조성	기반 조성	신규	자체	예산	문화관광과
④-2 야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-3 시립미술관 조성	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-4 천주교 대표적 유적지 위상 정립	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-5 합덕 연호 방죽의 실질적인 복원	기반 조성	신규	자체	예산	문화관광과
④-6 관광지별 특성화 사업추진	완료	계속	자체	예산	문화관광과
④-7 해안 데크길 및 둘레길 조성	착수	신규	자체	예산	문화관광과
④-8 남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-9 면천읍성 특화거리 및 한옥 스테이 조성 추진	완료	신규	자체	예산	문화관광과
④-10 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	완료	계속	자체	예산	사회복지과
④-11 당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립	완료	신규	자체	예산	체육진흥과
④-12 종합스포츠타운 조성	완료	계속	자체	예산	체육진흥과
④-13 당진 시내권 체육공원 조성	완료	신규	자체	예산	체육진흥과
④-14 삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충	착수	신규	자체	예산	체육진흥과
④-15 도비도·난지도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	계속	민간	예산	투자유치과
④-16 행담도 관광지 민자유치개발 추진	기반 조성	신규	민간	예산	투자유치과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[5] 함께 누리는 교육·복지 (17건)					
[5]-1 고등학교 신설	완료	신규	민간	예산	평생학습과
[5]-2 중·고등학생 진학 관리시스템 지원	완료	계속	기타 (교육청)	예산	평생학습과
[5]-3 청소년 수련관 건립	착수	신규	자체	예산	평생학습과
[5]-4 출생·육아·보육 연계한 마더센터 건립	완료	신규	자체	예산	여성가족과
[5]-5 온종일 돌봄 확대	완료	계속	자체	예산	여성가족과
[5]-6 여성 안심 프로젝트 제공	완료	계속	자체	예산	여성가족과
[5]-7 장애인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
[5]-8 양질의 노인 일자리 지원 확대	완료	계속	국가 (자체)	예산	경로장애인과
[5]-9 노인회 활동비 지원	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
[5]-10 노인 건강관리 프로그램 운영 확대	완료	계속	자체	예산	경로장애인과
[5]-11 독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	완료	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-12 장기요양요원 처우 개선	착수	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-13 공동묘지 정비	기반 조성	신규	자체	예산	경로장애인과
[5]-14 공공의료원 건립	기반 조성	신규	광역	예산	보건행정과
[5]-15 대형병원 유치	기반 조성	신규	민간	예산	보건행정과
[5]-16 산후조리비 지원	완료	신규	자체	예산	보건위생과
[5]-17 주·야간 아동 전문 병동 설치	완료	신규	광역	예산	감염병관리과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
[6]-1 면천권역 도시가스 공급 추진	완료	신규	민간	예산	지역경제과
[6]-2 생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행	완료	계속	자체	예산	기후환경과
[6]-3 친환경차 보급 및 충전 인프라 확대	완료	계속	자체	예산	기후환경과
[6]-4 삽교호·석문호 담수호 수질개선	착수	신규	광역	예산	기후환경과
[6]-5 산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충 저류시설 설치	착수	신규	자체	예산	기후환경과
[6]-6 생태하천 복원사업 추진	완료	계속	자체	예산	기후환경과
[6]-7 오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성	착수	신규	광역	예산	기후환경과
[6]-8 당진시·서산시·대산석유화학단지와 환경개선협약체 구성 및 운영	완료	신규	자체	비예산	기후환경과
[6]-9 도심 속 명품 호수공원 조성	기반 조성	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-10 도심 속 명품 계림공원 조성	착수	계속	자체	예산	산림녹지과
[6]-11 송악산 공원화 조성	기반 조성	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-12 은봉산 자연휴양림 조성	착수	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-13 몽산 입구 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-14 구절산 등산로 공영주차장 조성	완료	신규	자체	예산	산림녹지과
[6]-15 당진천 천변길 개선	완료	계속	자체	예산	건설과
[6]-16 기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비	완료	계속	자체	예산	건설과

관리번호 / 공약명	임기 목표	사업 성격	사업 주체	예산 구분	주관부서
[6] 살기 좋은 도시·환경 (32건)					
[6]-17 신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진	기반 조성	신규	자체	예산	공동체새마을과
[6]-18 송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진	기반 조성	계속	민간	비예산	도시과
[6]-19 학교 주변 안전 통학로 조성	완료	계속	자체	예산	도로과
[6]-20 국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설	기반 조성	계속	국가	예산	도로과
[6]-21 제2 서해안 고속도로 건설	착수	신규	민간	예산	도로과
[6]-22 시곡교차로 지하차도 건설	착수	신규	국가	예산	도로과
[6]-23 삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장	착수	신규	자체	예산	도로과
[6]-24 시곡교차로~수청동 도로 개통	완료	계속	자체	예산	도로과
[6]-25 시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장	기반 조성	계속	광역	예산	도로과
[6]-26 합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설	착수	계속	자체	예산	도로과
[6]-27 국도 40호선(합덕~신평) 개설	기반 조성	신규	국가	예산	도로과
[6]-28 국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장	착수	계속	국가	예산	도로과
[6]-29 면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진	완료	신규	자체	예산	도로과
[6]-30 복합환승센터 구축	기반 조성	신규	자체 (민간)	예산	교통과
[6]-31 기지시 버스터미널 신설	완료	신규	자체	예산	교통과
[6]-32 산업단지 환경감시기구 설치	완료	신규	자체	비예산	자치행정과

4 공약사항 예산현황

◆ 총소요예산 : 10조 5,798억원

– 임기내 소요예산 : 5조 2,727억원

■ 재원별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,579,849	110,604	5,272,771	104,567	509,340	502,899	923,347	3,232,618	5,196,474
국비	920,409	36,350	317,511	32,927	44,354	52,935	90,313	96,982	566,548
도비	277,782	14,928	144,347	16,210	26,054	35,876	37,280	28,927	118,507
시비	1,054,375	51,975	520,663	55,429	108,436	118,526	106,439	131,833	481,737
민자	8,296,245	7,350	4,260,531	-	315,137	291,128	684,242	2,970,024	4,028,364
기타	31,038	1	29,719	1	15,359	4,434	5,073	4,852	1,318

■ 분야별

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,579,849	110,604	5,272,771	104,567	509,340	502,899	923,347	3,232,618	5,196,474
시민 중소 행정 능력 향상 사업	146	-	146	26	30	30	30	30	-
도시 환경 개선 사업	2,121,142	441	1,361,959	4,789	322,198	181,962	182,991	670,019	758,742
농업 농촌 개발 사업	322,129	13,965	261,137	15,689	48,429	32,109	90,305	74,605	47,027
생활 문화 체육 사업	2,619,496	13,772	2,004,324	4,954	39,909	134,612	13,749	1,811,100	601,400
함께 하는 교육 복지 사업	350,838	10,753	173,063	13,980	17,704	48,756	50,793	41,830	167,022
살기 좋은 도시 환경 사업	5,166,098	71,673	1,472,142	65,129	81,070	105,430	585,479	635,034	3,622,283

5] 향후계획

■ 추진근거

- 「당진시 시장 공약 관리 규칙」

■ 공약사항 관리

- 공약사항 추진상황 자체 점검 : 분기별
 - 공약사업 시민평가단 평가 : 연 1회
- 공약사항 추진상황 보고회 개최 : 연 2회 (상·하반기)

■ 공약사항 평가

- 한국매니페스토실천본부 주관 평가 대비
 - 2024 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가
 - 2023 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회

■ 공약사항 공개

- 2023년 2분기 민선8기 시장 공약사항 추진상황 자체 점검 결과 홈페이지 공개
- 홈페이지 주소 : <https://www.dangjin.go.kr>
 - 소통시장실 - 공약과 실천 - 민선8기 공약사항 - 자체점검결과

1 시민 중심 소통 행정

1-1	과감한 행정규제 완화
-----	-------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I 사업 개요 ○ 중앙부처 건의 규제 및 현장 중심의 규제발굴 - 규제개혁 TF 구성·운영(단장-부시장, 7개 분야별 관련 부서 팀장, 수시 운영) - 규제개혁 아이디어 공모전 개최 및 규제발굴 보고회 정례화(반기 1회) - 숨은 규제 현장발굴단 운영 및 옴부즈만(소상공인, 중소기업) 규제 애로 발굴 건의 - 규제혁신 우수 지자체 벤치마킹 및 정보 교류 ○ 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비 - 필수조례 및 불합리한 자치법규 정비 : 연간 대상 조례 건수의 90% 이상 제·개정 - 조례 제·개정 요구 시 신속한 법무심사 등 입법 절차 추진(조례규칙심의회 월 1회 정례화) ○ 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시 - 연간 2회(상·하반기) / 기업·경제 부서 담당자 등 40명 / 법제처 전문강사 등 초빙실시							
II 사업 목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
중앙부처 건의 규제발굴	건	150	30	30	30	30	30
자치법규 제정·정비	%	90	90	90	90	90	90
직원 역량강화 교육	명	200	40	40	40	40	40
III 사업 계획							
[추진계획]							
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기			
중앙부처 건의 규제발굴	5건	15건	25건	30건			
자치법규 제정·정비	25%	50%	75%	90%			
직원 역량강화 교육	-	20명	-	40명			

IV 추진 실적

- '23년 찾아가는 지방규제신고센터 운영(지방규제혁신 추진단 구성)
- 신설·강화 규제(조례)에 대한 규제 적정성 규제개혁위원회 심의(5건)
- 적극행정을 통한 그림자(행태) 규제 해소 우수사례 발굴(불필요한 문화재위원회 심의사항 폐지)
- 적극행정을 통한 규제애로 해소 확산을 위한 우수 벤치마킹 사례('20년~'22년) 전부서 공유
- 기업(생업) 경영환경 규제혁신 과제 공모전 시행
- 중앙규제 개선 건의 관련 소관부처 검토의견 요청(지방세 직권 경정 범위 확대 등 6건)
- 적극행정을 통한 규제애로 해소 우수 벤치마킹 사례 해당 부서 도입 권고
- 그림자·행태규제 모범사례 전직원 공유 및 해당 부서 시행 권고
- 규제개혁신문고 규제건의(장사 등에 관한 법률상 분묘기지권에 대한 내용 명시)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 2022년 하반기 규제개혁 과제 발굴·보고회 개최(40건 발굴) ○ 2022년 규제개선 아이디어 공모전 개최(13건 발굴) ○ 건축허가(신고) 시 도로 요건 및 부설주차장 설치기준 규제개선 검토 보고 ○ 규제개혁 신문고 규제개혁 현안 과제 건의(농공단지 입주기업체 협의회 설립요건 완화) ○ 중앙부처 건의 과제 발굴 30건(중앙부처 건의 11건, 자치법규 전환과제 11건, 민생규제 8건) ○ 규제 애로 발굴 건의, 해소 10건(중기부 옴부즈만 6건, 적극행정 4건) ○ 시민의 권익 보호를 위한 자치법규 제정·정비 ○ 직원 자치법제·규제개혁 역량강화 교육 실시(2022.10.19(수)) ○ 2023년 규제개혁 추진계획 수립 ○ 신산업 분야 규제혁신 과제 발굴 국무조정실 건의(2건) ○ 지방규제혁신 관련 규제 개선 발굴 과제 소관부처 건의(산업통상자원부 1건)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 규제 개선 소관부처 의견 조회 회신 지연
→ 규제개선 발굴 과제 신속 건의
- 다양한 분야의 규제 개선 발굴에도 불구하고 중앙부처의 낮은 수용률
→ 규제개선 발굴 과제의 필요성, 전문가 의견 등 논리 보강 건의

VI 향후 계획

- 규제개선 과제 발굴 보고회 개최, 발굴 과제 검토 후 소관부처 및 행안부 건의
- 생활규제 개선 아이디어 공모전 개최, 규제개혁위원회 심의
- 규제애로 해소 우수 벤치마킹 사례 공유 및 도입 추진

주관부서	감사법무담당관	부 서 장	안봉순(3120)	팀 장	박상구(3130)	담 당 자	김창호(3131)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-2	시민 중심의 소통행정 강화						
-----	----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	146백만원

I 사업개요							
○ 함께여는시정실 설치 및 운영							
- 시민들의 고충과 요구사항에 대해 함께여는시정실이 컨트롤타워가 되어 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원 해결 창구 마련							
○ 시민·유관기관(단체)와 소통 확대							
- 읍면동 순방, 각계각층과의 간담회를 비롯해 시정 참여에 소외된 계층을 발굴해 시정 참여 사각지대 해소 추진							
- 정기적인 간담회 확대 및 SNS를 활용한 현안대응 연락체계 등 온·오프라인 소통창구 확대							
시간, 장소, 대상 등을 다양화하여 보다 많은 시민과의 소통을 확대하고 유관기관(단체) 확대							

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
함께여는시정실 설치 및 운영	설치 여부	설치 운영	설치	지속운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	운영 여부	운영	지속운영				

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
함께여는시정실 설치 및 운영	지속 운영			
시민·유관기관(단체)와 소통 확대	화요회 등 기관·단체와의 간담	지역대표와의 간담	읍면동 연두순방	각계각층 간담회

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	146	26	146	26	30	30	30	30	
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	146		146	26	30	30	30	30	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 함께 여는 열린 시정실 운영

- (운영시기) 수시 *2022년 7월부터 운영
- (운영장소) 당진시청 민원실 1층
- (운영방법) 시민들의 고충과 요구사항에 대해 관련 부서와 적극적인 해결방안을 모색하는 등 원스톱 민원해결 창구 마련
- (주요성과)
 - ('23년 2분기) 77건 고충상담 및 124건 부서별 정책개진
 - 시민 목소리를 시정에 올바르게 반영하기 위한 소통행정 강화

○ 기관 간 협업체계 구축 마련을 위한 「주요 기관단체」 회의

- 때 · 곳 : 2023. 6. 13.(화) 17:00 / 시청 해나루홀
- 참석자 : 22개 기관·단체장(경찰서, 교육청 등)
- 내 용 : 지역 발전을 위한 의견 및 기관별 협조사항 공유

○ 읍·면·동 지역주민과의 간담(수시)

- 지역대표 등 지역 발전을 위한 정책방향 논의 및 주민의견 수렴

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 함께 여는 열린 시정실 설치 및 운영(142건) ○ 읍면동 초도순방 추진(387건) ○ 기관 간 협업체계 구축(화요회 등)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 재난 및 감염병 발생 등에 따른 간담회 추진 불가 시 온라인 매체 적극 활용

VI 향후 계획

- 함께여는시정실을 운영해 알권리 확대와 시민과의 소통 추진
- 시민과 소통하고 지역민 모두가 공감하는 '함께 여는 미래, 생동하는 당진' 추진

주관부서	자치행정과	부 서 장	김지환(3231)	팀 장	박미혜(3232)	담 당 자	김문수(3233)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

1-3	민원 처리 기간 획기적 개선						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~	사업비	비예산

I 사업개요

○ 사업배경

- 건축·개발·산지·농지 분야별 주관부서로 이관하여 인허가 업무의 전문성 및 책임성 강화

- 복합민원을 온라인으로 처리·관리하여 민원 처리 기간 단축 및 행정의 효율성 제고

○ 사업기간 : 2022. 10월~

○ 사업비 : 없음

○ 사업내용 : 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
허가과 폐지 (‘22.08.08. 완료)	폐지 여부	허가과 폐지	폐지	-			
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	운영 여부	복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	시범운영	본격운영	지속운영		

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
복합민원 온라인 민원실무심의회 운영	온라인으로 협의 의견 실시간 취합하여 민원처리기간 단축			

IV 추진실적

○ 민선8기 조직개편으로 허가과 폐지(‘22.08.08.)

○ 복합민원 온라인 민원실무심의회 운영

▶ 대상민원 운영현황(2023. 2분기 실적)

(단위: 건)

부서명	민원 명	민원심의상정현황(주무부서)				민원심의현황(심의부서)		
		합계	상정		미상정	합계	처리중	처리완료
			3일 이내	7일 이내				
계		45	45	-	-	166	-	166
농식품유통과	농어촌 관광휴양단지 지정신청	1	1	-	-	2	-	2
투자유치과	공장신설 등 신청	28	28	-	-	131	-	131
	사업계획승인(변경)	7	7	-	-	20	-	20
건설과	개간사업 준공검사	5	5	-	-	9	-	9
	개간대상지 선정	4	4	-	-	4	-	4

※ 건축허가(세움터), 개발행위(IPASS), 산지전용시스템 온라인 접수 민원은 제외

▶ 운영내용

- 심의부서 별 심의의견을 온라인으로 실시간 등록하게 됨으로써 심의(협의) 기간 단축
- 주무부서의 의견취합·종합 등록 또한 단축되어 민원처리 기간 단축
- 민원사무 별 심의의견 진행상황 실시간 확인 및 통계 추출 가능

그동안 추진실적 [‘22.08.~ ’23.03.]	○ 온라인 민원실무심의회 운영(3과 101건) - 투자유치과 76건[공장신설 등 신청, 사업계획승인(변경)] - 농식품유통과 2건[농어촌 관광휴양단지 지정신청] - 건설과 23건[개간사업 준공검사, 개간대상지 선정]
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 접수민원 일일 모니터링 실시하여 심의 대상 복합민원 자체 의제처리 목표 기간 내 처리 촉구

주관부서	민원정보과	부 서 장	박병선(3520)	팀 장	심미정(3530)	담 당 자	차경희(3523)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2 활력있는 당진 경제

2-1	기업 연계를 통한 지역인재 고용할당제 도입						
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023	사업비	220백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 40,000천원

○ 사업내용 : 인건비 등 지원을 통한 관내 기업의 지역 인재 우선채용 참여기업 확대

- 지역인재 정규직 채용(장기계약직 포함) 후 6개월 고용유지 시 12개 기업에 채용인원 당 100만원 지급(최대 2명), 이후 고용할당제 30% 달성 시 기업에 추가 100만원 지급
- (검토) 당진시 인증 ‘지역주민 우선채용 인증기업’ 현판제공

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2023	2024	2025	2026
고용할당제 참여기업	개	66	12	15	18	21
지역인재 채용	명	132	24	30	36	42

○ 사업계획 상 지역인재 채용인원 수는 기업 1개소당 최대 2명 지원으로 재산정하여 수정

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역인재우선채용 지원사업	참여기업 공모	심사 및 협약체결	고용서비스 지원	평가 및 피드백

[투자계획]

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	220	0	220	0	40	50	60	70	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	220		220		40	50	60	70	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 사업 참여기업 일부 모집 및 인건비 지원 준비

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 채용기업 사회보험료 지원 ○ 취업자 사후관리 서비스 지원 ○ 근로안전장비 지원 ○ 기업 고용서비스 지원 ※ 지역인재 400명 지원
--	---

V 문제점 및 대책

○ 기업당 최대 300만원을 지원하는 사업으로 기업이 참여동기를 얻기 다소 부족한 지원임
⇒ 지역인재 채용 인원 증가를 목표로 점진적인 지원예산 확대 필요

VI 향후 계획

- (2023. 06. ~ 11.) 지원개시 (협약 및 사업계획에 의거 고용서비스 지원)
- (2023. 07.) 부족기업에 대한 공모절차 추가 진행·선발 및 협약 체결
- (2023. 12.) 사업 말기 기준으로 고용할당제 30% 달성확인을 통한 추가지원
- (2023. 12.) 환류 (사업 추진성과 확인 및 차년도 사업계획 반영)

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	전혜란(4020)	담 당 자	한아름(4022)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-2	경력단절 여성을 위한 민·관 협력 일자리 창출
-----	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,078백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 협력기관 : 관내 직업교육 훈련기관, 기업체

○ 사업비 : 2,259백만원

○ 사업대상 : 경력단절 여성, 결혼이민여성 등 구직 희망 여성

○ 사업내용 : 지역자원과 연계한 직업교육훈련 추진 및 새일여성 인턴십 운영

- 매년 구인·구직자 대상 수요조사를 바탕으로 직업교육훈련 계획 수립 및 추진 운영

- 직종별 채용수요가 높은 직업 교육과정 지속 운영으로 전문여성 채용 기회 확대

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
여성 일자리 창출	명	700	165	130	145	155	160

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
직업교육훈련	직업교육훈련생 모집	직업교육실시(4개)	사후관리 및 취업알선	사후관리 및 취업알선
새일여성인턴	인턴약정체결 및 지원금 지급			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,078	441	2,259	438	517	416	435	453	378
국비	2,669	380	1,957	380	441	364	379	393	332
도비	204	30	151	29	38	26	28	30	23
시비	205	31	151	29	38	26	28	30	23
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023년 상반기 구인구직매칭데이 운영 : 3회/22명 (3.21.-10명, 3.29.-10명, 6.14.-2명)
- 집단상담프로그램 운영 : 8기, 101명 수료
- 새일여성인턴 사업추진 : 신규연계-44명, 집행액-98백만원(집행률:30.3%)
- 2023년 새일센터 직업교육훈련 홍보 및 신청접수

교육명	교육기간	인원	주요과정	장 소	비고
스마트회계전문사무원	4.3.~6.14. (200시간)	20명	더존 ERP 회계정보관리사 1급, 전산회계 1급, 전산세무 2급	청인직업훈련학원	수료 (17명)
홈크린마스터	4.3.~5.31. (160시간)	20명	건물미화관리사, 수납전문가 2급, 청소대행전문가	바른청소생활	수료 (19명)
요리조리급식조리사	4.10.~6.22. (200시간)	20명	한식조리사, 단체급식 실무	현대요리제과제빵 전문학원	교육중
공동주택경리사무원	4.10.~7.5. (240시간)	20명	공동주택회계실무 XP-ERP 전산회계 2급, ITQ(한글,엑셀)	OK컴퓨터학원	교육중

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 2022년 여성일자리 창출 : 165명				
	○ 관내 기업체와 여성 고용 협약 체결				
	- 22개 기업체, 89명 인턴 약정 체결하여 인턴십 추진				
	- 10개 기업체 ‘여성친화기업 일촌협약’ 신규 체결, 경력단절여성 채용 활성화				
	고려건설 (2022.5.19.)	(주)벨에스엠 (2022.5.19.)	(주)나온 (2022.5.26.)	(주)명진금형 (2022.7.18.)	(주)태양테크 (2022.5.26.)
	(주)태건환경건설 (2022.7.26.)	마터피아 (2022.9.1.)	한성기업 (2022.9.15.)	(주)대생이엔티 (2022.9.27.)	(주)와이비셀 (2022.10.13.)
○ 2022년 기업 맞춤형 직업교육훈련 실시(4개 과정/76명 교육 수료)					
교육명	계	ERP생산물류 관리사무원	공동주택&오피스 경리실무 마스터	단체급식 조리사	회계전문 사무원
인 원	76명	18	19	19	20
훈련기관	3개소	청인직업훈련학원	OK컴퓨터학원	현대요리제과제빵학원	청인직업훈련학원

V 문제점 및 대책

- 제조업 중심의 남성 위주 산업구조로 인한 경력단절 여성의 일자리 부족
→ 맞춤형 전문 직업훈련과 기업 연계로 경력단절 여성의 취업 기회 확대

VI 향후 계획

- 경력단절 여성의 특성을 고려한 직업교육 훈련으로 일자리 재진입 장벽 해소
- 여성 취업 후 장기근속 독려와 일자리 안정화로 경력단절 여성의 성공적인 재취업 기회 제공
- 인적 자원 부족에 따른 구인난 해소와 주도적 경제활동 참여로 여성 자아실현 구현

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	전혜란(4020)	담 당 자	이선미(4026)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-3	원도심 및 전통시장 활성화
-----	----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	14,480백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 당진시 읍내동 지내
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 14,480백만원
- 사업내용
 - 당진전통시장 노후시설물 재정비
 - 전통시장 및 상점가 활성화사업

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전통시장 재정비	%	100	20	20	20	20	20
전통시장 활성화	%	100	20	20	20	20	20

- 전통시장 재정비 추진하여 시장환경 개선
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진으로 상권 회복

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
전통시장 재정비	정비방안 수립	정비사업 수립	정비사업 수립	정비사업 수립
전통시장 활성화	활성화사업 추진	활성화사업 추진	활성화사업 추진	활성화사업 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	14,480	0	14,480	1,351	2,641	3,496	3,496	3,496	0
국비	4,385		4,385	260	1,125	1,000	1,000	1,000	
도비	3,155		3,155	155		1,000	1,000	1,000	
시비	6,940		6,940	936	1,516	1,496	1,496	1,496	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 당진전통시장 노후시설물 재정비방안(보수보강 또는 시설현대화) 수립 추진
 - 당진전통시장 정비방안 부서별 협의회 개최('23. 4)
 - 당진전통시장정비사업 상인 동의안 제안서 제출('23. 6)
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진
 - 당진전통시장 토요장터 운영 및 문화공연 시범사업 시행(38백만원/'23. 4~6)
 - 시장경영패키지 상인회 매니저 지원사업 추진(당진전통시장/24백만원)
 - 당진전통시장 진입도로 포장 공사 실시 완료(140백만원/'23. 6)
 - 당진전통시장 디지털전통시장 조성 공모사업 2년차 추진(100백만원/'23)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 당진전통시장 상인 간담회('23. 1) ○ 시장정비사업 관련 남서울대학 교수 자문('23. 3) ○ 재개발, 재건축 사례 현장 답사(군산공설시장, 목포중앙시장/'23.3) ○ 전통시장 재개발 방안 협의 방문(충남개발공사/'23.3)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 당진전통시장 개발방식에 따른 상인, 시민간 이견 대립 예상
 - 시민공청회를 통한 다양한 의견 수렴 및 이해 조정 필요

VI 향후 계획

- 당진전통시장 노후시설물 재정비방안
 - 시장정비사업 사업계획서 승인 추천신청(상인회→시/'23.10.한)
 - 당진전통시장 정비방안 시민공청회 개최, 의회 부의 상정
 - 시장정비사업 사업계획서 검토/ 당진전통시장 재정비방안 수립
- 전통시장 및 상점가 활성화사업 추진
 - '23. 9. 충남우수시장 박람회 개최
 - '23. 9. 원시가지 로데오페스티벌 행사 개최

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	황상규(4040)	담 당 자	김승훈(4041) 김남운(4042)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

2-4	석문국가산업단지 100% 분양
-----	------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	70.2%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	30,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 석문면 국가산업단지(4,967천㎡)

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 30,000백만원

○ 사업내용

- 직접 찾아가는 유치 활동으로 첨단 소재, 부품, 장비 기업 유치 총력
 - 월 2회 수도권 소재 산업단지 경영자협의회 등 찾아가는 유치 활동 전개
- 신성장동력의 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 기여
 - 석문국가산업단지 5개소, 1천억원 이상 투자유치 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
석문국가산업단지 100% 분양	%	100	72	78	85	92	100

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
석문국가산업단지 분양률 제고	69.7%	72%	75%	78%
수도권 투자유치활동 전개	14회	17회	20회	24회

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	30,000	0	30,000	3,000	7,000	7,000	7,000	6,000	0
국비	19,500		19,500	900	4,900	4,900	4,900	3,900	
도비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
시비	5,250		5,250	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 석문국가산업단지 분양률 0.5%P 제고(69.7% ➡ 70.2%)
- '23년 2분기 기업유치 활동(방문상담 등)
 - 파리크라상, 엘지화학 등 14개 기업 방문상담 및 투자(이전)권유

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 석문국가산업단지 분양률 3.1%P 제고(66.6% ➡ 69.7%) ○ 기업유치 활동(방문상담 등) 22회
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 금리 인상, 건설 원자재 가격 상승 등 국내외 경기 악화로 기업 신규 투자 난색
 - 수도권 기업들의 신·증설 규제로 수도권과 인접한 당진시에 이전 문의 多
 - 석문산단 인입철도, 제2서해안고속도로 등 수도권 접근성 및 당진항 등 항만 편의성 강조를 통해 적극적인 유치 추진
- 석문산단 내 대규모 필지의 업종편중(자동차 및 트레일러) 심화
 - 유치기업 및 전략에 따른 실시계획 변경 등 지속협의 추진

VI 향후 계획

- 입주희망업체 방문상담 등 적극적인 입주 지원
- 석문산단 분양률 제고를 위한 입주희망 업종 수요 파악 및 실시계획 변경 등 추진하여 목표치 78% 이상 분양 달성 추진

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081) 김보명(4085)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

2-5	기업 유치를 통한 일자리 1만 개 창출						
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 전역

○ 사업기간 : 2022~2026

○ 사 업 비 : 30,000백만원

○ 사업내용

- 외국인투자지역을 활용한 글로벌 외국인투자기업 적극 유치를 통한 대규모 투자유치
- 석문국가산업단지 최우선 지원을 통한 대규모 투자업체 발굴
- ESG경영을 추구하는 모범기업 적극 유치로 지역상생 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
일자리 1만개 창출 (공장등록 신고 채용계획 기준)	명	10,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공장등록 신고 채용계획	208명	929명	3,000명	4,000명
투자유치 협약 체결	4개소	4개소 (협약 7.11. 예정)	12개소	16개소

○ 공장등록 및 유치 활동으로 우량기업 유치 총력

- 연간 공장등록 목표 100건, 일자리창출 4,000명 이상 달성을 위한 총력매진

○ 고용 창출효과가 큰 대규모 투자기업 유치를 통해 고용확대 및 지역경제 활성화 기여

- 투자유치 1조원 목표달성을 통해 대규모 일자리 창출 도모

IV 추진 실적

- '23년 1분기 대규모 투자유치 협약 체결 4개사 2조 2천억원
- '23년 2분기 입주계약업체 6개소 265명 채용

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ '22년도 하반기 입주계약업체 30개소 1,881명 채용
	○ '22년도 하반기 道-市 합동투자협약 체결(12개소 / 9,529억원)
	○ '23년도 1분기 입주계약업체 17개소 208명 채용
	○ '23년도 1분기 道-市 합동투자협약 체결(4개소 / 2조 2천억원)

V 문제점 및 대책

- 기업간 임금격차에 따른 근로자 기피현상 발생
 - 우량기업 유치를 통해 고임금 일자리 마련
- 개별입지기업 지역주민 민원 발생으로 입주기피
 - 산업단지 입주 최우선 지원 및 개별민원 해결을 위한 기업-마을주민 간 사전면담 추진

VI 향후 계획

- 분기별 道-市 합동투자협약 체결을 통해 우량기업 유치 추진
- 대규모 첨단산업 기업들의 당진시 이전 및 유치 추진으로 양질의 일자리 창출

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-6	현대제철 본사 이전						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 북부산업로 1480

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026

○ 사업비 : 30,000백만원

○ 사업내용

- 현대제철 본사 및 인천공장 이전을 위한 기업체 관계자 지속 협의
- 담당자-부서장-현대제철 대표-현대자동차 그룹 회장까지 지속적인 면담을 추진하여 본사 이전의 토대를 마련
- 지방투자촉진보조금 지급과 기업 및 그룹대표 면담을 통한 본사이전 협의 진행

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
현대제철 본사이전	-	MOU 체결					MOU 체결

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
현대제철 본사이전	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의	관계자 협의

IV추진실적

○ '23. 5. 17. 포항시 의회 포스코홀딩스 본사이전 추진 성과 공유

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ '23. 3. 2. 현대제철 본사 이전을 위한 업무 협의 추진
--------------------------------------	--------------------------------------

V 문제점 및 대책

- 현대자동차그룹은 2028년 준공 예정인 강남 글로벌비즈니스센터(GBC)로 주요 계열사 본사를 위치시킬 계획으로, 현대제철 본사 역시 서울 이외 지역으로 이전할 가능성이 크지 않음
- 현대제철이 한보철강을 인수한 후 주력투자를 당진공장에 해 왔으나, 현대제철의 모태는 조선이연금속 인천공장(1938년), 인천제철(1964년)로, 역사성 및 인천지역 노동자 등 인천 지역사회 반발을 무시할 수 없는 상황임
 - 주요기업(현대제철, 동서발전) 본사 이전 T/F 구성 등을 통한 당진 지역 환경 피해, 미비한 세수 등의 여론전 추진 및 정부·국회 등 협조요청 추진
- 본사이전에 따른 유·무형의 기업손실 발생
 - 지방투자촉진 보조금 지원을 통한 기업 투자비용 보전
- 단순 등기이전을 통한 본사이전 시 당진시 실익 부족
 - 인천공장 이전 시 지방투자촉진보조금 지급

VI 향후 계획

- 본사 이전 논의를 위한 지속적인 면담자리 마련
 - 인천공장 노후화(1964년)와 인천시 개발계획 등을 활용하여 우리시 이전 적극 요청
- 道 투자통상정책관 등 지방투자촉진보조금 관계기관과의 협의를 통한 본사 이전에 따른 유인 및 지원대책 마련

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-7	수소산업 클러스터 조성
-----	--------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	440,000백만원

I 사업 개요

○ 사업위치 : 당진시 일원

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026

○ 사업비 : 440,000백만원 (국20,000, 도6,000, 시14,000, 민400,000) * 변동될 수 있음

○ 사업내용 : 수소 생산, 활용(발전, 산업, 주거, 교통 등) 인프라 및 기반 구축

분 야	핵심 과업(사업주관)	사업비(백만원)	사업기간
수소 생산	- 재활용플라스틱 활용 수소 생산(현대엔지니어링)	400,000	'23.~'26.
	- 탄소포집형 수소생산기지 구축(민간) * 공모사업 대응中	-	'23.~'25.
수소 활용	- 수소도시 조성사업(당진시)	40,000	'23.~'26.

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
재활용플라스틱 활용 수소 생산	1식	수소 생산공장 준공	계약	착공	시공	시공	준공
수소도시 조성사업	1식	수소도시 조성사업 준공	선정	설계	착공	시공	준공
신규사업 발굴	-	민간 투자 확정, 정부 공모 선정	-	사업 발굴 및 착수			
탄소포집형 수소생산기지 구축	1식	수소생산기지 준공	-				

※ 사업목표(추진목표, 사업주체) 변경 사유 : <충남 블루수소산업 클러스터> 지정 추진 불투명
으로 인해 자체 사업 발굴 및 구체화 적극 추진(정부 및 충남도 정책 연계도 함께 추진하겠음)

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
재활용플라스틱 활용 수소 생산	설계	인허가	착공	
수소도시 조성사업	마스터플랜 수립 용역 계약	마스터플랜 수립 완료, 기본 및 실시설계 발주	설계	기본 및 실시설계 완료
탄소포집형 수소생산기지 구축	컨소시엄 구성	컨소시엄 업무협약, 사업계획서 제출, 발표평가 및 현장실사 대응	선정여부 결정	사업 착수

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	440,000	0	440,000	0	52,000	166,000	162,000	60,000	0
국비	20,000		20,000		1,000	8,000	6,000	5,000	
도비	6,000		6,000		300	2,400	1,800	1,500	
시비	14,000		14,000		700	5,600	4,200	3,500	
민자	400,000		400,000		50,000	150,000	150,000	50,000	
기타	0		0						

* 타부서 관리사업 제외 : 수소부두 조성(항만수산물), 연료전지 발전소 준공(지역경제과), 수소 차량 보급 확대(기후환경과), 수소 충전인프라 확충(기후환경과)

IV 추진 실적

- 당진시 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 용역 추진
 - 용역 착수보고회(4. 10.) 및 용역 중간보고회(5. 22.) 추진 完 → 용역 추진 일시 중지
 - * 용역중지사유 : 산자부 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모 신청 → 공모 선정 時 해당 내용 반영한 마스터플랜 수립을 위해 일시 중지 (8월 중 사업대상지 최종 확정 예정)
- 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모사업 추진
 - * 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 개요

구 분	내 용	비 고
위 치	▶ 당진시 송산면 가곡리 541 內	
규 모	▶ 16,500㎡(약 5,000평)	
사 업 비	▶ 246억원(국 67.5 / 지 67.5 / 민 111)	
주요내용	▶ 수소생산시설, 탄소포집·자원화·저장 시설 등 - 천연·바이오가스 활용 → 청정수소(2톤/일) 생산 - 수소생산 부산물(CO ₂) 포집 → 탄산나트륨(44톤/일)생산	

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ (‘22. 6~9월) <충남 블루수소산업 클러스터> 기획위원회 협의(3회) ○ (‘22. 8. 30.) 충남도 최초 수소도시 선정 ○ (‘22. 10. 6.) 수소도시 추진 업무협약 체결(탄소중립경제 특별도 선포식) - 道, 당진시, 보령시, 현대제철, 현대엔지니어링, 한국중부발전, SK E&S ○ (‘23. 1. 31.) 당진시 수소도시 조성사업 수립용역 추진 방침결정 - 용역 착수보고회(4. 10.) 및 중간보고회(5. 22.) 既 진행 ○ (‘23. 4월) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 공모 준비 - 탄소포집형 수소생산기지 구축 MOU체결(6. 14.) → 道, 市, Kogas, 로우카본, 원일티엔아이, 테크로스워터앤에너지 등 ○ (‘23. 6월) 공모신청서 제출 예정 (당진시 → 산자부)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 정부·도·민간 등 모든 이해관계자의 수소 사업 추진 속도가 더딘 편
 - 개별사업단위 민간투자자발굴 및 사업 제안 추진·정부 공모사업 대응 지속 등

VI 향후 계획

- (‘23. 7.) 탄소포집형 수소생산기지 구축사업 현장실사 및 평가 대응
- (‘23. 8.) 공모 결과 발표 → 결과에 따른 수소도시 조성사업 마스터플랜 용역 반영
- (‘23. ~12.) 당진 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계 완료

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	김민상(4090)	담 당 자	김철한(4091)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

2-8	신규산업단지 조성						
-----	-----------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022-2029	사업비	1,373,364백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 합덕순성테크노폴리스 해제지역, 송산2산단 2-3공구 해제지역							
○ 사업기간 : 2022년 ~ 2029년							
○ 사업규모 : 150만평 (합덕순성 테크노 100만평 / 송산2-3공구 50만평)							
○ 사업비 : 1,373,364백만원							
○ 사업내용 : 당진시 전체 산단 분양률이 90% 이상 기대됨에 따라 신규산업단지를 조성하여 건설한 기업 유치 및 지역경제 활성화에 기여							

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕.순성	-	착공	-	민간투자유치 사업시행협약 기본구상완료	SPC법인설립 지정계획반영	산업단지계획 지정고시	착공
송산2산단 2-3공구	-	산업단지계획 지정고시	-	민간투자유치 사업시행협약 기본구상착수	SPC법인설립 지정계획신청	산업단지 지정계획반영	산업단지계획 지정고시

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
신규산업단지 조성	민간사업시행자 유치	산단조성 시행협약	투자의향서 작성 (토지동의 및 기본구상)	투자의향서 작성 (토지동의 및 기본구상)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,373,364	0	615,000	0	0	5,000	10,000	400,000	758,364
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,373,364		615,000			5,000	10,000	600,000	758,364
기타	0		0						

IV 추진 실적

- '23. 01. 민간사업시행자 유치 협의(현대엔지니어링, LG화학 등)
- '23. 02. 민간사업시행자 유치 협의(SK에코플랜트, 우림 등) 및 시장님 업무보고
- '23. 03. 민간사업시행자 유치 (쌍용건설) 및 농림부 농지전용 사전 협의
- '23. 06. 합덕순성 그린컴플렉스 일반산단 조성 MOU 협약 체결

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.06.]	○ 합덕순성 그린컴플렉스 일반산단 조성 MOU 협약 체결 완료 (당진시, SK에코플랜트, (주)삼원산업개발, (주)부자, (주)MDM플러스)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 합덕 순성 그린컴플렉스 일반산단 조성사업 추진
 - '23. 07. 산업단지 구역계 내 토지 동의 및 투자의향서 작성 착수
 - '24. 06. 합덕·순성 그린컴플렉스 산업단지 기본 구상 및 지정계획 반영(충청남도)
 - '24. 06. 산업단지 사업시행자 특수목적법인(SPC) 설립
 - '25. 12. 산업단지계획(제영향평가 포함) 승인 고시 (충청남도)
 - '26. 03. 산업단지 토지보상 및 착공
 - '28. 12. 산업단지 분양 및 준공
- 송산2일반산단 2-3공구 일반산단 조성사업 추진
 - '23. 09. 산업단지 사업시행자 확정 및 MOU체결
 - '23. 10. 산업단지 구역계 내 토지 동의 및 투자의향서 작성 착수
 - '24. 06. 산업단지 사업시행자 특수목적법인(SPC) 설립
 - '25. 03. 산업단지 기본 구상 및 지정계획 반영 (충청남도)
 - '26. 12. 산업단지계획(제영향평가 포함) 승인 고시 (충청남도)
 - '27. 03. 산업단지 토지보상 및 착공
 - '29. 12. 산업단지 분양 및 준공

주관부서	기업지원과	부 서 장	윤수혁(4560)	팀 장	구본상(4575)	담 당 자	송태진(4576)
협조부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	최인규(4080)	담 당 자	오천은(4081)

2-9	당진항 양곡부두와 연계한 석문신항 지정
-----	-----------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2028	사업비	260,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 석문면 석문국가산업단지 일원 및 전면 해상
- 사업기간 : 2022~2028
- 사업비 : 260,000백만원
- 사업내용
 - (해상) 접안시설 및 부대시설 1식
 - (육상) 부지조성(40,000평) 및 SILO 시설(저장능력 12만톤) 1식

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공유수면 점·사용 실시계획	-	승인	실시계획 작성	실시계획 승인	-	-	-
육상 및 해상공사	-	착공	-	착공	공사 진행 (‘28.1. 개장 목표)		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공유수면 점·사용 실시계획	실시계획 작성	실시계획 승인	-	-
육상 및 해상공사	공사 제반사항 준비		착공	공사 진행 (‘28.1. 개장 목표)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	260,000	0	260,000	0	260,000	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	260,000		260,000		260,000				
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 4. 17.) 산업단지개발계획 변경 승인
- ('23. 6. 19.) 석문국가산업단지 內 부지 매매 계약 체결

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('23. 3. 28.) 평택·당진항 종합발전계획 수립용역 중간보고회 개최 / 잡화부두 및 양곡부두 협의
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 공유수면 점·사용 실시계획
 - '23. 9. 승인 신청 및 승인 예정
- 육상 및 해상공사
 - '23. 9. 공사 착공 * '28. 1. 개장 목표

주관부서	항만수산과	부 서 장	김선태(4260)	팀 장	기호연(4261)	담 당 자	김건우(4263)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3 풍요로운 농어촌

3-1	수산물식품 클러스터 조성						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	112,300백만원

I

사업개요

○ 사업위치

○ 사업기간

○ 사업비

○ 사업내용

충남 주요생산 원물을 특화품목으로 육성하기 위한 생산·가공·유통시설 집적화

산·학·연·관 수산식품산업 네트워크 및 R&D 기반 구축

수산식품기업 대상 수출관련 정보 제공 및 제품개발 지원

수산식품산업 전문인력 육성 및 지역일자리 연계

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기반조성	-	완료		부지매입 12ha	예타대응 및 통과	실시설계 및 착수	완료
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	-	착수				실시설계	착수

※ 23년도 예타대상사업 미선정으로 사업기간 변경

수산식품클러스터 조성사업 기본계획 고도화 용역(충청남도)을 통한 사업위치, 사업비, 변경

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기반조성	간척지 활용 관련 종합용역 추진	간척지 활용 관련 종합용역 착수 추진	간척지 활용 관련 종합용역 완료 (도시계획 시설결정 및 농림지역 해제)	부지매입 12ha
생산·가공·유통시설 및 R&D 지원센터 조성	2026년 기반조성 완료 후 추진			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	112,300	0	74,800	0	0	0	37,400	37,400	37,500
국비	78,610		52,360				26,180	26,180	26,250
도비	10,107		6,732				3,366	3,366	3,375
시비	23,583		15,708				7,854	7,854	7,875
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (23. 01) 수산식품 클러스터 기본계획 고도화 용역 추진(충청남도 / 1.5억)
 - 기 수립된 사업계획 전략적 재검토 및 예타 대응 방향성 설정
- (23. 06) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입관련 협의 완료
 - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진시 계약해지 관련 동의서 작성 완료

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (23.01) 농림축산식품부 ‘23년 간척지 이용계획’, “당진시 사업시행자 지정” 계획 반영 ○ (23.03) 간척지 어업적 이용을 위한 종합용역 추진 (농어촌공사 / 10.5억)
-----------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (23. 10) 간척지 어업적이용 사업시행자 지정 (농림축산식품부)
- (23. 12) 농림축산식품부 소유부지(12ha) 매입 완료
- (24. 02) 수산식품클러스터 예비타당성조사 대상사업 신청

주관부서	항만수산과	부 서 장	김선태(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	고민정(4272)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-2	스마트양식 클러스터 조성						
-----	---------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	40,000백만원

I	사업개요
○ 사업위치	석문면 석문간척농지 수산단지 일원(10ha)
○ 사업기간	2024~2026
○ 사업비	400억원(국비 200억, 도비 60억, 시비 140억)
○ 사업내용	간척지 내 ICT·AI 등 첨단기술을 활용한 양식시설의규모화, 현대화로 친환경 양식단지 조성

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기반조성	-	완료	부지매입 3ha	부지매입 7ha	실시설계 용역	착수 및 완료	-
스마트 양식장 조성	-	완료	-	-	-	착수	완료

※ 해양수산부 양식산업과 협의 결과, 재정비율 등 사업비 변경
스마트양식단지 조성사업 기본계획 수립용역을 통한 간척지 내 스마트양식단지 위치 변경

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기반조성	스마트양식단지 조성사업 기본계획수립 및 타당성조사 용역 추진			부지매입 7ha
스마트 양식장 조성	2025년 기반조성 완료 후 조성 추진			

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	40,000	0	40,000	0		3,000	20,000	17,000	0
국비	20,000		20,000			1,500	10,000	8,500	
도비	6,000		6,000			450	3,000	2,550	
시비	14,000		14,000			1,050	7,000	5,950	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (23. 05) 스마트 양식단지 조성사업 실시설계비 반영 요청(30억/해수부→기재부)
- (23. 06) 농림축산식품부 소유부지(7ha) 매입관련 협의 완료
 - '22.10 : 기재부 소유부지(3ha) 매입 완료
 - 사업부지 내 임대영농법인 대상 사업설명 및 사업추진시 계약해지 관련 동의서 작성 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ (22.10) 석문간척지 내 기획재정부 소유 부지 3ha 매입 완료 ○ (23.01) 농림축산식품부 '23년 간척지 이용계획', "당진시 사업시행자 지정" 계획 반영 ○ (23.02) 스마트양식단지 조성 기본계획 수립 용역 (농어촌공사 / 3억) ○ (23.03) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성 시범사업 추진(송악읍 / 10억) ○ (23.05) 스마트양식단지 조성 사업 실시설계비 반영 요청 (30억)
---------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- (23. 10) 간척지 어업적이용 사업시행자 지정 (농림축산식품부)
- (23. 10) 친환경 순환여과식(RAS) 양식시스템(연어) 조성사업 완료(치어 6,000미 입식)
- (23. 12) 농림축산식품부 소유부지(7ha) 매입 완료
- (24. 01) 스마트 양식단지 조성사업 실시설계 용역 추진

주관부서	항만수산과	부 서 장	김선태(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	고민정(4272)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-3	장고항 어촌 6차산업 기지화
-----	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2021~2026	사업비	7,950백만원

I

사업개요

○ 수산물 처리·저장시설 조성

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2021~2024

- 사업비 : 37.8억원(도비 13.2억, 시비 7.1억, 자담 17.5억)

- 사업내용 : 수산물 냉동·냉장, 제빙시설 조성(부지면적 4,920㎡, 연면적 1,273㎡)

○ 청정위판장 조성

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2022~2024

- 사업비 : 31.7억원(국비 14.25억, 도비 2.7억, 시비 6.3억, 자담 8.45억)

- 사업내용 : 수산물판매장 조성(부지면적 6,275㎡, 연면적 950㎡)

○ 근해어선 지원사업

- 사업위치 : 석문면 장고항 국가어항 일원

- 사업기간 : 2023~2026

- 사업비 : 10억원

- 사업내용 : 위판수수료 및 어획물운반선 임차 지원

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
수산물 처리저장시설 조성	-	준공	실시설계	착공	준공	-	-
청정위판장 조성	-	준공	실시설계	착공	준공	-	-
근해어선 지원사업	-	추진	근해어선 유치	추진	추진	추진	추진

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
수산물 처리저장시설 조성	건축허가 등 행정절차 완료	협의체 구성 및 사업 검토	시공업체 선정 및 공사 착수	공정률 50%
청정위판장 조성				
근해어선 지원사업	어획물운반선 협회 업무협의		근해어선 및 어획물운반선 지원방안 협의	24년 예산확보

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,950	3,780	3,920	0	3,170	250	250	250	250
국비	1,425		1,425		1,425				
도비	1,590	1,320	270		270				
시비	2,340	710	1,380		630	250	250	250	250
민자	2,595	1,750	845		845				
기타	0		0						

※ 건설자재 단가 상승으로 인한 자담비용 증가 및 당진수협 활어위판장(20억) 공모사업 포기로 사업비 변경

IV 추진 실적

- (23. 05) 당진시 - 당진수협 수산유통산업 협의회 구성
- (23. 06) 충청남도-당진시-당진수협, 위판장 및 처리저장시설 조성사업 관련 업무협의

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ (23. 03) 국가어항 비지정권자 어항개발사업 시행허가 및 건축허가 등 행정절차 이행
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- (당진수협 의견)
 - 당진조업어선 어획물량 부족으로 위판물량 확보 불가
 - 조수간만의 차가 클 경우 근해어선 및 어획물운반선 접안 및 작업 불가
 - 위판장 운영관련 인건비, 시설유지비 등 적자발생 우려에 따라 당진시 직접지원 요청
- (당진시 대책)
 - 장고항 국가어항 유지준설 및 장고항 2단계공사 관련 국가어항 기본계획 반영
 - 근해어선 및 어획물 운반선 대상 위판물량 확보를 위한 사업 등 지원 예정

VI 향후 계획

- (23. 07) 당진수협 이사회 및 대의원 총회를 통한 사업 추진여부 결정

주관부서	항만수산과	부 서 장	김선태(4260)	팀 장	박상국(4270)	담 당 자	고민정(4272)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

- ('23. 04. 12.) 기반조성사업 실시설계 착수 보고
- ('23. 04. 18.) 스마트 원예단지 조성사업 사업부지 등기 이전 완료
- ('23. 05. 18.) 기반조성사업 실시설계 중간 보고

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 2022. 01. 사업부지 확보(농식품부 조건부 관리처분 승인) ○ 2022. 02. 스마트 원예단지 기반조성 및 저탄소에너지 공동이용시설 지원사업 공모 선정 ○ 2022. 10. 기반조성 및 에너지시설 지원사업 국비(1년차) 추경 예산 편성 완료 ○ 2022. 12. 지방재정투자사업(중앙) 승인 ○ 2022. 12. 스마트 원예단지 기반조성(에너지시설 포함) 세부 추진 계획 확정 ○ 2022. 12. 위수탁협약 체결 (당진시&한국농어촌공사 당진지사) ○ 2022. 12. 위수탁협약 사업비 지급 (국비 3,668백만원) ○ 2023. 01. 31. 스마트 원예단지 조성사업 설명회 개최 ○ 2023. 03. 14. 기반조성 실시설계 업체 선정 및 계약 ○ 2023. 03. 31. 사업대상지 15.6ha 매매 계약 체결(소유권 당진시로 이전)
--	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2023. 07. 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 착수
- 2023. 08. 기반조성사업 실시 설계 완료
- 2023. 10. 기반조성사업 착공 추진
- 2023. 12. 저탄소에너지 공동이용시설 실시설계 완료
- 2024. 02. 저탄소에너지 공동이용시설 공사 발주 및 추진
- 2024. 06. 스마트 원예단지 기반조성사업 준공
- 2024. 06. 농식품부 스마트팜 온실신축사업 공모 추진
- 2024. 10. 저탄소에너지 공동이용시설 준공
- 2025. 01. 스마트팜 온실신축(생산시설, 냉난방 시설) 추진
- 2026. 12. 스마트 원예단지 조성 완료 및 작목 생산

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	구자복(4135)	담 당 자	임지혜(4137)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-5	공공형 외국인 계절 근로 제도 도입
-----	---------------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	1,900백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 대호지농업협동조합(운영주체)
- 사업기간 : 2023. - 2026.
- 사업비 : 시비 300백만원(연 운영비)
- 사업내용
 - 기본계획에 따라 송출국과 MOU 체결 등을 통해 외국인 계절근로자 도입
 - 외국인계절근로자 프로그램에 따라 외국인근로자와 근로계약(고용) 후 필요 농가에 노동력 제공
 - 사전에 참여농가 모집, 농가 공급 일정 등을 수립하고 운영 규모에 따라 농가 파견

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	명	年 100	70 (시범)	100 (本格)	100	100	100

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공공형 외국인 계절 근로 제도 도입	농가 수요 파악 및 근로자 선발 요청	근로자 비자 발급 및 입국 지원	농가 수요 파악 및 근로자 선발 요청	근로자 비자 발급 및 입국 지원

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,900	0	1,500	0	300	400	400	400	400
국비	160		128		32	32	32	32	32
도비	249		199		49	50	50	50	50
시비	1,491		1,173		219	318	318	318	318
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023. 04. 20. 몽골계절근로자 입국 및 근로시작
- 2023. 05. 10. 하반기 외국인계절근로자 수요조사 및 배정 신청
- 2023. 06. 02. 몽골계절근로자 선발 요청
- 2023. 06. 26. 비자발급인정서 몽골 송부

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.3.]	○ 22. 10. 13. ~ 10. 16. 몽골 4개 지자체와 외국인계절근로자 교류 MOU체결완료 - MOU체결 지방정부 : 셀렝그, 헨티, 바양걸, 우부르항가이 ○ 22. 9. 28. 도내 15개시군과 라오스 간 합동 MOU체결 ○ 22. 10. 31. 23년 상반기 외국인계절근로자 고용 희망농가 모집 ○ 23. 01. 17. 공공형계절근로사업 농림부 공모 사업 선정 ○ 23. 03. 22. 지원 계획 수립 및보조금 지급
-------------------------------------	--

- 연도별 외국인계절근로자 운영 현황 (2021년~2023년)

구 분	합계	2021년(상)	2022년		2023년(상)	비고
			상반기	하반기		
근로자	402	7	34	93	268	하반기신청 581명

V 문제점 및 대책

- 외국인계절근로자 도입 확대에 따른 근로자 유치 및 관리 업무 급증 등 비자발급업무 폭주로 인한 행정 부담
 - 인권보호·무단이탈 방지를 위한 외국인계절근로자 근무·고용실태 점검 및 대응 인력 부족
 - 비자발급인정서 발급 지연으로 인한 입국 지연 및 기타 각종 민원 발생
- ⇒ 효율적 대처를 위해 외국인계절근로자 전담운영을 위한 농촌인력지원TF팀 신설

VI 향후 계획

- 2023. 08. 10. 공공형 몽골근로자 인력 배치 희망 농가 접수
- 2023. 09. 01. 공공형 몽골근로자 입국 지원 및 사전 교육 실시
- 2023. 10. 01. '24년 상반기 외국인계절근로자 수요조사

주관부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	이재영(4121)	담 당 자	김동숙(4122)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-6	대형 저온 저장고 설치 및 농산물 전량 구매						
-----	--------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2027	사업비	1,200백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 관내							
○ 사업기간 : 2022 ~ 2027							
○ 사업비 : 1,200백만원(농산물가격안정기금)							
○ 사업내용 : 당진 농산물 구매·저장 등 수급 조절이 가능한 대형 저온저장고 임차료 지원사업으로 수확철 일시 출하되는 농산물의 수급 조절 및 가격안정화, 농산물 출하조절을 통한 가격안정 대책 및 유통사업 활성화 추진							

II 사업목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대형 저온저장고(창고) 임차료 지원	1개소	임차 창고 확보 후 농산물 보관	임차 창고 확보 후 농산물 보관 임차료 지원				

※ 사업목표 변경 사유 : 민간유치 대형 저온저장고 신축보다는 기신축된 저온저장고 활용

III 사업계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농산물 저온저장 보관창고 임차(사용) 지원사업	사업 계획 수립 및 신청·접수	사업 신청물량 품목별 입·출고 시기 등 협의 및 창고 물품 입고	하반기 수확 품목 추가 신청·접수	사업 신청물량 품목별 보관 및 출고

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,200	0	1,200	0	300	300	300	300	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,200		1,200		300	300	300	300	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ '23년 2분기 추진실적

- ('23. 6. ~ 8.) 사업신청자 대상 품목별 저온창고 입고 및 보관

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 민간업체 저온저장고 이용방안 검토 및 임차 협의 - 임차 가능 여부 및 면적, 보관방식 등 민간업체와 협의 ○ 저온저장고 사용 희망 농가 및 물량 수요조사 실시('22. 10. 5. ~ 11. 30.) - 읍·면·동 및 지역농협에서 수요조사 실시[44농가(11농가, 2개 단체)] ○ 지원을 위한 조례 제정 및 내년 예산확보 추진 - 기 제정된 당진시 농산물가격안정기금 설치 및 운용 조례 활용 - '23년 본예산 3억원 확보(농산물가격안정기금) ○ 농산물 저온저장 보관창고 임차(사용) 지원사업 신청·접수('23. 2. 10. ~ 3. 20.) - 신청·접수 결과 : 14농가(1농가, 4개 단체 / 생강 110톤, 감자 200톤)
--	--

V 문제점 및 대책

○ 민간자본 투자유치 시 가능(당진시 자체 사업비 조달 어려움)

⇒ 단, 민간자본 투자유치 실패 시 정부 공모사업을 통한 저온저장고 일부 확충

⇒ 기설치된 저온저장고(창고) 임차를 통한 농산물 보관 임차료 지원

VI 향후 계획

○ 농산물 수확철 저온창고 보관 물량 지속 파악하여 희망 농가에 농산물 보관 임차료 지원

○ 10월 중 생강작목반 저온창고 보관 희망 시 생강 입고 및 임차료 지원

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	김도형(4741)	담 당 자	고유라(4742)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-7	농촌융복합산업 육성 (고구마 가공산업화, 전통주 육성)						
-----	--	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	1,005백만원

I 사업 개요

1 고구마 가공산업화

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 400백만원(도비 236, 시비 84, 자담 80)
- 사업내용 : 고구마 가공산업화(농촌융복합산업화)
 - 1차 농산물 생산 탈피, 전문 경영체 육성 공모사업 응모, 가공산업화 추진
 - 가공품 개발(*페이스트, 고구마술 등) 고부가가치 창출, 축제.체험 연계 농촌융복합산업화
 - * 고구마를 으깨어 조미한 식품

2 전통주 육성

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 605백만원(도비 2.5, 시비 302.5, 자담 300)
- 사업내용 : 당진 전통주 육성
 - 전통주 자원조사, 차별화된 제조공정 반영 자체 사업계획 수립 및 지원
 - 전통주 제조명인 발굴 및 육성, 명인별 차별화된 제조공정 계승을 위한 개별사업화 지원

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고구마 가공산업화 (농촌융복합산업 공모사업)	1개소	가공산업화 경영체육성	경영체조사 공모준비	공모신청 예산확보	사업추진	사업준공	-
전통주 육성 (전통주 육성 자체사업)	1개소	전통주제조 명인육성	전통주 자원조사	사업계획수립 예산확보	사업추진	사업준공	-

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고구마 가공산업화 (농촌융복합산업 공모사업)	공모사업 신청 홍보 기 지원 경영체 모니터링	공모사업 신청 홍보 기 지원 경영체 모니터링	가공산업화 경영체육성 기 지원 경영체 모니터링	가공산업화 경영체육성 기 지원 경영체 모니터링
전통주 육성 (전통주 육성 자체사업)	전통주 자원조사	전통주 제조명인 육성	전통주 제조명인 육성	전통주 제조명인 육성

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,005	0	1,005	0	5	400	600	0	0
국비	0		0						
도비	238.5		238.5		2.5	236			
시비	386.5		386.5		2.5	84	300		
민자	380		380			80	300		
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ '23년 2분기 추진실적

- ('23.04.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 서류 탈락(1개소)
- ('23.04.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주)
- ('23.04.) 농촌융복합산업 경영체 모니터링
→ 주류 관련 경영체 2개소, 고구마 가공 관련 경영체 1개소
- ('23.05.) 주류제조면허(지역특산주) 추천 완료(탁주)
- ('23.06.) 주류제조면허(지역특산주) 추천신청서 제출(약주)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	① 고구마 가공산업화
	○ ('22.09.) 농촌융복합 분과위원회를 통한 고구마 가공산업화 방안 논의
	○ ('22.09.) : 고구마 가공산업 경영체 발굴을 위한 사업체 현장 미팅 추진(1개소)
	- 고구마 활용방안(가공방안) 및 상품화, 판로계획 등 가공산업 계획 논의
	② 전통주 육성
	○ ('22.08.) 전통주 제조업체 고구마술 제조면허 취득 절차 추진
	○ ('23.03.) 찾아가는 양조장 사업 공모사업 접수(1개소)

V 문제점 및 대책

- 고구마 1차 농산물 생산 집중, 제조 가공 등 융복합산업화 인식 저조
→ 기 공모사업 지원 경영체 통한 가공품 개발 추진
- 전통주(가양주) 농경문화 일부분으로 인식, 제조 가공 시설 낙후, 주류 취급 관련 제도권 밖
→ 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성

VI 향후 계획

- 공모사업 참여 경영체 육성(경영체 의지, 자부담 확보, 운영(매출)계획 등 검토)
- 기 공모사업 지원 경영체 모니터링 통한 가공품 개발 추진
- 기 투자된 경영체 및 제조 명인을 통한 전통주 산업 육성 추진

주관부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4740)	팀 장	임영철(4750)	담 당 자	박솔아(4751) 최현정(4752)
협조부서	농촌진흥과	부 서 장	윤재윤(6301)	팀 장	한만호(6320)	담 당 자	오창석(6323)

3-8	기존 축사를 스마트 축산단지 전환
-----	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2020~2024	사업비	34,860백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외 32필지 ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ○ 사업비 : 348.6억원(기반조성95, 축산시설180, 낙농시설17.6 부지매입56) - 기반조성 : 95억원(국62.5 도9.75 시22.75) - 부지매입 : 56억원(당진낙농축협 매입) - 축산시설 : 180억원(용자144, 자부담36) - 낙농시설 : 17.6억원(국5.28 용8.8 자3.52) - 재원내역 : 보조100.28억원(국67.78 도9.75 시22.75), 자담248.32억원(용152.8 자95.52) ○ 규모 : 낙농 1,000두, 부지 138,778㎡, 건축 41,339㎡ ○ 사업내용 - 첨단 ICT 융복합 기술을 접목 최적화된 친환경 동물복지형 축산단지 조성 - 생산·가공·유통·체험·관광까지 일원화된 6차 산업형 친환경 축산 복합단지 연계 조성																																																																																																		
II 사업목표 [확인지표] <table border="1"> <thead> <tr> <th>단위사업</th><th>단위</th><th>목표</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>축산단지 기반조성</td><td>-</td><td>완료</td><td>완료</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>관계교육센터</td><td>-</td><td>준공</td><td>착공</td><td>준공</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>축산시설</td><td>-</td><td>준공</td><td>업체선정</td><td>착공</td><td>준공 및 입주</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	축산단지 기반조성	-	완료	완료					관계교육센터	-	준공	착공	준공				축산시설	-	준공	업체선정	착공	준공 및 입주																																																											
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																											
축산단지 기반조성	-	완료	완료																																																																																															
관계교육센터	-	준공	착공	준공																																																																																														
축산시설	-	준공	업체선정	착공	준공 및 입주																																																																																													
III 사업계획 [추진계획] <table border="1"> <thead> <tr> <th>단위사업</th><th>1분기</th><th>2분기</th><th>3분기</th><th>4분기</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>축산단지 기반조성</td><td>완료</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>관계교육센터</td><td>건축준비</td><td>건축착공</td><td>공사</td><td>완공</td></tr> <tr> <td>축산시설</td><td>건축준비</td><td>건축착공</td><td>공사</td><td>공사</td></tr> </tbody> </table> [투자계획] (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">재원</th><th rowspan="2">총계</th><th rowspan="2">기투자</th><th colspan="5">임기중 투자계획</th><th>임기후 투자</th></tr> <tr> <th>소계</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총계</td><td>34,860</td><td>10,140</td><td>24,720</td><td>3,960</td><td>20,760</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>국비</td><td>6,778</td><td>3,325</td><td>3,453</td><td>2,425</td><td>1,028</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>도비</td><td>975</td><td>427.5</td><td>547.5</td><td>397.5</td><td>150</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>시비</td><td>2,275</td><td>787.5</td><td>1,487.5</td><td>1,137.5</td><td>350</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>민자</td><td>9,552</td><td>5,600</td><td>3,952</td><td></td><td>3,952</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>15,280</td><td></td><td>15,280</td><td></td><td>15,280</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기	축산단지 기반조성	완료				관계교육센터	건축준비	건축착공	공사	완공	축산시설	건축준비	건축착공	공사	공사	재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	소계	2022	2023	2024	2025	2026	총계	34,860	10,140	24,720	3,960	20,760	0	0	0	국비	6,778	3,325	3,453	2,425	1,028				도비	975	427.5	547.5	397.5	150				시비	2,275	787.5	1,487.5	1,137.5	350				민자	9,552	5,600	3,952		3,952				기타	15,280		15,280		15,280			
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기																																																																																														
축산단지 기반조성	완료																																																																																																	
관계교육센터	건축준비	건축착공	공사	완공																																																																																														
축산시설	건축준비	건축착공	공사	공사																																																																																														
재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자																																																																																										
			소계	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																										
총계	34,860	10,140	24,720	3,960	20,760	0	0	0																																																																																										
국비	6,778	3,325	3,453	2,425	1,028																																																																																													
도비	975	427.5	547.5	397.5	150																																																																																													
시비	2,275	787.5	1,487.5	1,137.5	350																																																																																													
민자	9,552	5,600	3,952		3,952																																																																																													
기타	15,280		15,280		15,280																																																																																													

IV 추진 실적

- 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사중

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 스마트축산 ICT 시범단지 기반조성 완료 ○ 관제교육센터 및 축산시설 건축착공, 정상추진중
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 단지내 지하수(음용수)가 염수로 정수처리 및 폐수처리시설 설치(약 11억원)
- 물가상승으로 계획 대비 사업비 증가로 입주 농가 비용부담 예상

VI 향후 계획

- ('23.03.) 관제교육센터 및 축산시설 건축 공사 정상 추진
- ('23.09.) 축산분야 ICT 융복합 장비 사업 신청('24년 농림사업 신청)
- ('23.11.) 축산단지 입주농가 설명회
- ('23.12.) 관제교육센터 완공
- ('24.4분기) 축산단지 완공 및 농가입주

주관부서	축산지원과	부 서 장	장명환(4210)	팀 장	이상현(4220)	담 당 자	이상현(4220)
협조부서	건축과	부 서 장	최원진(4450)	팀 장	이소정(4451)	담 당 자	김민경(4453)

3-9	6차 산업화 축산 체험단지 조성
-----	-------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2028	사업비	3,300백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 고대면 당진포리 236-20외(스마트 축산단지 내) ○ 사업기간 : 2024년~ ○ 사업비 : 3,300백만원(도90, 시120, 자담90, 용자3,300) ○ 사업내용 - 스마트 축산단지내 먹이주기, 놀이시설, 포토존, 산책길 등 목장 체험시설 조성 - 낙농체험, 놀이, 유가공품 제조·체험, 농·축산물판매 등 낙농테마파크(역사관, 놀이공원, 푸드코트 등 / 약 200억원) 중장기 사업 연계 추진
--

II 사업목표 [확인지표] <table> <tr> <th>단위사업</th><th>단위</th><th>목표</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr> <td>목장 체험·놀이시설</td><td>-</td><td>완료</td><td></td><td></td><td>예산확보</td><td>설치완료</td><td></td></tr> <tr> <td>유가공공장 유제품 체험장</td><td>-</td><td>공모신청</td><td></td><td></td><td></td><td>자격취득</td><td>공모신청</td></tr> <tr> <td>낙농테마파크</td><td>-</td><td>사업건의</td><td></td><td></td><td></td><td>기본계획</td><td>사업건의</td></tr> </table>	단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	목장 체험·놀이시설	-	완료			예산확보	설치완료		유가공공장 유제품 체험장	-	공모신청				자격취득	공모신청	낙농테마파크	-	사업건의				기본계획	사업건의
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026																									
목장 체험·놀이시설	-	완료			예산확보	설치완료																										
유가공공장 유제품 체험장	-	공모신청				자격취득	공모신청																									
낙농테마파크	-	사업건의				기본계획	사업건의																									

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
목장 체험·놀이시설	시기미도래			
유가공공장 유제품 체험장	시기미도래			
낙농테마파크	시기미도래			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,300	0	3,300	0	0	0	300	3,000	0
국비	0		0						
도비	90		90				90		
시비	120		120				120		
민자	90		90				90		
기타	3,000		3,000					3,000	

IV 추진 실적

- 스마트축산 ICT 시범단지 조성중

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 스마트축산 ICT 시범단지 조성중
--------------------------------------	----------------------

V 문제점 및 대책

- (사업시기 미도래) 스마트축산 ICT 시범단지 완공 및 농가 입주 후 추진

VI 향후 계획

- 목장 체험·놀이 시설
 - 스마트 축산단지 조성 완료 후 목장체험시설(먹이주기, 놀이터, 포토존, 산책길 등/3억원) 우선 설치
- 유가공 공장, 유제품 체험장
 - 6차산업 사업자 인증 자격(2년, '23~'24) 및 시설 설치 자격(2년, '25~'26) 조건 충족 후 농촌융복합사업 신청
- 낙농테마파크
 - 200억원이 넘는 대규모 사업으로 중장기 추진(기본계획, 신규사업 건의, 경제성 고려 등 타당성 검토)

주관부서	축산지원과	부 서 장	장명환(4210)	팀 장	이상현(4220)	담 당 자	이상현(4220)
협조부서	농식품유통과	부 서 장	신낙현(4710)	팀 장	임영철(4750)	담 당 자	박솔아(4751)

3-10	농촌융복합산업 육성 (가화포도 로컬와인 개발)						
------	--	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	288백만원

I 사업 개요

- 기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업비 : 288백만원(국비55, 도비48, 시비137, 민자48)
- 주요내용 : 가화포도를 활용한 와인양조 전문가 양성 및 와인생산기반조성
 - (전문가양성) ㄱ 23년 와인양조 기초 교육(10회, 40시간, 25명)
 - ㄴ 24년 와인양조 심화 교육 및 컨설팅 (10회, 40시간, 10명)
 - (생산기반조성) 24~26년, 와인생산 기반조성 3개소(1개소/년)
 - ▷ 와인 제조설비, 와인 브랜드, 포장재 개발 등
 - (연계사업확대) 26년 숙박, 음식과 연계한 체류형 관광상품 개발

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전문가 양성	명	35		25 (기초교육)	10 (심화교육)		
와이너리 조성	개소	3			1	1	1

- 가화포도 와인개발 및 와이너리 운영을 위한 전문인력양성(와인양조교육 운영)
 - 23년 기초교육(10회, 25명) ⇒ 24년 심화교육 및 컨설팅(10회, 10명)
- 와인생산 기반조성 : (기존) 年 1~2개소 / 총 5개소 → (변경) 年 1개소 / 총 3개소
 - 대상 : 와인양조 교육 수료자
 - 지원내용 : 제조설비, 브랜드 및 포장재 개발 등

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
전문가 양성	기초이론	벤치마킹	벤치마킹	기초실습
와인생산 기반조성	시기 미도래			
연계사업 확대				

- 와인생산 전문가 양성 프로그램 운영
 - 와인양조 교육 : (23년) 기초교육(10회, 25명) ⇒ (24년) 심화교육(10회, 10명)
 - 가공지원센터와 연계한 현장실습 중심 교육 추진
- 와인생산 기반조성
 - 지원대상자 : 와인양조 교육 수료생
 - 재원확보 : 국도비 관련 공모사업을 통해 사업비 확보

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	288	0	288	0	18	110	80	80	0
국비	55		55			55			
도비	48		48				24	24	
시비	137		137		18	55	32	32	
민자	48		48				24	24	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 하반기 견학, 교육 등 진행 예정

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.09.) 23년도 와인교육과정 운영 방침 결재 ○ ('22.10.) 포도연구회 와인양조교육 운영 방향 협의 ○ 가화포도 와인개발을 위한 와인양조 기초교육 이론과정(3회, 26명) 완료
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- (문제점) 가화포도 부가가치 향상을 위한 와인개발에 관심이 많으나 양조기술 부족
- (대 책) 와인양조교육 개설을 통한 와인생산 전문가 양성 및 협의체 구성
농산물가공지원센터를 활용 와인창업 실습을 통한 가공사업에 대한 리스크 최소화

VI 향후 계획

- 전문가양성
 - 기초교육: 23년 하반기 와인양조 기초교육 실습과정(4회)
 - 심화교육: 24년 와인양조 심화교육 및 컨설팅(10회, 40시간, 10명)
- 와인생산 기반조성을 위한 국도비 공모사업을 통한 사업비 확보

주관부서	농촌진흥과	부 서 장	심화섭(6301)	팀 장	조세미(6320)	담 당 자	오창석(6323)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

3-11	농업기술센터 조직개편
------	-------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업개요

- 농업정책과, 축산지원과를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관
- 농업과 축산업무를 농업기술센터에서 경제환경국으로 이관하여 농축산 경제 활성화 및 환경과 연계할 수 있는 기반을 마련하고 농업기술센터에서는 기술지도 및 특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	-	농업정책과, 축산지원과 본청 이관	농업정책과, 축산지원과 본청 이관				

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농업정책과, 축산지원과 본청 이관	지속 운영			

IV 추진실적

- '시민 행복·경제도시 당진'구현을 위한 조직개편 완료('22.8.8.)
 - '농식품유통과'신설 : 유통·가공 등 6차 산업을 통한 소득 창출 증대
 - '농업정책과·축산지원과'를 농업기술센터에서 본청으로 이관 완료
 - 농축산 지원업무 본청 이관으로 민원처리 편리성 구현
 - 농업기술센터의 기술지도·특화작물 개발 등에 주력할 수 있는 체계 구축

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후계획

- 기존 농업기술센터에 있던 지원부서인 농업정책과와 축산지원과를 본청으로 이관하여 농업기술센터에 농촌지도 기술개발에 주력할 수 있는 체계 구축
- 농업·축산 관련 인허가 신청 등 지원업무를 본청으로 일원화하여 민원 처리

주관부서	자치행정과	부서장	김지환(3231)	팀장	곽신근(3240)	담당자	이명희(3241)
------	-------	-----	-----------	----	-----------	-----	-----------

3-12	농촌개발 사업추진						
------	-----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2027	사업비	69,035백만원

I 사업개요

- 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업
 - 고대면(중심지) : 2016~2021년(6년)/ 고대면 용두리 일원/ 5,177백만원
 - 면천면(중심지) : 2018~2023년(6년)/ 면천면 성상리 일원/ 5,587백만원
 - 우강면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 우강면 송산리 일원/ 3,880백만원
 - 대호지면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 대호지면 조금리 일원/ 4,000백만원
 - 정미면(기초) : 2019~2023년(5년)/ 정미면 천의리 일원/ 4,000백만원
 - 순성면(기초) : 2021~2024년(4년)/ 순성면 봉소리 일원/ 4,000백만원
 - 송산면(기초) : 2022~2025년(4년)/ 송산면 삼월리 일원/ 4,000백만원
- 농촌 신활력플러스 사업
 - 사업기간 : 2022~2025년(4년)
 - 총사업비 : 7,000백만원(국비 4,900백만원, 지방비 2,100백만원)
 - 사업내용 : 신활력 아카데미 운영, 농촌활력지원단 구성 및 운영, 농촌형 사회적경제 활성화 사업 및 공동체 플랫폼 구축
- 농촌협약

지자체가 자체적으로 수립한 농촌공간 발전계획에 대해 중앙에서 1개소당 국비 최대 300억을 지원하여 농촌 생활SOC 시설 확충

- 사업기간 : 협약 체결일로부터 5년간(2024~2028)
- 사업위치 : 2읍 8면(동 지역 및 해수부 관할 석문면 제외)
- 협약주체 : 농림축산식품부 장관 ⇔ 당진시장

II 사업목표

[확인지표(누계)]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
거점시설 조성	건	7	2	4	5	6	7
신활력플러스 사업 참여 조직	개소	20	-	5	10	15	20
배후마을 PG 전달	회	20			10	15	20

- 농촌 거점 기반의 생활 서비스 기능시설 마련을 통한 정주 환경 조성

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
농촌중심지, 기초생활거점	[송산] · 충남 광역계획지원단 자문완료	[대호지, 면천] · 시설물 인수·인계 완료 [순성] · 시행계획 승인 [송산] · 기본계획 승인	[우강] · 시설물 인수·인계 완료	[정미] · 공사완료
신활력플러스 사업	기본계획 승인	액션그룹 1기 양성	공동체경제 1기 지원	공동체플랫폼 설계 완료
농촌협약	· 농촌협약 위원회 및 행정협의회 개최 · 전문가 컨설팅 실시	· 농촌협약 공모 신청 · 충남도 평가 · 농식품부 평가	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정

[투자계획]

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	11,140	0	11,140	5,411	2,444	2,429	856	0	0
국비	7,800		7,800	3,790	1,711	1,700	599	0	
도비	2		2	2	0	0	0	0	
시비	3,338		3,338	1,619	733	729	257	0	
민자	0		0	0	0	0	0	0	
기타	0		0	0	0	0	0	0	

○ 농촌 신활력플러스 사업

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,471	0	7,471	1,505	2,222	2,222	1,522	0	0
국비	4,760		4,760	980	1,400	1,400	980		
도비	0		0						
시비	2,711		2,711	525	822	822	542		
민자	0		0						
기타	0		0						

○ 농촌협약

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	50,424	0	41,547	0	0	10,913	16,155	14,479	8,877
국비	29,965		23,935			5,518	8,729	9,688	6,030
도비	2,479		1,944			471	717	756	535
시비	10,936		8,704			1,894	3,172	3,638	2,232
민자	0		0						
기타	7,044		6,964			3,030	3,537	397	80

IV 추진 실적

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

사업명	시기	추진내용	
농촌중심지 활성화사업 (면천)	4월	면천면	시설물 인수인계 완료
	5월	면천면	민간위탁심의 완료
	6월	면천면	민간 위수탁 협약체결 추진
기초생활 거점조성사업 (우강, 대호지, 정미, 순성, 송산)	4월	순성면	실시설계 수립관련 주민위원회 회의
		송산면	충청남도 광역계획지원단 자문협의 완료, 공공건축심의 완료
	5월	우강면	실정보고(3차) 승인
		송산면	기본계획 승인 완료(충청남도)
	6월	우강면	지역경관개선사업(방향안내판) 추진
		대호지면	시설물 인수인계 완료
		송산면	기본계획 승인 고시

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 농촌중심지활성화사업(고대면) : 민간 위수탁 협약체결(2월)
	○ 농촌중심지활성화사업(면천면) : 민간 위수탁 추진계획 수립(2월), 시행계획(변경3차) 고시(3월)
	○ 기초생활거점조성사업(우강면) : 약시우강사랑채 준공식 개최(3월)
	○ 기초생활거점조성사업(대호지면) : 민간 위수탁 추진계획 수립(2월), 시행계획(변경2차) 고시(3월)
	○ 기초생활거점조성사업(정미면) : 실정보고(1차) 승인(2월)
	○ 기초생활거점조성사업(순성면) : 지역협의체 회의 및 실시설계 착수보고회 개최(2월)
	○ 기초생활거점조성사업(송산면) : 사업대상지 변경 협의 완료(3월)

○ 농촌신활력플러스사업

사업명	시기	추진내용
신활력플러스사업	1~3월	농촌신활력플러스사업 기본계획(안) 시장 보고 농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 최종 심의 및 의결) 농촌신활력플러스사업 기본계획(안) 농식품부 심의 제출
	4월	액션그룹 1기 아카데미 양성 교육 추진
	5~6월	농촌신활력플러스사업 기본계획 농림축산식품부 승인 농촌통합활동관(가칭) 공유재산심의 및 공유재산관리계획 심의·의결 농촌신활력플러스사업 추진위원회 개최(기본계획(안) 보완사항 심의 의결)

○ 농촌협약

사업명	시기	추진내용
농촌협약	1~3월	농촌협약위원회 및 농촌협약 행정협의회 개최
	4월	「농촌공간 전략 및 농촌생활권 활성화계획」수립 및 공모신청
	5월	충남도 및 농림축산식품부 대면평가
	6월	농촌협약 대상 시군 최종 선정

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성사업

사업명	구분	추진내용
기초생활 거점조성사업 (우강, 정미, 순성, 송산)	우강면	'23.07. : 사업완료 및 시설물 인수인계 완료
	정미면	'23.12. : 사업완료
	순성면	'23.08. : 시행계획 승인 고시 '23.09. : 사업착수 '24.12. : 사업완료
	송산면	'23.12. : 시행계획 승인 고시 '24.02. : 사업착수 '25.12. : 사업완료

○ 농촌신활력플러스사업

사업명	시기	추진내용
신활력플러스사업	7월	농촌통합지원센터(가칭) 건축계획 용역 발주 공동체경제 지원 및 농촌활력지원단 양성 추진
	9월	농촌통합지원센터(가칭) 설계 추진

○ 농촌협약

사업명	시기	추진내용
농촌협약	7~8월	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 1차 검토·조정
	9~10월	· 농식품부 실무협의회 및 전문가 자문 등을 통한 대상사업 2차 검토·조정

주관부서	공동체새마을과	부 서 장	정영환(3180)	팀 장	정해일(3181)	담 당 자	정제원(3182) 김병찬(3184) 손영수(3189)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-------------------------------------

3-13	지역특화작목 육성지원						
------	-------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	6,269백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 주요품목 : 잡곡, 쪽파, 파리고추, 쌈채류, 사과, 포도

○ 사업비 : 6,269백만원(국 1,195, 도 1,380, 시 3,052, 자부담 642)

○ 주요내용 : 지역 특화 가능 품목(품종) 선정 및 집중적 기술지원

- 주산지 중심의 조직화·규모화된 작목, 발전가능 작목 특화 육성

웰빙잡곡 '순성'

검은들 웰빙잡곡단지화

쪽파 '합덕'

최고품질 쪽파 주산단지화

파리고추 '면천'

안정적 생산환경 기술보급

쌈채 '신평'

시설환경개선 최고품질화

사과 '송악, 신평, 석문, 순성 등'

생력화 미래형 다축과원

포도 '순성'

스마트 방제, 우수품종 확대

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
잡곡	품목, ha	3품목, 30ha	기초조사	1작목 육성	2작목 육성	상품화 기반	3품목 상품화
쪽파	톤/10a	생산량 30% 향상	2	2.2	2.4	2.5	2.7
파리고추	톤/10a	생산량 20% 향상	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
쌈채류	%	전 회원 GAP 인증	89	92	95	98	100
사과	면적, ha	ICT 활용 기반 면적 15ha 조성	2	4	8	10	15
포도	천원/10a	농가소득 15% 향상	2,500	2,600	2,700	2,800	2,880

○ 잡곡 : 30ha, 40호 단지화, 농가소득 향상 1,360천원/10a → 2,000천원/10a

○ 쪽파 : 2작기→3작기→4작기 연중생산체계 정립으로 생산량 30% 증대 2톤/10a → 2.7톤/10a

○ 파리고추 : 54.4ha, 683호 최고품질 파리고추 생산량 확대 2.2톤/10a → 2.6톤/10a

○ 쌈채류 : 19ha, 97호 안전농산물 생산을 위한 쌈채연구회 96명 전회원 GAP인증

○ 사과 : 15ha, 20호 ICT활용 사과 재배 기술보급, 농가소득 향상 4,800천원/10a → 5,700천원/10a

○ 포도 : 35ha, 50호 단지화, 농가소득 향상 2,500천원/10a → 2,880천원/10a

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
지역특화작목 육성	사업계획 수립 및 요인 투입	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협업체 운영	작목별 핵심기술 중점 보급 및 현장교육 협업체 운영	성과분석 및 확대방안 마련

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,269	45	6,224	45	900	1,463	2,220	1,596	0
국비	1,195	20	1,175	20	140	301	382	332	
도비	1,380		1,380		224	325	457	374	
시비	3,052	24	3,028	24	487	701	1,113	703	
민자	0		0						
기타	642	1	641	1	49	136	268	187	

IV 추진 실적

- 2023. 1. : 지역특화작목육성 작목별 사업계획 수립, 순성 웰빙잡곡 작목반 결성(1.31.)
- 2023. 2. : 지역특화작목 사업대상자 선정
- 2023. 3.~4. : 특화작목별 핵심기술 투입 및 핵심 재배기술 교육 6회(사과, 포도, 쪽파)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (‘22.08.09.) ‘검은들 웰빙 잡곡 특화 육성’ 공약사항 추진을 위한 사전 협의회 추진 ○ (‘22.10.17.) 도비 확보를 위한 사업계획 발표 심사 → 심사결과 400백만원 확보 → 사업추진(‘23년) - 지역특화작목(사과, 쌈채류) 도비 사업 확보 : 사업비 400백만원(도비 50%, 시비 50%) ○ (‘22.10.18.) : 지역특화작목 육성 계획수립 ○ 시설채소 (파리고추, 쌈채) 영농현장 컨설팅 추진 : 2회, 34명 ○ 포도 재배농가 역량강화를 위한 교육 추진 : 농업기술대학 포도과정 20회, 40명
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 특화작목 관련 신품종, 신기술, 판매망 등 미비
→ 국·도비 사업으로 관련 기술, 품종 등의 시범적 투입, 우수농가 멘토-멘티 체결 및 컨설팅 적극 지원 후 점진적 확대 추진

VI 향후 계획

- 2023. 7. ~ 11. 작목별핵심기술 교육·보급 및 현장지도
- 2023. 11. 성과분석 및 특화작목 확대방안 마련

주관부서	기술보급과	부 서 장	이지환(6350)	팀 장	박상철(6351)	담 당 자	박소연(6354)
협조부서	농업정책과	부 서 장	이남길(4120)	팀 장	김영빈(4130)	담 당 자	안지윤(4131)

3-14	디지털 농업기술 확대 보급						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,300백만원

I 사업 개요

① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축

- 사업위치 : 농업기술센터 내 친환경농업과학관
- 사업기간 : 2022.08.~2026.12.
- 사업비 : 1,700백만원(국 850, 시 850)
- 사업내용
 - 미생물 생산균종 4종(고초균·광합성균·효모균·유산균) 매회 자가 품질관리를 통한 병원성미생물 불검출
 - 친환경 미생물 생산시설 고도화를 통한 데이터 분석 정밀농업 디지털 농업기술 확대
 - 친환경농업관 내 시설개선(살균 배양기 → 멸균 배양기), 무인공급(키오스크) 설치활용 등

② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입

- 사업위치 : 농업기술센터 내 사료 품질관리실
- 사업기간 : 2023.01.~2026.12.
- 사업비 : 600백만원(국 100, 도 120, 시 260, 자 120)
- 사업내용
 - 국제 곡물 가격 상승에 따른 축산농가 경영비 부담증가로 자가 배합 TMR 활용 농가의 사료분석을 통한 고효율 배합비 조정 처방 및 활용 지도
 - 축산농가 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
 - 자가 TMR 정밀 분석, 컨설팅, ICT 활용 신제품 조사료 생산, 축산 2세 경영비 절감 실증연구사업

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	-	불검출	불검출				
TMR 사료분석 및 컨설팅	건	100	구축완료	50	70	100	100

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
미생물생산균종(4종) 병원성미생물 불검출	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)	미생물 생산·공급	미생물 생산·공급 정기검사(외부기관)
TMR사료분석 및 컨설팅	장비 시운전 및 숙련	장비 시운전 및 숙련	정밀분석 25건	정밀분석 25건

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,300	0	2,300	1,100	500	500	100	100	0
국비	950		950	650	150	150			
도비	120		120		30	30	30	30	
시비	1,110		1,110	450	290	290	40	40	
민자									
기타	120		120		30	30	30	30	

IV 추진 실적

① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축

- 친환경농업과학관 미생물 배양실 리모델링 공사 추진(100백만원)
- 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작의뢰 : 멸균배양기(1.5톤) 2대 외 9종

② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입

- 사업계획 수립, 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	① 친환경농업과학관 생산시설 고도화 정밀농업 체계구축
	○ 친환경농업과학관 생산시설 고도화 계획수립(2022. 9. 5.) - 설계도면(공간 재배치)구상, 기기 규격서 및 과업지시서 작성 등 ○ 친환경유용미생물 멸균배양기 시스템 제작설치 계약완료(2023.4.13.)
	② 축산농가 정밀 사료분석 품질관리 등 경영비 절감 기술 투입
	○ 조사료분석 기술교육 참석 2회 및 분석장비 입고 및 설치(2022. 10. 20.) ○ 정밀 사료분석을 위한 시운전 및 장비 숙련도 교육(조단백, 조지방, 조섬유 등)

V 문제점 및 대책

- 단계별 설비개선에 따른 세부적인 이행 계획수립 필요
- 데이터 분석을 통한 적정한 배합사료비 조정과 함께 실천토록 현장 컨설팅 병행 필요

VI 향후 계획

- 우량 미생물 생산·공급으로 미생물 효과 및 수혜자 서비스 향상
- 자가배합 TMR 농가 사료분석 및 배합비 설정, 활용 지도를 통한 경영비 절감 및 등급향상 도모

주관부서	미래농업과	부 서 장	구본석(6390)	팀 장	신지영(6391)	담 당 자	송인성(6392) 강화정(6393)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

4 생활 속의 문화 · 체육

4-1	기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성						
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2027	사업비	6,500백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 충청남도 당진시 송악읍 기지사줄다리기박물관 인근

○ 사업기간 : 2022~2027

○ 사업비 : 6,500백만원

○ 사업내용 : 줄다리기 축제 및 지역행사 시 활용을 위한 주차장 조성

- 주차장 조성을 위한 박물관 연접 토지를 대상으로 부지 선정(2022~2023)

- 주차장 대상 토지 연차별 매입(2023~2025)

- 주차장 조성을 위한 인허가 등 행정절차 및 조성공사 추진(2026~2027)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성	-	설계 및 인허가	부지확정	부지확보			설계 및 인허가

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기지사줄다리기박물관 주차장 확대 조성	용역 설명회 개최	사전행정절차 이행	사전행정절차 이행 토지매입	토지매입

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,500	0	5,100	0	1,500	1,000	1,000	1,600	1,400
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	6,500		5,100		1,500	1,000	1,000	1,600	1,400
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023. 6. 22. 기지시줄다리기주차장 공유재산 변경 부의

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 주차장 관련 예산 수립 ○ 기지시줄다리기 주차장 기본계획 용역 주민설명회 개최(2023. 3.7.)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 일부 주차장 조성과 관련 부정적 여론 ⇨ 기수립한 기본계획 용역에 대한 설명회 개최(2023.3.7.), 특별한 의견 없어 당초 안의 일부를 조정하여 사업 추진
- 당초 구상한 조성 계획의 우리시 재정 부담이 커 당진시 재정여건에 따른 규모 조정
⇨ 필요한 규모 및 시설에 대한 면밀한 재검토를 거쳐 제반 행정절차 이행 추진

VI 향후 계획

- 주민설명회 개최 결과 시민들의 특별한 의견이 없으므로 당초 안을 일부 조정(국공장 제외)하여 변경 계획 수립 후 제반 행정절차 이행
- 제반 행정절차 이행 후 주차장 및 진출입로 대상 부지 단계별 매입 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	김기권(3605)	담 당 자	고대영(3606)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-2	야외 문화예술 전시관 및 공연장 건립
-----	----------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2025	사업비	140백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 관광(합덕역 개통) 및 공원계획수립(호수공원) 등과 연계하여 추진

○ 사업기간 : 2023~2024

○ 사업비 : 140백만원(도비 60백만원, 시비 80백만원)

※ 토지매입비 제외

○ 사업내용 : 야외 문화예술 전시관 및 공연장 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025
문화예술 활성화 지원 (야외 전시관 및 공연장 건립)	-	준공	전시관 및 공연장 건립을 위한 대상지 선정		야외 전시관 및 공연장 건립 착공	야외 전시관 및 공연장 건립 준공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대상지 선정 및 기본계획	대상지 선정 추진		대상지 선정	건립을 위한 예산확보

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	140	0	140	0	20	120	0	0	0
국비	0		0						
도비	60		60			60			
시비	80		80		20	60			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 대상지 선정 추진

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 대상지 선정 추진
--------------------------------------	-------------

V 문제점 및 대책

○ 충청남도 도비사업 및 특별교부금에 본 사업이 선정 될 수 있도록 협력체계 구축 필요

VI 향후 계획

- 하반기내 대상지 선정 → 2024년 기본 및 실시계획 20백만원 요청
- 당진문화재단과 연계하여 「작은 미술관 조성 및 운영지원」 중앙 공모사업 등을 신청예정

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	탁기연(3571)	담 당 자	이동형(3572)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

- ('23.06.) 시립미술관 건립을 위한 기본계획 및 타당성 조사 용역 수립을 위한 예산확보 (50백만원)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('23.03.) 구조안전진단 용역 완료 (19백만원) → 용역 결과 시립미술관 기준을 위한 증축 및 용도변경 가능
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 공립미술관 필수 시설인 사무실, 연구실, 자료실 등 관련 시설을 추가로 조성하기에는 문예의전당 전시관 공간이 다소 협소하여 증축을 위한 사업비 확보 필요
- 미술관에서 소장할 가치가 있다고 판단되는 작품 100점 보유를 위한 예산 편성 필요

VI 향후 계획

- 타당성 및 기본계획 수립을 위한 용역 완료 (12월중)

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	탁기연(3571)	담 당 자	이동형(3572)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

- 충남도와 예산 확보를 위한 협의 진행 중
 - 조각상 제작 사업비 : 10억 원(시비 5억, 도비 5억) *도록 제작 6천만 원 별도 소요

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 바티칸 '성 베드로 대성전' 김대건 신부 조각상 설치 확정(한국천주교주교회의 주관)에 따라 동일한 조각상을 솔뫼성지에 설치 추진 - 솔뫼성지 및 관계기관과 조각상 설치 관련 협의 완료
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- '24년 : 김대건 신부 기념관 리모델링 공사 완료, 순례길 정비 추진
- '24년 : 김대건 신부 조각상 제작 진행

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	진용찬(3581)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-5	합덕 연호 방죽의 실질적인 복원
-----	-------------------

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	6,800백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 합덕읍 성동리 480번지 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2026
- 사업비 : 6,800백만원(용역비: 300백만원, 토지매입: 4,800백만원, 연지준설: 1,700백만원)
- 사업내용
 - 합덕제 중장기 개발 및 기본계획 용역 등 추진(문화시설 도시관리계획 변경)
 - 관광 자원화를 위한 토지매입(운산리 일원 구릉지역:29,110㎡)
 - 합덕제 연지 부들 억제를 위한 굴착(중 수심 1m), 산책로 확대를 위한 성토(80,000㎡)

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
합덕제 중장기 및 기본계획 추진 (문화시설 도시관리계획 변경)	-	기본계획 완료	중장기 개발계획 용역완료	기본계획 (도시관리계획 변경 용역추진)	기본계획 완료 및 사업고시		
관광 자원화를 위한 토지매입 (광장 조성 등)	-	토지매입 완료			토지매입	토지매입	토지매입 완료
합덕제 수심 증가 및 연지 준설	-	수심 증가 연지 준설		사업 설계 완료 및 공사 착공	준설지역 편의시설 조경식재		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
합덕제 중장기 및 기본계획 추진 (문화시설 도시관리계획 변경)	-	-	도시 관리계획 변경	도시관리계획 변경
관광 자원화를 위한 토지매입 (광장 조성 등)	24년 추진	24년 추진	24년 추진	24년 추진
합덕제 수심 증가 및 연지 준설	사업 설계	사업 설계	공사 추진	공사 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,800	0	6,800	80	1,260	2,260	1,600	1,600	0
국비	0		0						
도비	850		850		520	330			
시비	5,950		5,950	80	740	1,930	1,600	1,600	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 「합덕제 연지 준설 및 조경공사 실시설계용역」 추진 중

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (‘21.07.22.~‘22.11.21.) 「합덕제 중장기 개발 기본구상 수립 용역」 완료
-----------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 거점육성형 지역개발 사업 변경 관련 정부 부처 허가 필요(국토부)
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인
- 금강홍수통제소의 석우천 하천점용 승인 및 농림부 토지 사용 관련 허가 필요

VI 향후 계획

- 연지 준설 및 조경공사 설계용역 완료 후 공사 추진
- '24년 토지 매입 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-6	관광지별 특성화 사업추진
------------	----------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	7,500백만원

I 사업개요

- 2021.05 : 삽교,왜목,난지도 관광지 관광자원개발사업 공모 신청(시→도)
- 2021.07 : 관광자원개발사업 대상지 확정
- 2022.06 : 왜목마을 관광지 환경개선공사 준공(해안 데크정비, 공사비 10억원)

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	-	보행환경 정비		보행환경 정비			
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치 및 해안 데크 정비	-	전망대 설치 및 해안데크 정비	해안데크 정비	전망대 기본설계	전망대 설치		
난지대교 경관조명 설치	-	경관조명 설치		경관조명 설치			

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호 관광지 보행환경 개선사업	실시설계용역	공사 발주	공사 준공	전체사업완료
왜목마을 관광지 선셋 전망대 설치	사업 확정(국토부)	예산(시비)수립	실시설계용역	실시설계용역 완료
난지대교 경관조명 설치	기본구상용역	실시설계용역	공사 발주	공사 준공

[투자계획] (단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	7,500	0	7,500	1,150	3,500	2,850	0	0	0
국비	1,000		1,000		75	925			
도비	2,750		2,750	575	1,675	500			
시비	3,750		3,750	575	1,750	1,425			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 삽교호 관광지 보행환경 개선사업
 - 실시설계 용역 추진(5.11~11.11)
 - 주민설명회 3회 개최(1차: 6.27, 2차: 9.27, 3차: 12.7)
 - 도로교통공단 자문(2023.2.16.)
 - 23.05.: 일상감사 및 도 계약심사 완료
 - 23.06.: 공사 착공
- 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치
 - 23.06.: 1회추경 예산 반영
- 난지대교 경관조명 설치
 - 23.06.: 기본구상용역 완료

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 삽교호 관광지 보행환경 개선사업 - (‘22.06.27.) 왜목마을 데크 보수공사 준공(공사금액 10억원) ○ 난지대교 경관조명 설치 - 23.02.: 기본구상용역 착수
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 삽교호관광지 보행환경 개선사업
 - 23.12.: 전체 사업 완료
- 왜목마을 관광지 선셋전망대 설치
 - 23.12.: 선셋전망대 실시설계용역 완료
 - 24.01.: 선셋전망대 설치공사 착공
 - 24.12.: 선셋전망대 설치공사 완료
- 난지대교 경관조명 설치
 - 23.09.: 난지대교 경관조명 설치 실시설계용역 완료
 - 23.12.: 난지대교 경관조명 설치공사 완료

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	심상필(3600)	담 당 자	김형근(3601)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-7	해안 데크길 및 둘레길 조성
-----	-----------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2024~2026	사업비	10,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 운정리~매산리, 송악읍 북운리~한진리, 석문면 장고항리~교로리 일원

○ 사업기간 : 2024~2026

○ 사업비 : 10,000백만원(도 5,000, 시 5,000)

○ 사업내용 : 해안 3개 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성

- 삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(1,980백만원)
 - 구간 전체 길이 L=5.9km(해안 데크 L=0.9km)
- 서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길(3,600백만원)
 - 구간전체 길이 L=8.3km(해안 데크 L=0.5km)
- 왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길(4,400백만원)
 - 구간 전체 길이 L=3.0km(해안 데크 L=1.8km)

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역	착공		
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역		착공	
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성	-	착공		기본계획 용역			착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
삽교호~음섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성		기본계획용역	道 관광 자원화 사업 신청	
서해대교~안섬포구 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성				
왜목마을~장고항 구간 해안 데크길 및 둘레길 조성				

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	10,000	0	10,000	0	20	1,980	3,600	4,400	0
국비	0		0						
도비	4,990		4,990			990	1,800	2,200	
시비	5,010		5,010		20	990	1,800	2,200	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 2023.06.: 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 1회추경예산 반영(19백만원)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 둘레길 조성 기본계획 용역 2023년 본예산 신청(19백만원, 미수립)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 해안 둘레길은 해안 구조물(데크)을 설치하므로 공사비가 매우 많이 소요되며, 향후 유지 관리가 어려움이 있음.
- 해안 구조물 설치에 따른 공유수면 점·사용 허가가 필요하며 사유지 통과 시 토지 협의 문제 발생 (왜목마을~장고항 구간)
⇒ 해안둘레길을 구조물(데크)에만 국한되지 않고, 지상의 인도와 산책로 등을 연결하여, 코리아 둘레길과 연계한 전체적인 둘레길 노선을 구축하여 안내표지 및 쉼터 등을 보강해야 함.
- ※ 전체적인 해안둘레길 조성계획을 수립하여, 단계별·구간별로 사업을 추진해야, 일관적이고 완성도있는 사업효과를 기대할 수 있으므로, “둘레길 조성 기본계획 용역” 예산 수립이 필요함.

VI 향후 계획

- 道 관광 자원화 사업 신청

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	심상필(3600)	담 당 자	김형근(3601)
협조부서	항만수산과	부 서 장	김선태(4260)	팀 장	문기영(4280)	담 당 자	전창익(4281)

4-8	남이흥장군 무인 종가 체험마당 조성						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	6,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 도이리 380-1일원

○ 사업기간 : 2020 ~ 2026

○ 사업비 : 6,000백만원

○ 사업내용 : 무예체험관(800㎡) 및 체험공원(1,600㎡) 조성, 무인의 숲(1,300㎡) 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무예 체험관 및 체험공원 조성	-	준공	설계용역 완료	체험관 부지조성	체험관 및 체험공원 착공	체험관 및 체험공원 준공	운영관리계획 수립 및 운영
무인의 숲 조성	-	준공			무인의 숲 조성 설계	무인의 숲 조성 준공	

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
무예 체험관 및 체험공원 조성	설계용역 및 문화재현상변경 심의	설계용역 및 문화재현상변경 심의	설계용역 및 문화재현상변경 심의	설계용역 및 문화재현상변경 심의
무인의 숲 조성	24년 진행	24년 진행	24년 진행	24년 진행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,000	0	6,000	300	500	3,000	2,200	0	0
국비	0		0						
도비	3,000		3,000	150	250	1,500	1,100		
시비	3,000		3,000	150	250	1,500	1,100		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('22.06.) 무인종가 교육 및 체험 공간 조성 실시설계용역 발주

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 충남도 문화재 현상변경허가 진행 및 자문회의 진행
--------------------------------------	-------------------------------

V 문제점 및 대책

- 거점육성형 지역개발계획에 대한 도비 보조금 선정 필요
- 道 문화재 현상변경 허가 및 사업승인 필요

VI 향후 계획

- '24년 : 문화재 현상변경 심의 및 설계완료 후 공사 추진

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	오현석(3583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-9	면천읍성 특화 거리 및 한옥 스테이 조성 추진						
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	2,150백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 면천면 성상리 814

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026

○ 사업비 : 2,150백만원

○ 사업내용 : 특화거리(150m) 및 광장·석교 조성(800㎡), 한옥(3채) 신축 및 운영·관리

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
특화 거리 및 광장 조성	-	준공			특화 거리 및 광장 조성 디자인용역	특화 거리 및 광장 준공	
한옥 스테이 조성	-	준공	성안마을 기본계획 정비	실시설계 및 현상변경 허가	한옥(3채) 착공	한옥(3채) 준공	운영관리계획 수립 및 운영

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
특화 거리 및 광장 조성	24년 추진	24년 추진	24년 추진	24년 추진
한옥 스테이 조성	설계용역 추진	설계용역 추진	설계용역 완료 예산 수립	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,150	0	2,150	50	100	1,200	800	0	0
국비	1,050		1,050		50	600	400		
도비	105		105		5	60	40		
시비	995		995	50	45	540	360		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 면천읍성 성안마을 기반조성 공사 착공(2023. 4. 5.)
- 면천읍성 한옥 건축 실시설계 용역 착공(2023. 5. 30.)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (‘22.09.) 동벽 시굴 조사 용역 착수 ○ (‘22.10.) 성안마을 기본계획 정비 관련 측량 설계 착공
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ‘24년 : 한옥 건축 공사 추진
- 한옥 건축 완료 이후 숙박 및 관광 프로그램 운영 방안 수립

주관부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	남광현(3580)	담 당 자	진용찬(3581)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-10	4.4 독립 만세운동 역사공원 조성
------	----------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	45%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	3,036백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 대호지면 조금리 산 43-1 일원

○ 사업기간 : 2019.07.~2024.03.

○ 사업비 : 3,036백만원 (국 500, 시 2,536)

○ 사업내용 : 창의사 확장 이전 등 역사공원 조성 (실 조성면적 4,624m²)

- 주요 시설

해당시설	면적	내용
창의사	120m ² (부지 540m ²)	전통한옥 및 삼문 조성, 단청 반영
광장	1,520m ²	
기념관 부지	375m ²	향후 기념관 조성을 위한 예비 부지조성
주차장	1,340m ²	대형버스, 장애인전용, 전기차전용 포함 45면

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
4.4 독립 만세운동 역사공원 조성	-	준공 및 창의사 이전	건축신고 및 착공	준공	창의사 이전		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
4.4독립만세운동 역사공원 조성	착공	순기별 공사 진행	순기별 공사 진행	준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	3,036	272	2,764	4	2,760	0	0	0	0
국비	500		500		500				
도비	0		0						
시비	2,536	272	2,264	4	2,260				

IV 추진 실적

- (4. 24.) 주민설명회 개최 (50여명 / 공사개요 및 향후계획 시공사 설명회)
 - 전통건축 목재 상급 사용 및 경내 공간 확보, 전통한옥 방식의 시설물 구축 등 주민 건의
- (5. 29.) 기념사업회원 목재 재단 현장 검수 및 창의사 유사 조성 시설물 견학 (서산시)
- (6. 19.) 제1차 토건 설계변경 계약
 - 구조물공 수량증가(옹벽 구조안전성 강화), 버스 주차장 위치 이동, 관급자재(레미콘) 품귀로 인한 사급 전환 추진 등
 - 도금액 209백만원 증가 및 관급자재 68백만원 감소 (총 사업비 141백만원 증가)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (‘22.09.27.) 건축신고 협의 사항 보완 완료 및 건축신고 수리 ○ (‘22.10.12.) 2022년도 지역 현안 특별교부세 예산확보(5억원) ○ (‘22.10.17.) 4.4 독립 만세운동 역사공원 조성사업 최종계획 수립 ○ (‘22.11.~12.) 시 일상감사 및 도 계약심사 이행 ○ (‘23.02.06.) 시공업체 계약 ○ (‘23.02.10.) 공사 착공 ○ (‘23.02.14.) 4.4독립만세운동 기념사업회 대상 추진설명회 개최 (100여명)
--	--

V 문제점 및 대책

- 4. 24. 주민설명회 개최 시, 주민 건의사항에 대한 검토결과 사업비 증액이 불가피함
 ⇒ 세부 내역 및 소요예산 산정 후, 중요도 및 시급성 등을 고려 예산범위 내 우선 적용
 사항 검토 및 설계변경 추진
 ※ 2022.10월 특별교부세 국비 5억원 추가 확보로, 현 사업비 외 약350백만원 부담가능

VI 향후 계획

- (23. 3분기) 전통건축 설계변경 검토, 창의사 현장 시공
- (23. 4분기) 공사 준공
- (24. 1분기) 위패, 표지석 등 창의사 이전

주관부서	사회복지과	부 서 장	박진한(3640)	팀 장	신현숙(3641)	담 당 자	박진우(3643)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-11	당진시 직장운동경기부 선수들의 안정된 훈련을 위한 클럽하우스 건립
-------------	---

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	5,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원

○ 사업기간 : 2023. 1. 1.~2025. 12. 31.

○ 사업비 : 5,000백만원

○ 사업내용

- 1개동 지상3층 이상(숙소 35실 / 2인 1실)
- 1층 : 라커룸, 식당, 체력단력실, 의무실
- 2층 : 종목별 사무실, 코칭스텝실, 회의실, 전력분석실, 숙소
- 3층~ : 종목별 숙소동, 휴게실 등

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
클럽하우스 건립	-	준공	-	타당성 용역 (부지선정)	실시설계	착공 및 준공	-

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
클럽하우스 건립	내부검토	체육회 등 협의	사업진행관련 보고	타당성용역 발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,000	0	5,000	0	500	4,500	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	5,000		5,000		500	4,500			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 종합운동장 지역 토지 활용방안 및 위치 모색, 사업비 관련 문의

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 클럽하우스 건립관련 시장님 대면보고 및 사업부지 문의 ○ 체육회와 협의 및 도청 담당자 관련 사업비 지원관련 문의(지원불가능)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 현재 종합운동장 확장부지와 관련하여 해당 위치에 건립관련 협의 필요
 - 문체부 및 충남도청과 협의
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
 - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- 23년 3분기: 주민소통을 통한 사업계획 진행 여부 확인
- 23년 4분기: 부지사용 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 4분기: 타당성용역 사업 발주 및 진행

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	최재민(4511)

4-12	종합스포츠타운 조성						
------	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2015~2026	사업비	57,500백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 고대면 고대로 33번지 일원
- 사업기간 : 2015~2026
- 총사업비 : 57,500백만원
- 사업내용
 - ① 종합운동장 확장
 - 사업기간 : 2015~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
 - 사업규모 : 71,865㎡(당초196,774㎡→ 확장268,639㎡)
 - 사업비 : 194억원[기확보 105(국10, 시95)]
 - ② 종합체육관 건립
 - 사업기간 : 2017~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
 - 사업규모 : 지상2층/지하1층, 연면적6,948㎡
 - 사업비 : 241억원[기확보 92(국6, 도46, 시40)]
 - ③ 장애인체육관 건립
 - 사업기간 : 2019~2024(사업기간 '26년까지 변경 예정)
 - 사업규모 : 지상2층, 연면적4,000㎡
 - 사업비 : 140억원[기확보 90(국40, 시50)]

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
종합운동장 확장	-	준공	-	실시설계 용역 완료	도로 및 조경, 전기공사 착공	도로 및 조경 준공	전체 준공
종합체육관 건립	-	준공	-	사업계획 변경 완료	실시설계 완료 및 착공	공정률 50%	준공
장애인체육관 건립	-	준공	-	실시설계 완료 및 착공	공정률 40%	공정률 80%	준공

- 사업계획 변경으로 인한 설계용역 기간 증가로 '24년 준공 목표→ '26년 목표 준공 목표 변경

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
종합운동장 확장	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료
종합체육관 건립	기본설계 완료	사업변경관련 검토	변경관련 주민설명	변경설계 진행
장애인체육관 건립	기본설계 완료	실시설계 진행	실시설계 진행	설계 완료, 사업발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	57,500	13,500	44,000	3,000	27,000	14,000	0	0	0
국비	7,600	4,600	3,000	1,000	1,000	1,000			
도비	1,000	1,000	0						
시비	48,900	7,900	41,000	2,000	26,000	13,000			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 종합체육관 및 반다비체육관 건립사업 기본설계 완료
- 종합체육관 조성을 위한 기금 추가공모 신청

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 사업계획관련 내부검토 진행 ○ 종합체육관 조성을 위한 기금 공모신청(30억원)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 종합체육관 건립사업 관련 경제성 및 효용성을 고려한 사업변경 필요
 - 문체부 및 충남도청과 협의 및 주민 소통을 통한 사업계획 변경 실시 예정
- 팬데믹 여파 및 러시아 전쟁 등 자재물가 상승을 고려하여 사업 규모 변경 필요
 - 실시설계에 자재 및 물가상승분 고려한 사업계획 수립 필요

VI 향후 계획

- 23년 3분기: 주민소통을 통한 종합체육관 건립 사업계획 변경
사업계획 변경 관련 문체부 및 충남도청과 협의
- 23년 4분기: 반다비체육관 및 확장사업 설계용역 진행, 종합체육관 용역변경 계약

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	최재민(4511)

4-13	당진 시내권 체육공원 조성
------	----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2024	사업비	6,000백만원

I 사업개요 ○ 사업위치 : 채운공원(산림과 협조), 원당동 하수종말처리장(수도과 진행) ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12. 31. (변경, 기존 2024.12.31.) ○ 사업비 : 6,000백만원(변경, 기존 1,000백만원) ○ 사업내용 : 도심지 체육공원 조성 약 A=8,000㎡ - 원당동 하수처리장 지역: 총 7코트 풋살장(42mX25m) 1코트, 테니스장(38mX20m) 4코트, 족구장(40mX20m), 주차장, 화장실, 편의시설 등 - 채운공원 지역: 다목적코트 및 테니스장, 족구장, 농구장, 주차장, 화장실, 편의시설 등
--

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
채운동 체육공원 조성	-	준공	-	토지매입	토지매입	설계 및 착공	준공
하수처리장 내 체육시설	-	준공	-	설계 및 착공	준공	-	-

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
채운동 체육공원 조성	체육회 협의	사업계획 내부검토	지장물 보상	사업규모 확정
하수처리장 내 체육시설	설계용역 발주	체육시설 규모 확정	설계용역 완료	사업 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,000	0	6,000	0	1,130	1,870	3,000	0	0
국비	426		426		426				
도비	263		263		263				
시비	5,311		5,311		441	1,870	3,000		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)
- 채운공원 내 지장물 보상을 위한 예산 수립

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 22.11. 시내권 체육공원 설치 관련 방침보고 및 사업계획 변경 ○ 22.12. 원당동 하수종말처리장 관련 수도과 협의 ○ 23.03. 원당동 하수종말처리장 설계관련 규격 및 편의시설 협의(각 체육회)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 채운공원 사업규모 결정을 위한 내부검토 및 협의 필요
 - 내부 검토 이후 용역시행 또는 사업비 관련 검토 필요

VI 향후 계획

- 23년 3분기: 채운공원 내부 체육시설 설치관련 타당성검토 필요
- 23년 4분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 착공
- 24년 2분기: 원당동 하수종말처리장 확장공사(테니스 및 풋살장) 준공

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	수도과	부 서 장	고동주(6460)	팀 장	이석근(6510)	담 당 자	이태근(6511)

4-14	삽교호 고수부지 대단위 체육 인프라 확충
------	------------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	3,500백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 삽교호 고수부지

○ 사업기간 : 2023. 01. ~2026. 12.

○ 사업비 : 3,500백만원

○ 사업내용

- 파크골프장 조성공사 면적 : 30,000㎡, 사업비 1,500백만원
- 체육시설 인프라구축 면적 : 20,000㎡, 사업비 2,000백만원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
체육 인프라 확충	-	착공	-	-	-	-	파크골프장 조성 착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
체육 인프라 확충	금강유역환경청 담당자 협의	하천정비계획변경 신청(금강유역환경청)	-	금강유역환경청 방문 협의진행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,500	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	3,500		3,500					3,500	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 금강유역환경청 담당 부서 협의 진행(국가하천정비 기본계획 수립중)
- 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
 - 파크골프장 및 수자원생태공원 조성관련 의견 송부

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 고수부지 활용관련(파크골프장) 주민 의견 청취 ○ 친수구역 지정요청 관련 의견 송부(건설과 취합)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 금강유역환경청의 관리기관으로 삽교호 수질 오염 원인 승마장 계획은 불가하며 하천정비 기본계획 이전에는 사업추진 불가 통보
- 향후 금강유역환경청에서 하천정비기본계획 수립 용역 발주 시 친수공간으로 지정요청 후 반영되면 사업추진
- 삽교호 준설 시 고수부지 활용 면적 확대

VI 향후 계획

- 25년 연중: 삽교천 권역 국가하천기본계획 변경 용역 완료
- 25년 4분기: 파크골프장 조성관련 예산확보(국 도비 확보)
- 26년 1분기: 삽교천 파크골프장 조성관련 기본 및 실시설계용역 발주

주관부서	체육진흥과	부 서 장	홍승선(3760)	팀 장	인호환(3766)	담 당 자	이우진(3767)
협조부서	건설과	부 서 장	주성욱(4630)	팀 장	진호현(4650)	담 당 자	최주신(4651)

4-15	도비도·난지도 민자유치개발 추진						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2026	사업비	1.5조원(예정)

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 석문면 난지도리 일원

○ 사업기간 : 2023~2026 ※ 2026년 착공 목표

○ 사업비 : 1조 5천억원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경

○ 사업내용

- 도비도 : 위케이션타운, 테마파크, 숙박시설, 골프장 등

- 난지도 : 도비도-난지도 간 해상 케이블카, 전망대, 숙박시설, 승마장 등

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도비도·난지도 민자유치개발 추진	-	착공			MOU체결	인허가 완료	착공

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
도비도·난지도 민자유치개발 추진	토지 사용 관련 관계부처 협의, 사업제안서 검토			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,500,000		1,500,000					1,500,000	
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 도비도-난지도 개발 관련 사업제안서 접수
 - 워크ایشانتاون, 도비도-난지도 간 케이블카 설치 등
 - 사업제안서 검토 및 향후 계획 논의
- 유관부처 방문으로 현안문제 논의 및 해결 방안 모색
 - 토지소유자인 농어촌공사와 업무 협의
 - ⇒ 토지 관련 문제해결 논의(당진시장-농어촌공사 사장 면담 추진 등)
 - 농림축산식품부(농지과, 농업기반과) 업무 협의
 - ⇒ 중앙부처 방문 등을 통해 당진시 현안 업무 및 정책 건의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 도비도-난지도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(3회) ○ 유관부처(농림부, 농어촌공사) 방문을 통한 현안문제 논의 및 건의 사항 전달
---------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 도비도 토지 이용 관련 기관별 협의 필요
 - 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 등

VI 향후 계획

- 도비도 토지의 원활한 이용을 위한 관련 부처(기관) 간 지속적인 업무 협의 추진
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2024
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	이상현(4061)	담 당 자	임승현(4062)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

4-16	행남도 민자유치개발 추진
------	---------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2023-2026	사업비	1조원(추정)

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 매산리 516-4번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업비 : 1조원(추정) ※ 추후 투자개발계획 확정시 변경

○ 사업내용

- 숙박 및 체험 등 관광 인프라 시설 개발로 체류형 관광 휴양 공간 조성

- 해양경관 등 자원을 활용한 특색있는 해양관광 및 레저 공간 조성

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
행남도 관광지 민자유치개발 추진	-	착공		MOU체결		인허가 완료	착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 투자자 유치	투자유치 활동 및 투자자 발굴			MOU체결
행남도 관광지 개발	개발 방향 및 계획(안) 확정			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	1,000,000	0	400,000	0	0	100,000	0	300,000	600,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	1,000,000		400,000			100,000		300,000	600,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 관광 수요 및 트렌드를 반영한 행담도 개발 투자 제안서 작성
- 민간투자자 발굴과 투자유치를 위한 기업 방문(2회)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 행담도 개발 관련 관계부처 간 업무 협의
	○ 투자유치를 위한 개발 방안 및 법적 검토
	○ 행담도 투자자 발굴 및 민간투자 제안 검토(2회)

V 문제점 및 대책

- 부동산 시장 침체로 인한 투자 위축으로 민간투자자 발굴 및 실질적 투자 참여 어려움 예상
 - 수익성을 확보하기 위한 차별화된 관광 사업 아이템 개발로 투자유치 총력
 - 관광 개발 동향 지속 파악 및 투자 관심 기업 발굴

VI 향후 계획

- 투자 유치 활동 및 투자자 발굴 : 2023
 - 개발 방안 및 계획(안) 보완 및 확정
- 민간투자자 선정 및 협약 체결 : 2023 하반기
- 행정절차 이행 및 착공 : 2024 ~ 2026

주관부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	김기남(4070)	담 당 자	김수환(4071)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5 함께 누리는 교육 · 복지

5-1	고등학교 신설
-----	---------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2026	사업비	60,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 미정
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 60,000백만원
- 사업내용 : 관내 기업 기반의 자율형 사립고 건립
 - 학급수 및 학생수(예상) : 총 36학급(학년당 12학급) / 총 학생수 1,000여명(1학급당 28명)
 - 건립 및 운영 주체 : 사립학교법인(기업)
 - 산.관.학 협의체 운영 : 투자계획, 법인설립 행정절차 이행 및 학교 운영 계획 등 협의

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고등학교 설립	개교	1	관련기관 협의	법적기반마련, 법인설립 등	건축물 착공	건축물 준공	개교

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
고등학교 설립	·교육부 동향파악	·민간투자 유치 노력 ·학교설립 절차 등 검토	·민간투자 유치 노력 ·학교설립 절차 등 검토	·민간투자 유치 노력 ·학교설립 절차 등 검토

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	60,000	0	60,000	0	0	20,000	20,000	20,000	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	60,000		60,000			20,000	20,000	20,000	
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 교육부 개정동향 파악

- 답변일자: 2023. 5. 29.(월) / e-mail 수신
- 교육부 담당: 학교교수학습혁신과 이승택 교육연구사(044-203-6689)
- 주요내용

【시행령 개정관련】올해(2023년) 12월말까지 개정 완료할 계획임

【여론 수렴 계획】이미 자사고 존치가 확정된 사항이라, 공청회 개최계획 없음

그동안
추진실적
[‘22.07.~
’23.03.]

- (‘22.08.23.) 학교설립 자문 등을 위한 충남교육청 방문 / 평생학습과장 외 3명
- 주요내용: 자사고 설립의 필요성 제기 및 기타 당면현안 토의
- (‘22.08.) 초·중등교육법 시행령 개정 제안(시장님→국민의힘 정책위 의장)
- (‘22.08.) 최근 기업형 자사고 설립 건에 대한 참고자료 수집(당진교육지원청→시)
- (‘22.08.30.) 사→교육지원청 협력 강화를 위한 당진시 교육행정협의회 위원 선임(시청 소속)
- (‘22.08.30.) 교육부 동향 파악(자사고 존치 관련)
- 교육부의 자사고 존치 동향: **존치하는 것으로 확정**
- (‘22.09.15.) 교육부 면담(시행령개정 동향 및 우리시 자사고 설립관련 협조 요청)

▶ 자사고 존치를 위한 입법계획(교육부 제공)

개정안 마련 (2022년 말)	=	자사고 사회적 공론화 과정 진행 (2023년 중순)	=	자사고 유형 결정 (2023년 하순)	=	시행령 개정 (2023년 말)
---------------------	---	------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------

- (2022.11.11.) 교육자유 특구관련 간담회 참석(교육부 주관)
- 주요내용: 지방의 교육력 제고를 위한 ‘교육자유 특구’ 정책 수립방향 의견 수렴
- 우리시: 자율형사립고 시행령 조속한 개정요구, 자사고 설립 및 운영관련 규제완화 건의
- (2022.12.27.) 시장군수협의회 정책건의사항 수용통보(행정안전부 자치행정과-7453(2022.12.27.))

V 문제점 및 대책

○ 자사고 설립 및 운영을 위한 기업의 적극적인 투자 의지 필요

▶ 기업의 투자의지 확보를 위한 학교설립의 필요성과 당위성을 지속적으로 제기

○ 국가 및 지방자치단체의 보조를 받지 못하기 때문에 **기업 및 학부모의 경제적 부담 초래**

▶ 기존 고교 학사 운영방식과는 차별화된 글로벌, 미래인재 양성 교육 커리큘럼 마련

VI 향후 계획

- 초·중등교육법 시행령 개정 절차 이행 등 교육부 동향 파악
- 학교법인 설립 및 자사고 건립을 위한 민간기업 투자 유치 노력
- 자율형 사립고 건립을 위한 법적, 행정적 절차 이행 방안 검토

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	차수진(3750)	담 당 자	차수진(3750)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-2	중·고등학교 진학 관리시스템 지원
------------	---------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	기타(교육청)	사업기간	2022~2026	사업비	4,062백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 관내 중·고등학교 및 교육지원청 등
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 4,062백만원(도 30, 시 4,032)

사업별	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
합계	4,062	522	855	875	895	915
진로진학상담 컨설팅 운영	1,200	-	300	300	300	300
일반고 진로진학 컨설팅 지원	1,536	276	300	310	320	330
특성화고 특기적성 지원	676	126	130	135	140	145
고교 대입설명회 지원	50	10	10	10	10	10
중학교 진로체험 지원	600	110	115	120	125	130

- 사업내용
 - 진로.진학상담 컨설팅 운영: 관내 고등학생을 대상으로 전문 진로진학 컨설팅 운영
 - 고교 진로.진학 프로그램 지원: 8개(일반고 6, 특성화고 2) 고교에 맞춤형 진로.진학 지원
 - 고교 대입설명회 지원: 교육정책 설명, 학부모 참여 유도, 학생의 진로 설계 지원
 - 중학교 진로체험 지원: 학교별 진로체험 활동 전개(AI, 미래기술 및 직업탐색, 다양한 직업멘토와의 만남 등)

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
진로진학상담 컨설팅 운영	건	매년 1건 컨설팅 운영	지원조례 제정	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅	진로진학상담 컨설팅
고교 진로.진학 지원 (계속사업)	개교	매년 8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)	8개교 지원 (402백만원)
고교 대입설명회 지원 (계속사업)	회	매년 4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)	4회 지원 (10백만원)
중학교 진로체험 지원 (계속사업)	개교	매년 13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)	13개교 지원 (110백만원)

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
진로진학상담 컨설팅 운영	교사 및 학교장 간담회 추진계획 수립및사업발주 시행사선정, 과업확정	사업설명회 개최 1회차 컨설팅(전략로드맵) 진로진학멘토링(학생, 부모) 전문가특강1회(대입특전드분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	2회차 컨설팅(학생부코칭) 진로진학멘토링(학생, 부모) 전문가특강2회(학생부종합분석) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)	3회차 컨설팅(방학전략) 진로진학멘토링(학생, 부모) 전문가특강3회(수시정시전략) 모의면접 컨설팅(3시간씩 3회) 학교로 찾아가는 진로체험 학교방문특강(희망중학교)
고교 진로·진학 지원	'23년사업 보조결정, 착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영
고교 대입설명회 지원	'22사업 정산	'22년사업 성과공유 '24년사업 타당성검토	'23 사업 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 마무리 '24년사업 기본계획반영
중학교 진로체험 지원	'23년사업 보조결정, 착수 '22사업 정산	'22년사업 성과공유 '23년사업 각학교별 추진 '24년사업 타당성검토	'23년사업 각학교별 추진 '24년사업 사업계획수립	'23년사업 각학교별 정리 '24년사업 기본계획반영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,062		4,062	522	855	875	895	915	
국비	0		0						
도비	30		30	6	6	6	6	6	
시비	4,032		4,032	516	849	869	889	909	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 2023 진로진학 전문컨설팅 운영

- (2023.04.03.) 시민 대상 사업설명회 개최
- (2023.04. ~ 06.) 2분기 프로그램 운영 실적

세부사업명	대상	방법	추진실적
① 1:1 진로진학 맞춤 컨설팅	중2~고3	대면	·매주 토 09:30~17:00 / 139회 상담
② 진로진학 멘토링 프로그램	중2~고3	온라인	·학년별 월 1회, 총 21회 운영
③ 학부모교육 프로그램	학부모	혼합	·학년별 월 1회, 총 11회 운영 / 진로진학 토크 5회
④ 외부특강	시민	대면	·특강 1회
⑤ 학교 방문특강	중학교	대면	·1회 90분 / 4개교 15개 학급
⑥ 학교로 찾아가는 진로체험 프로그램	중·고	대면	·1회 120분 / 4개교 7개 학급
⑦ 기타(특성화·특목고/ 학교부청소년)		대면	·프로그램 선정을 위한 학교 및 청소년재단 협의

○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비)

- (2023.05.) '22년 사업 추진실적 검토 및 분석
- (2023.06.) '24년 사업 타당성 검토

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	■ 진로진학상담 컨설팅 운영 ○ 진로진학 전문컨설팅 사업 추진을 위한 협력네트워킹 - 진학진로 상담교사와의 간담회 개최: 2022. 9. 27.(화) 13:00 / 시청 복지상담실(4층) - 2022 당진시 교육행정협의회 개최: 2022.10.20.(목) 14:00/ 당진교육지원청 대회의실 - 2023 전문 진로.진학 컨설팅 추진방안 마련: 평생학습과-11270(2022.10.19.) ○ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비) - ('22.09.17.) 청소년 교육정책 제안마당 개최 : 진로체험 프로그램 확대 요청 - ('22.10.06.) 2023년 교육경비 기본계획 마련(4개사업/ 555백만원) ○ 2023 진로진학 전문컨설팅 사업추진 - (2022.12.15.) 「당진시 진로.진학교육 지원에 관한 조례」 제정 - (2023.02.21.) 관내 초·중·고 학교장 및 관련기관과의 간담회 개최 - (2023.03.06.) 관내 중·고등 진로진학 교사 및 관련기관과의 간담회 개최 - (2023.03.) 협상에의한계약 협상 및 프로그램 최종 확정 ■ 중·고교 진로진학 프로그램 지원(교육경비) ○ '23년 보조사업 교부 결정·지급 및 '22년 추진사업 정산
--	---

V 문제점 및 대책

- 외부 사설 업체 컨설팅에 따른 관내 학교 등 교육기관의 협조가 어려울 것으로 예상됨
 - ▶ 외부 컨설팅 운영에 대한 지속적인 사전정보 공유 및 진로진학 전문교사의 사업 참여 등 협력 방안 마련
- 학부모 및 학생들의 욕구를 상시 충족할 수 있는 상시운영 컨설팅 시스템 부재
 - ▶ 교육지원청과 협력하여 시내 권역에 상시 진로진학상담센터 신설

VI 향후 계획

- 각 부분별 사업의 차질없는 추진과 성과 도출

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	차수진(3750)	담 당 자	김정화(3751)
협조부서	충남교육청	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

5-3	청소년 수련관 건립						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	33,000백만원

I 사업 개요							
○ 사업위치 : 당진시 읍내동 95-6번지 외 1필지							
○ 사업기간 : 2023 ~ 2027(5년간)							
○ 사업비 : 33,000백만원(도비 30%, 시비 70%)							
○ 사업내용 : 청소년의 문화, 예술, 체험 활동 공간을 확충하여 건전한 성장 기반 구축 마련							
○ 사업규모 : 건물 1동(지상 3층, 총 연면적 : 6,000㎡)							
주요시설(안)							
청소년자유공간, 청소년카페, 동아리실, 방과후아카데미실, 메이커스페이스실, 미디어창작실, 요리실습실, 회의실, 다목적홀(강당), 체육관, 사무실 등							

II 사업 목표							
[확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025~2026	2027
청소년 수련관 건립	-	착공 (공정률 70%)	· 청소년 지원단 구성 · 건립계획 수립	· 지방재정투자 사업 심사 · 예산확보 (도비 등)	· 기본설사설계 · 공사 착공	· 공사 진행 (공정률 70%)	· 준공 및 운영

※ 지방재정투자심사 컨설팅 용역에 의한 설계 및 공사기간 재산정으로 사업기간 및 준공연도 변경(준공 : '26년 → '27년)

III 사업 계획				
[추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
청소년 수련관 건립	· 수련관건립심의위원회 구성 · 청소년 수요조사 실시 · 지방재정투자사업 심사 의뢰	· 선진지견학 · 학부모 의견조사	· 청소년시설확충 사업 신청(도비확보)	· 설계 공모

[투자계획] (단위 : 백만원)									
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2023	2024	2025	2026	2027	
총계	33,000	0	33,000	0	1,900	12,400	14,600	4,100	0
국비	0		0						
도비	9,900		9,900		600	3,700	4,400	1,200	
시비	23,100		23,100		1,300	8,700	10,200	2,900	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ '23년 2분기 추진실적

- (2023. 05.) 충남도 청소년수련시설 확충사업 신청 및 도비지원 협의
- (2023. 05.) 지방재정투자심사(중앙) 의뢰(시→도→중앙)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ (2022. 9.) 관계 부서(산림녹지과, 주택과) 협의(건물규모, 진입로, 주차장 등 현안) ○ (2022. 10.) 건립부지 확정(읍내동 계림공원 내) ○ (2022. 11.) 당진시청소년수련관 건립 추진계획 수립 ○ (2022. 12.) 수련관 건립 청소년지원단 구성 및 운영 ○ (2023. 01.) 청소년 수요조사 실시 및 타당성 검토용역실시 ○ (2023. 03.) 건립심의위원회 구성 및 심의
---------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 재정분권 추진방안('18. 10월)에 따라 청소년시설확충사업이 '20년부터 지방이양대상사업으로 변경(여성가족부→충청남도)됨에 따라 기존 최대 국비 50% 지원에서 도비 30% 지원으로 변경
 - ▶ 도비 확보 및 충청남도 특별조정교부금 및 국회의원 특별교부세 등 국·도비 추가 확보 필요

VI 향후 계획

- (2023. 11.) 설계 공모
- (2024. 03. ~ 2024. 12.) 기본 및 실시설계 용역 실시
- (2024. 03.) 공사 착수
- (2025. 06.) 운영계획 수립
- (2027. 03.) 공사 준공
- (2027. 04. ~ 08.) 인테리어 공사 및 개관

주관부서	평생학습과	부 서 장	박우학(3740)	팀 장	김보환(3755)	담 당 자	이연희(3756)
협조부서	주택과	부 서 장	김은태(4480)	팀 장	한건수(4510)	담 당 자	-

IV 추진 실적

- 장난감도서관 운영 : 2분기 누적 이용인원 2,000명
- 운영 유지 사업을 위한 도비 확보 : 10백만원(도5, 시5)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 리모델링공사 준공 - 사업대상지 확정(22.9월), 설계 및 공사(22.10월~12월), 명칭공모 ○ 더모아센터 개소 및 시범 운영(1.16.)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 마더센터의 지속 추진을 위한 안정적 예산확보 필요
- 민간 참여자 역량 강화 및 운영 체계 마련

VI 향후 계획

- (23. 6.) 거점 마더센터 운영을 위한 참여자 모집공고(카페 및 지역여성 역량강화 프로그램 운영)
- (23. 7.) 운영자 선정·보조금 지급 및 운영 개시
- (23. 9.~12.) 역량강화 교육 프로그램 운영
 - 양성평등 인식개선, 여성인권 신장 등 인식 개선 교육프로그램
 - 여성일거리 참여자 공통역량 강화 교육

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	윤미이(3737)	담 당 자	김목련(3738)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-5	온종일 돌봄 확대						
-----	-----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2024	사업비	2,927백만원

I	사업개요
○ 사업위치 : 당진시 일원 ○ 사업기간 : 2022.~2024. ○ 사업비 : 2,927백만원 ○ 사업내용 : - 2022년 당진시 송악다함께돌봄센터 설치 - 2024년 신평면 거산리 133-12번지 일원에 다함께돌봄센터 설치 - 2023년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치 - 2024년 당진2동 충남형행복주택 시설 내 공동육아나눔터 설치	

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
다함께돌봄센터 설치	개소	2	1		1		
공동육아나눔터 설치	개소	3	1	1	1		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
다함께돌봄센터	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영
공동육아나눔터	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영

[투자계획]		(단위 : 백만원)							
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,927	0	2,927	1,813	557	557	0	0	0
국비	751		751	237	257	257			
도비	223		223	65	79	79			
시비	1,953		1,953	1,511	221	221			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 당진1동(읍내6통) 공동육아나눔터 설치 관련 부서 협의(도시계획시설 조성 진행 중)
- 당진형 초등돌봄 업무협약 체결(교회 유휴공간을 활용한 당진형 초등돌봄 확대 협력)
- 당진시 초등돌봄을 위한 학부모 대표 좌담회 개최

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 당진시송악다함께돌봄센터 준공 및 운영 ○ 2022년 송악문화스포츠센터 내 영유아 장난감도서관 설치 ○ 충남형 온종일 마을방과후 돌봄사업 당진시 3개 단체 공모 선정 및 운영
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 초등돌봄에 대한 수요가 높아짐과 동시에 지역별·연령별 돌봄 욕구에 차이가 있어 맞춤형 돌봄시설 설치가 필요함
 - 읍·면 지역, 고학년(대호지면, 정미면 등) : 학습 위주 돌봄 선호, 소규모 돌봄 필요
→ 온종일돌봄, 돌봄공동체 등
 - 동 지역, 저학년(당진1,2,3동, 송악읍 등) : 안전한 돌봄 선호, 대규모 돌봄 필요
→ 학교 내 초등돌봄, 공동육아나눔터 등
- 해당 계획에 따른 돌봄시설 확충 외의 지역에 돌봄 수요가 있을 시 충남 온종일 돌봄 활성화 사업, 다함께돌봄사업, 당진형 초등돌봄 추진 등으로 대응하고자 함
- 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 사업 추진 지연에 따른 공동육아나눔터 설치 시기 미도래
 - 24년(예정) 도시계획시설 조성 후 내부 공동육아나눔터 설치

VI 향후 계획

- 2024년 당진1동(읍내6통) 도시계획시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 당진2동 충남형행복주택 시설 내 공동육아나눔터 설치
- 2024년 다함께돌봄센터 신규 설치 사전 준비(신평행복잇슈센터 내, 준공 예정 500세대 이상 공동주택, 유휴공간·시설 파악 등)

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	노윤이(3710)	담 당 자	유창우(3713)
협조부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	권혜미(3694)

IV 추진 실적

- 여성안심 귀갓길 사업대상지 수요조사 실시(읍면동, 당진경찰서 대상)

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 2022년 여성 안심 귀갓길 사업대상지 선정 및 착공 ○ 2022년 여성 안심 귀갓길 5개소 준공 완료 - 로고젝터 3개, 도로표지병 223개 설치 ○ 2023년 여성 안심 귀갓길 조성사업 시행계획 수립
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 여성 안심 귀갓길 사업 대상지 최종 선정
- 여성 안심 귀갓길 착공 및 준공 추진

주관부서	여성가족과	부 서 장	박노문(3690)	팀 장	이준기(3691)	담 당 자	이수정(3694)
협조부서	자원순환과	부 서 장	김진호(4310)	팀 장	권석정(4320)	담 당 자	박 현(4321)

5-7	장애인 일자리 지원 확대
-----	---------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	93.8%
사업성격	계속	사업주체	국가/자체	사업기간	2022~2026	사업비	11,840백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업비 : 8,577백만원(국비 3,930 도비 1,179 시비 3,468)

○ 사업내용 : 취업 취약계층 장애인 공공일자리 제공 및 민간 일자리 취업 연계

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	180	150	162	168	174	180
장애인 일자리 지원	명	170	150	155	160	165	170
당진형 장애인 일자리 추진	명	10	-	7	8	9	10

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계	129명	152명	-	-
장애인 일자리 지원	124명	144명	-	-
당진형 장애인 일자리 추진	5명	8명	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	11,840	1,361	8,577	1,507	1,690	1,741	1,793	1,846	1,902
국비	5,436	644	3,930	725	766	789	813	837	862
도비	1,631	193	1,179	217	230	237	244	251	259
시비	4,773	524	3,468	565	694	715	736	758	781
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 2분기) 장애인일자리 152명 배치(공공일자리 제공 104명/ 취업 연계 48명) ※ 93.8% 달성
 ※ 추진율 = [(장애인 일자리 참여자 수)/당해 연도 목표 162명]*100 = (152/162)*100 = 93.8%
 - (1월) 1차 32개 기관 85명 / (3월) 2차 5개 기관 11명 / (6월) 3차 6개 기관 8명
 - (6월) 꿈나래학교 전공과 재학생 2명 장애인일자리 선발(전공과 2학년 재학생 8명)
 - 장애인복지관 취업 상담 213회 제공 및 민간기업 등 취업 연계(확정) 48명
- ('23. 2.) 한국장애인고용공단 및 당진시 장애인복지관 등 유관기관 일자리 확대 방안 논의
- ('23. 4.) 장애인 일자리 정책 개발을 위한 충남연구원 현안 연구 의뢰(5개사업 제안)
- ('23. 5.) 관내·외 우수 장애인일자리 시설 벤치마킹(생명누리, 베어베터, 푸르메여주팜)
- ('23. 6.) 현안토론회 시 장애인 일자리 활성화 방안 논의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ '22년 장애인일자리 사업 94명 참여 ○ '23년 당진형 장애인일자리사업 신규 추진을 위한 예산 확보(77백만원) ○ '23년 장애인일자리 참여자 모집 및 배치(104명)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 민간기업의 장애인 취업 1 연계 어려우며 특히 중증장애인 고용 기피
 → 관내 민간기업과 보호작업장의 연계고용제도 활용 및 장애인 직업재활시설 확대를 통한 중증장애인 일자리 활성화

VI 향후 계획

- 기 장애인 일자리 배치기관 결원 발생 시 수시 추가 모집(7월 중 3차 추가모집 예정)
- 장애인복지관 직업지원 사업 지속 추진('23년 취업 상담 250회 및 취업 연계 60명 목표)
- 민관 장애인 일자리 유관기관과의 일자리 확대 방안 지속 논의

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	인승교(3350)	담 당 자	김경미(3351)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

IV 추진 실적

○ '23년 4월 ~ 6월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 251명 참여)

※ 추진율 = [(사회서비스형 및 시장형 참여자 수)/임기내 목표 310명]*100 = (251/310)*100 = 80.9%

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ '22. 7월 : 노인일자리 사업 3분기 보조금 지급
	○ '22. 9월 : 노인일자리 사업 수행기관 지도점검
	○ '22.12월 : 2023년 노인일자리 사업 계획 및 신규사업 발굴
	○ '23년 1월 : 사회서비스형 및 시장형 신규 일자리 사업 발굴 및 추진
	○ '23년 2월 ~ 3월 : 노인일자리 사업 추진(사회서비스형 및 시장형 202명 참여)

V 문제점 및 대책

○ 고령의 참여자가 증가함에 따라 단순 일자리 사업 참여 선호

○ 어르신 특성상 건강 문제 및 가족 반대 등의 이유로 중도 포기자 발생

➡ 다양한 시장형, 사회서비스형 사업추진 및 대기자 관리를 통한 결원 보완

VI 향후 계획

○ 노인일자리 수행기관 사업별 진행현황 점검 및 관리

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박혜영(3341)	담 당 자	장수민(3366)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-9	노인회 활동비 지원						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	892백만원

I 사업 개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 892백만원(시비 892)
- 사업대상 : 349명(지회장 1, 분회장15, 경로당회장 333)
- 근거법령 : 노인복지법 제24조 및 동법 시행령 제18조, 당진시노인복지증진에 관한 조례 제18조
- 지급방법 : 대한노인회 당진지회에서 지회, 각 분회 및 경로당에 활동비 지급
- 지역봉사지도원 역할 및 활동비 지원 기준

구분	역할	활동비 지원 기준
총괄 책임관리자 (대한노인회 당진시지회장)	- 「지역봉사지도원」을 대표하고 총회 및 조직의 장 - 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 총괄 - 「지역봉사지도원」 연수 및 양성교육 - 「지역봉사지도원」 예산운영 및 정산관리	노인지회 : 월 200천원
읍면동 책임관리자 (노인회 분회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 지회 지시사항등 협의사항 전달 및 자체회의 - 읍면동별 「지역봉사지도원」 운영 및 조직관리 - 노인자원봉사활동 장려	노인분회 : 월 100천원
경로당 책임관리자 (읍면동 노인회장)	- 노인복지정책의 홍보 및 안내 - 경로당 이용안내, 개방 및 시설점검 등 안전관리 - 경로당 비품 관리 및 환경정비등 - 감염병 예방을 위한 경로당 방역 관리	경로당 : 월 50천원

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인회 활동비 지급	회	4회	-	1	1	1	1

* 연 12회 노인회 활동비 지급 확인지표를 노인복지법 지역봉사지도원 위촉에 따른 활동비 보조금 지급으로 확인지표 연 1회로 정정

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인회 활동비 지급	대한노인회 당진시지회 위수탁 협의 및 활동비 보조금 지급	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검	지역봉사지도원 활동일지 및 활동비 지급 점검

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	892	0	892	0	223	223	223	223	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	892		892		223	223	223	223	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ 2023. 1. ~ : 지역봉사지도원 활동 개시 및 지역봉사지도원 활동비 보조금 지급

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 2023년 사업비 223백만원 본예산 편성 ○ 2023. 1. : 당진시·대한노인회 당진시지회 간 위탁협약 체결 ○ 2023. 1. : 대한노인회 당진시지회 지회장 지역봉사지도원 운영 총괄 책임관리자 지정
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 수탁기관(대한노인회 당진시지회) 지역봉사지도원 활동일지 점검 및 활동비 지급 점검

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박혜영(3341)	담 당 자	이나영(3343)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-10	노인 건강관리 프로그램 운영 확대						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,735백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업비 : 3,261백만원(도비 269, 시비 2,992)

○ 사업내용 : 경로당 프로그램 활성화로 건강증진 기여

○ 확대방안 : 매년 참여 경로당 10개소씩 확대

➡ 경로당 활성화 프로그램 참여자 만족도 조사 등을 통한 프로그램 보완 및 발굴

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	개소	280	209	250	260	270	280

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
노인 건강관리 프로그램 운영 확대	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영	프로그램 만족도 및 신규 프로그램 발굴 조사	참여 경로당 모집 및 프로그램 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,735	474	3,261	455	679	693	709	725	0
국비	0		0						
도비	321	52	269	47	54	55	56	57	
시비	3,414	422	2,992	408	625	638	653	668	
민자	0		0						
기타	0		0						

※ 추경1회 예산 반영으로 투자계획 변경, 경로당 개소 증가 및 프로그램 운영 확대

IV 추진 실적

- (2023. 5.) 경로당 활성화 추진 계획 수립
 - ⇒ 노인 건강관리 일환으로 어르신들의 사회참여 활동 지원
- 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황

구분	경로당 개소	참여 개소	참여율	프로그램 수
2022년	332	209	62%	25
2023년	333	260	78%	30

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 경로당 건강관리 등 프로그램 추진 현황 조사 실시 ○ 경로당 환경 개선 방안 마련을 위한 현장조사 추진 및 경로당 회원 재정비 등
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 사)대한노인회 당진시지회 관리부 소속 담당자 2명이 경로당 활성화 프로그램 운영 지원 및 관리 업무를 추진하고 있으나 경로당 활성화 프로그램 외 다양한 업무를 수행하고 있어 프로그램 보급 확대를 위한 인력 충원 필요
 - ⇒ 경로당 활성화 프로그램 운영 강사 지원 체계 전환으로 효율적인 사업 추진
(미상시 운영 프로그램) 필요 시 강사 채용
(상 시 운영 프로그램) 선호 프로그램(건강체조, 노래 등) 중심으로 기간제 강사 전환 여부 검토

VI 향후 계획

- (2023. 07.) 상반기 경로당 활성화 프로그램 및 강사 만족도 조사
 - ⇒ 경로당 활성화 프로그램 참여 어르신 의견 수렴 및 개선방안 모색
- (2023. 11.) 경로당 활성화 프로그램 강사 간담회 실시
 - ⇒ 어르신들 선호 프로그램 발굴 및 차년도 경로당 활성화 프로그램 운영방안 논의

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박혜영(3341)	담 당 자	이나영(3343)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-11	독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공
------	--------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	994백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 서비스 제공 대상자 댁내

○ 사업기간 : 2023년 4월 ~ 2026년 12월

○ 사업비 : 994백만원

○ 사업내용 : 인공지능(AI) 기술이 적용된 장치를 이용하여 상시 돌봄서비스 제공

- (똑똑TV) 40명 / TV 시청패턴을 활용하여 이상징후 모니터링
- (NUGU) 50명 / AI 스피커를 통한 일상생활 지원 및 응급상황 관리
- (효 돌) 50명 / 터치-음성 반응 AI 돌봄 인형을 통한 정서 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	명	1,000	-	140	400	700	1,000

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
독거노인 인공지능 돌봄서비스 제공	세부 계획 수립(변경)	대상자 선정 및 서비스 제공	사업수행 및 모니터링	사업수행 및 모니터링, 시범사업 성과평가

※ 2023년 시범사업으로 추진 후 대상자 만족도 및 사업성과 등을 고려하여 본사업 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	994	0	994	0	220	234	270	270	0
국비	100		100		100				
도비	0		0						
시비	894		894		120	234	270	270	
민자	0		0						
기타	0		0						

※ 본사업 추진 시 투자계획에 변동 있을 수 있음

IV 추진 실적

- (2023. 4.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 사회복지시설 관계자 간담회
- (2023. 4.) 서비스 제공 대상자 선정
- (2023. 5.) “SKT NUGU 서비스” 공급 용역 계약
- (2023. 6.) “SKT NUGU 서비스” 대상자 50명에게 장비 보급
- ※ 추진율 = (AI 장비 보급 및 서비스 제공자 수 / 임기내 목표) * 100
= (50명/1,000명) * 100 = 5%

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ (2022. 8.~10.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 관련 업무 회의(7회) ○ (2022. 12.) 행정안전부 적극행정 우수사업 확산사례 공모사업 선정(특교세 100백만원) ○ (2023. 3.) 사업 추진계획 수립(사업 내용 및 규모 변경) ○ (2023. 3.) 독거노인 인공지능 돌봄서비스 사업 읍면동 담당자 대상 설명회
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 사업의 주된 대상이 디지털 장치에 익숙하지 않은 고령의 독거 어르신으로, 사업에 대한 이해가 부족하고 새로운 문물을 받아들이는 데 부담을 느낌.
 - ➡ 충분한 사전 설명 및 반복적인 장비 교육 등을 통해 기기 사용 방법 숙지 지원
- 인공지능 돌봄서비스를 도입하더라도 기본적인 장비 세팅(일정, 복약 시간 등 설정, ON/OFF 관리 등) 및 이상 신호에 대한 모니터링과 안부 확인 등은 돌봄 인력이 수행해야 함.
 - ➡ 대상자 확대 추진 시 양질의 돌봄서비스를 제공하기 위해서는 별도의 돌봄 인력 필요
- “효돌” 사업량을 당초 독거 어르신 50명으로 계획하였으나, 하반기(8~9월) 2세대 효돌 출시 예정에 따라 가격 상승이 예상됨. 2세대 효돌은 전방향 움직임 감지가 가능하며, 챗-GPT가 탑재되어 자유 대화가 가능하여 2세대 효돌을 구입하여 보급 예정
 - ➡ 사업량 조정 검토(50명 → 30명)

VI 향후 계획

- (2023. 7.) “KT 똑똑TV 서비스” 공급 용역 계약 추진 및 서비스 제공
- (2023. 9.) “효돌” 물품 구입 및 서비스 제공
- (2024. 1.~) 본 사업 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박혜영(3341)	담 당 자	김민정(3344)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-12	장기요양요원 처우 개선						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	52.8%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	3,022백만원

I

사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)

○ 사업대상 : 1,200명

○ 사업비 : 2,258백만원(도비 435, 시비 1,823)

○ 사업내용 : 장기요양요원의 역량 강화 및 권익 보호를 위한 처우개선 지원

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계	명	1,100	242	752	810	950	1,100
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	800	92	572	600	700	800
돌봄 역량강화	명	300	150	180	210	250	300
장기요양요원 지원센터	1개소	설치(유치)	-	-	-	-	설치(유치)

III

사업계획

[추진계획]

단위사업(100)	1분기	2분기	3분기	4분기
노인의료복지시설 처우개선비 지원	18개소(412명)	19개소(600명)	20개소(620명)	21개소(650명)
돌봄 역량강화	-	-	180명(2,000천원)	-
장기요양요원 지원센터	-	처우개선 연구용역 예산확보	처우개선 연구용역 추진	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,022	163	2,258	170	465	481	541	601	601
국비	0		0						
도비	582	30	435	31	89	93	105	117	117
시비	2,440	133	1,823	139	376	388	436	484	484
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대 : 2분기 20개소(581명), 108백만원 지원
- 장기요양 종사자 처우개선 연구용역 예산 확보 : 22백만원

단위사업	단위	2023년	
		목표	2분기 실적
계	명	780	581
노인의료복지시설 처우개선비 지원	명	600	581
돌봄 역량강화	명	180	3분기 추진 예정
장기요양요원 지원센터	1개소	-	2분기 연구용역 예산 확보

※ 추진율 = (처우개선비지원자 수 + 돌봄역량강화 참여자 수) / 임기내 목표 *100
 = (581명 / 1,100명)*100 = 52.8%

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 노인의료복지시설 처우개선비 지원 확대(18개소(412명), 62백만원 지원) ○ 당진시노인장기요양 시설협회, 재가협회 간담회 실시
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 장기요양지원센터 설치 : 충남은 道 지원센터를 ‘25년까지 설치 예정이나 기초단체는 국비 지원 없어 시비 100% 확보가 필요함에 따라 설치·운영 검토 필요
 - 처우개선비 지원 : ‘23년부터 道 지원사업으로 노인의료복지시설 종사자에 대한 처우개선비만 지원하고 있어 재가장기요양기관 종사자의 상대적 소외감 발생
- ⇒ 당진시 요양보호사의 근무 여건 등 실태조사와 처우개선 방안, 장기요양지원센터의 필요성과 구체적인 설치 방안 마련을 위해 2023년 추경예산 22백만원 확보하여 3분기 연구용역 실시 예정

VI 향후 계획

- 장기요양 종사자 역량강화를 위해 교육 및 힐링 프로그램 추진
- 요양보호사 처우개선 방안 마련을 위한 연구용역 예산 22백만원 확보에 따라 3분기 연구용역 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	박혜영(3341)	담 당 자	김애숙(3342)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-13	공동묘지 정비						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	1,300백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사 업 비 : 1,300백만원(시비)

○ 사업내용 : 공동묘지 불법 사항 정비, 수급계획 수립, 분묘 일제 조사, 공설묘지 확장

II사업목표

[확인지표]

단위사업(100%)	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
불법 사항 정비(25%)	필지	57필지	57	57	-	-	-
수급 계획 수립(25%)	수립	수립	-	수립	-	-	-
분묘 일제 조사(25%)	완료	완료	-	착수	완료	-	-
공설묘지 추가(확장)(25%)	착수	1개소	-	-	-	-	착수

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
불법 사항 정비	금지 안내·복구명령	금지 안내·복구명령	금지 안내·복구명령	금지 안내·복구명령
수급 계획 수립	착수	-	완료	-
분묘 일제 조사	-	착수	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,300	0	1,300	10	50	20	20	1,200	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,300		1,300	10	50	20	20	1,200	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- (2023. 4.) 대상지 측량 및 필지 분할·경계 울타리 설치
- (2023. 5.) 분묘 표주 설치(91기) 및 분묘지도 작성
- (2023. 6.) 정비대상 공동묘지 연고자 조사

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (2022년) 공동묘지 안내판(61개) 및 불법 사항 경고판(45개) 제작 설치 완료 ○ (2023년) 당진시 장사시설 지역 수급 계획 용역 착수 ○ (2023년) 공동묘지 정비(솔뫼공설묘지 확장) 관련 종합 의견 수렴
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 공동묘지 정비(재개발)을 위하여 부지 내 분묘 조사와 정리가 선행되어야 하며, 최소 2년 이상 중·장기적 시간이 소요되기 때문에 지속적인 재정적, 물리적 투자가 필요함
- 공설묘지 확장을 위한 사업대상지 확보 및 신규장사시설 설치 시 국비 지원 필요
- 공동묘지 불법행위 근절을 위한 읍·면·동의 공동묘지 재산관리자의 꾸준한 불법행위 계도 및 정비 활동 필요

VI 향후 계획

- 장사 수급계획에 따른 우선 정비대상 묘지 추가 선정
- 분묘 일제 조사 추진 (연고자 조사)
- 공동 묘지 불법사항 정비 지속 추진

주관부서	경로장애인과	부 서 장	임동신(3340)	팀 장	안두현(3360)	담 당 자	홍아현(3362)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-14	공공의료원 건립						
------	----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	신규	사업주체	광역	사업기간	2022~	사업비	83,549백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 면천면 성하리 산143-1(시유지 : 23,430㎡)

○ 사업기간 : 2022~

○ 사 업 비 : 83,549백만원

○ 사업내용 : 시립 공공의료원 설립 추진

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공의료원 건립	-	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공공의료원 건립	시민운동본부와의 간담회	시립병원 설립 의견 수렴을 위한 토론회 준비	토론회 개최	토론회 결과에 따른 장단기 방안 모색

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	83,549	0	0	0	0	0	0	83,549
국비	41,775		0					41,775
도비	12,532		0					12,532
시비	29,242		0					29,242
민자	0		0					
기타	0		0					

IV 추진 실적

- 공공의료원 건립을 위한 시민운동본부와의 간담회 개최 (5월 22일)
- 공공의료 확충 방안 및 공공의료원 건립 위한 2차 토론회 개최 논의

그동안 추진실적 [`22.07.~ `23.03.]	○ 시민토론회 개최 : `22.10.18.(화), 14:00</li> <li>- 참석자 : 일반시민, 보건전문가, 시민·사회 단체 등 300여명</li> <li>- 공공의료원 설립 추진전략 및 방향모색, 시민 의견 수렴 등</li> <li>○ 시민운동본부와의 간담회 추진 : `23. 3. 27.) - 공공의료원 건립을 위한 민·관 협조체계 구축 및 사안 논의 등
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 전국적으로 시립 및 공공의료원 운영이 적자 상황이며, 의료인력 확보의 어려움 심각
- 시립공공의료원이 적자를 예상하고 설립된다 해도 지역 내 의료욕구 충족 여부 미지수
- 재정, 의료인력 수급 및 의료환경 등 전반적 상황을 시민과 공유하고 시립병원설립 타당성 여부 및 설립 시기 등에 대한 시민 합의 도출 필요

VI 향후 계획

- 시민운동본부와 협의하여 토론회 준비(토론회 참여자 및 방식 등 논의 및 협의) : 3분기
- 보건의료 전문가와 시민 의견 수렴 및 합의 도출을 위한 토론회 개최 : 4분기
- 토론회 결과 시민 합의 내용에 따라 시립공공의료원 설립 타당성 연구용역 추진 여부 결정 및 의료서비스 개선을 위한 장단기 방안 모색 : 4분기

주관부서	보건행정과	부 서 장	정승모(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라운(6003)
협조부서	감염병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	최은보라(6131)

5-15	대형병원 유치						
------	---------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	25%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~	사업비	80,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 송산2산단 내 공공시설용지 중 병원부지 14,370m²(소유자:현대그린개발)

○ 사업기간 : 2022~

○ 사 업 비 : 민간자본

○ 사업내용 : 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대형병원 유치	-	투자활동	TF팀구성	투자활동	투자활동	투자활동	투자활동

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
대형병원 유치	정부정책사업에 따른 병원 유치 정보 수집	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동	병원유치 전략 마련 및 홍보 활동

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	80,000		0						80,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 정부정책사업에 따른 병원 유치 위한 정보 수집 및 우리시 의료적 정주여건 분석 활동

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 대형병원 유치 위한 실무추진협의체 구성 - 구성 : 당진시(보건소) + 현대제철(관제팀) + 현대그린개발 - 내용 : 병원 유치를 위한 정보공유, 병원 유치 전략 마련 및 유치 활동 전개
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 지자체마다 의료환경 개선을 위한 민간 대형병원 유치 경쟁 치열
- 충남 북부 산업도시 중 유일하게 공공의료기관 및 대학병원 전무한 상황임을 착안하여 정부정책사업에 따른 병원(산재병원 등) 설립 기회 확보 방안 모색

VI 향후 계획

- 베이밸리 메가시티 신규사업 관련 재할 치유병원 유치 활동에 따른 우리시 의료 환경 분석 등 필요 정보 제공
- 민간 및 대학병원 등 병원유치 전략 및 홍보 활동 지속 추진

주관부서	보건행정과	부 서 장	정승모(6001)	팀 장	장희선(6002)	담 당 자	김라운(6002)
협조부서	투자유치과	부 서 장	구자건(4060)	팀 장	이상현(4061)	담 당 자	임승현(4062)

5-16	산후조리비 지원						
------	----------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	90%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2026	사업비	2,100백만원

I 사업개요

○ 사업기간 : 2023~2026

○ 사업량 : 3,500명(年 1,000명)

○ 사업비 : 2,100백만원(年 600백만원)

○ 사업내용

- 출생일 및 신청일 현재까지 당진시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 영아의 부 또는 모

- 출생 후 6개월이 지나지 않은 지원 대상으로 1회 지급

- 단태아(600천원), 다태아(1,000천원) 현금지원

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산후조리비 지원	명	3,500	-	500	1,000	1,000	1,000

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
산후조리비 지원	보건복지부 사회보장제도 협의완료	「당진시 산후조리비 지원」 조례 제정	추경 예산편성	예산집행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,100	0	2,100	0	300	600	600	600	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	2,100		2,100		300	600	600	600	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례안」
 - 성별영향 분석평가 : 개선사항 없음(2023A충남당진042)
 - 행정규제 사전심사 : 해당사항 없음
 - 2023.6.8. 전선아 의원 의원발의 ⇒ 의결 결과(원안가결) ⇒ 2023.6.30. 조례 공포

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 2022년 사회보장제도 신설(당진시 산후조리비 지원) 협의서 요청 - 보건복지부 사회보장조정과 / 보건위생과-12773(2022.8.26.)호. ○ 사회보장사업 신설·변경에 대한 협의 결과 반려[사회보장조정과-2888(2022.8.29.)] - 사유 : 사전협의 요청기한(법정기한/6월30일) 긴급사유에 해당하지 않음
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 산후조리비 지원 2회 추경 예산확보(300백만원)

VI 향후 계획

- 산후조리비 지원 추경 예산확보(300백만원)
- 「당진시 임신·출산 지원에 관한 조례」 공포한 날로 출생한 영아부터 산후조리비 지원 적용
- 출생신고 시 읍·면·동 행정복지센터 산후조리비 지원 접수 안내 및 홍보
- 관내 산부인과 연계 홍보(리플릿, 포스터 등 게시)
- 산모들이 쉽게 접근할 수 있는 당진시 공식 SNS, 블로그 등을 활용한 인터넷 홍보

주관부서	보건위생과	부 서 장	김제란(6650)	팀 장	이계숙(6670)	담 당 자	이계숙(6670)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

5-17	주·야간 아동 전문 병동 설치						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	이행 후 계속	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2026	사업비	4,425백만원

I사업개요

○ 사업명 : 2023년 소아 야간응급진료센터 운영

○ 사업위치 : 응급실 내 소아 야간응급진료센터 설치 가능한 응급의료기관

○ 사업기간 : 2023. 1. 1.~12. 31.

○ 사업비 : 총 825백만원(도 180, 시군 645)

○ 사업내용

(운영장소) 당진종합병원 응급실 내

(운영일시) 2023. 4. 1.~12. 31. / 19:00~익일 05:00

(사업대상) 만 15세 이하 소아청소년

(운영내용) 소아청소년과 전문의 소아 진료 및 소아 입원 병동 운영

(지원내용) 전담 의료인력(의사 3명, 간호사 3명) 인건비 지원

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국·도비 지원 공모사업 선정	건	1	-	공모사업 선정	운영	운영	운영

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
소아 야간응급진료센터 운영	공모사업 선정 및 사업 운영 준비	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영	소아 야간응급진료센터 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,425	0	3,525	0	825	900	900	900	900
국비	0		0						
도비	900		720		180	180	180	180	180
시비	3,525		2,805		645	720	720	720	720
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.04.01.) 소아 야간응급진료센터 운영 개시
- ('23.05.01.) 소아전담 의료인력 부족으로 인한 진료시간 변경
* (기존) 19:00~익일 05:00 → (변경) 19:00~익일 01:00
- 소아 야간응급진료센터 진료인원: 총 2,293명(일평균 25.4명) ※'23.4.1.~6.30.(3개월간)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.06.]	○ 소아 야간응급진료센터 운영을 위해 관내 의료기관과 지속적인 협조체계 구축 ○ 보건복지부 및 충청남도 지원사업 선정을 위한 노력 - 지역 도의원 통한 사업제안서 안내 및 도 담당부서에 지원 협조 건의 - 보건복지부 관련 사업 참여희망서 제출 및 지원사업 동향 파악 ○ ('23.01.) 충청남도 「2023년 소아 야간응급진료센터 운영지원」 사업 공모신청 및 선정 ○ 전담 의료인력 구인 및 소아 야간응급진료센터 운영 계획 수립('23.03.06.)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 전국적인 소아전문 의료인력 구인난에 따른 의사 1명 채용 지연(계획 3명, 현 2명)
⇒ 의사 1명 추가 채용 위한 의료기관과의 적극적인 협조체계 유지 및 구인 노력

VI 향후 계획

- ('23.07.) 보조금 지원계획 변경(자체시비 추가지원) 및 교부결정·예산집행
- (~'23.12.) 소아 야간응급진료센터 이용자 만족도 조사 실시 및 평가

주관부서	감염병관리과	부 서 장	정성숙(6100)	팀 장	장은진(6130)	담 당 자	최은보라(6107)
------	--------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

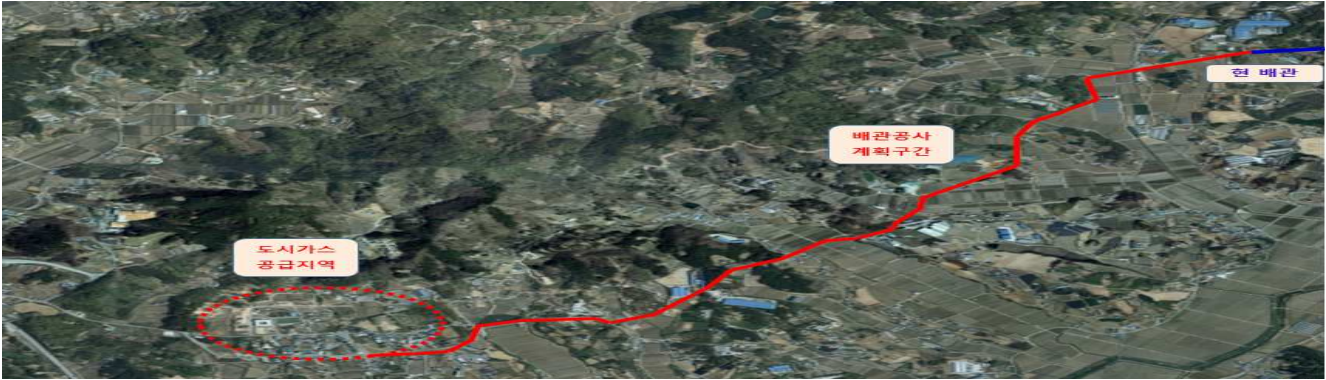
6 살기 좋은 도시 · 환경

6-1	면천권역 도시가스 공급 추진						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2025	사업비	3,700백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 면천면 문봉리 및 성상리 일원
- 사업비 : 3,700백만원(도비 444, 시비 1,036 / 도시가스사업자 2,220) ※ 주민분담금 40
- 대상 : 385가구
- 사업기간 : 2024. ~ 2025.
- 사업내용 : 도시가스 배관 7.7km 설치(순성면 서울경금속 ~ 면천면사무소 일원)



II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
면천권역 도시가스 공급	세대	385			385		

- 목표 : (기존) 2024년 350세대 → (변경) 2024년 385세대
- 사유 : 면천면 성상리 일원 도시가스 수요세대 재산정

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
면천권역 도시가스 공급				문화재현상변경허가 신청

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,700	0	3,700	0	0	3,700	0	0	0
도비	444		444			444			
시비	1,036		1,036			1,036			
민자	2,220		2,220			2,220			

IV 추진 실적

- 2023. 6월 : 사업비에 대한 금액 및 부담비율 상호 협의 중
 - 사업비(3,740백만원) : 道(444백만원, 12%), 市(1,036백만원, 28%), 도시가스사(2,220백만원, 60%)

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 2023. 3월 : 도지사와 충청도 읍면동장과의 간담회시 시비에 대한 도비 지원 건의(면천면장)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 당진시 도시가스 공급사업 보조금(시비) 지원 조례의 지원기준 초과
 - 지원기준에는 적합하지만, 세대당 지원금액은 초과

구 분	지 원 기 준	세대당 지원금액	비고
지원조례	100M당 5세대이상~39세대 미만	200만원이하	
면천권역	100M당 5세대(조례 적합)	300만원(조례 기준 100만원 초과)	

- 문화재 보존지역
 - 도시가스 배관 배설 전 도지정문화재현상변경허가 필요

VI 향후 계획

- 「도시가스 공급사업 보조금 지원 조례」 개정(세대당 지원금액 상향 등) 검토 등을 통한 보조금(시비) 지원 방안을 마련하고 연차별 사업비 확보 추진

주관부서	지역경제과	부 서 장	이제석(4011)	팀 장	이준행(4045)	담 당 자	김태현(4046)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행						
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	67,270백만원

I 사업 개요

- ① 「당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획」 수립
- 사업기간 : 2021. 5. ~ 2023. 06.
 - 사업비 : 191백만원 (충남 서북부 미세먼지대응 행정협의회 공동사업비로 추진)
 - 사업내용
 - 미세먼지로 인한 시민체감 정책 추진을 위한 선제적 대응체계 마련
 - 지역별 특성에 맞는 맞춤형 미세먼지 개선방안 수립 등
 - ※ 충남 서북부 미세먼지 대응 행정협의회 회원 : 당진, 천안, 아산, 서산
- ② 신뢰성 있는 대기환경 정보 제공을 위한 측정망 구축 및 시범운영
- 사업기간 : 2022. 8. ~
 - 사업내용 : 대기측정망 확충 및 간이측정기 검증을 통한 생활밀착형 대기정보 제공
 - 국가측정망 확충 : 2개소(총 4개소), 마을대기측정망 : 13개소

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업		단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		1식	이행	수립		이행		
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	개소	2개소	완료	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	개소	13개소	시범운영		시민공개		

※ 확인지표 변경사유 : 계획수립 일정 연장 및 마을대기측정망 신뢰성 확보를 위한 시범운영기한 연장

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업		1분기	2분기	3분기	4분기
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		수립		이행	이행
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	시범운영(13개소)			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	67,270	14,486	47,147	5,551	10,399	10,399	10,399	10,399	5,637
국비	30,584	8,129	19,376	3,208	4,042	4,042	4,042	4,042	3,079
도비	5,322	943	4,152	380	943	943	943	943	227
시비	31,364	5,414	23,619	1,963	5,414	5,414	5,414	5,414	2,331
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 23.4. 서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 구축 최종보고서 수립

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ (‘22.9.) 서북부 미세먼지대응 행정협의회 실무회의 ○ (‘23.3.) 서북부 미세먼지대응 행정협의회 최종보고회
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 미세먼지 저감을 위해 관련부서 및 전부서에서 적극적인 협조 필요

VI 향후 계획

- 수립된 최종보고서를 토대로 당진시 실정에 맞는 미세먼지 저감 사업 추진

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	차상명(6575)	담 당 자	최종원(6576)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	22%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	121,750백만원

I 사업 개요

① 친환경자동차 보급 확대

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 97,685백만원
- 사업규모 : '26년까지 5,859대
- 사업내용 : 친환경자동차 구매 지원 차종 확대 및 보급

② 친환경차 충전인프라 구축 유도 및 확대

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업규모 : (전기) 공용급속 80기 (수소) 6개소
- 사업내용
 - 친환경차 충전인프라 구축을 통한 편리한 충전여건 조성
 - 관련법 개정에 따른 전기차 충전기 의무 설치화로 충전시설 구축 유도 및 확대

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
친환경차 보급 확대	대	5,859	883	1,076	1,200	1,300	1,400
충전 인프라 확대	개소	86	45	53	64	75	86

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
친환경차 보급(누적)	430	752	967	1,076
충전인프라 구축(누적)	10	64	73	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	121,749.6	24,063	97,686.6	19,042.6	19,661	19,661	19,661	19,661	0
국비	63,120	12,588	50,532	9,952	10,145	10,145	10,145	10,145	
도비	21,496.6	4,501	16,995.6	3,075.6	3,480	3,480	3,480	3,480	
시비	37,133	6,974	30,159	6,015	6,036	6,036	6,036	6,036	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- '23년 5월말 기준 전기승용차 265대, 전기화물차 147대, 수소자동차 18대 보급
- '23년 5월말 기준 7개소 29기 전기자동차 충전기 운영

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 전기 승용 891대, 전기 화물 371대, 수소자동차 97대 보급 ○ 전기자동차 충전기 설치 협약 및 전기자동차 충전기 39개소 설치
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 친환경자동차법에 따른 공공기관 및 공공시설의 전용주차구역 설치 필요

VI 향후 계획

- '23년 전기승용차 700대, 전기화물차 300대 보급
- '23년 9월말까지 41개소 120기 전기자동차 충전기 설치 완료 및 운영

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	차상명(6575)	담 당 자	최종원(6576)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-4	삽교호·석문호 담수호 수질개선
-----	------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2030	사업비	250백만원

I 사업 개요 1) 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행 ○ 사업위치 : 삽교호유역(6개시·군) ※ 당진,천안,아산,홍성,예산,청양 ○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2030. 12. ○ 사업비 : 100백만원(국70 도 9 시 21) ○ 사업내용 - 삽교호 수질오염총량관리제 확대 요청 및 협의 - 삽교호 수질오염총량관리제 확대시행에 따른 시행계획 수립 2) 석문호 비점오염원 관리지역 지정 ○ 사업위치 : 석문호유역(213.6km²)※당진시구역 ○ 사업기간 : 2024. 1 ~ 2030. 12 ○ 사업비 : 150백만원(도 75 시 75) ○ 사업내용 - 비점오염원 관리지역 지정관련 타당성조사 - 관리지역 지정 요청서 접수 - 관리지역 지정 고시							
II 사업 목표 [확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	-	총량제 확대	확대필요건의 (시→도)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약	기본계획 착수(도)	기본계획수립 및 목표수질 설정 완료	시행계획착수 (당진시)
석문호 비점오염원 관리지역 지정	-	관리지역 지정	자정필요건의 (시→도)	지정요청 (시→도)	타당성 조사완료 (당진시)	자정요청서 접수 (시·도·환경부)	지정·고시 및 관리대책 수립
III 사업 계획 [추진계획]							
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기			
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	확대 필요성 건의 (시→도)	확대 협의 회의 (도주관)	확대 협의 회의 (도주관)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약			
석문호 비점오염원 관리지역 지정	비점영향 수질분석 의뢰	비점영향 수질분석	비점영향 수질분석	지정요청			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	250	0	250	0	0	150	0	100	0
국비	70		70					70	
도비	84		84			75		9	
시비	96		96			75		21	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.6.) 충청남도 비점오염원 관리 종합대책 수립 연구용역 중간보고회
-> 당진시 비점오염원관리지역 추진사항 공유 및 협조요청
- ('23.6.) 비점영향 수질분석 2회 완료(석문호 비점오염원관리지역 지정)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22. 8.) 금강 중권역 이행평가 물환경관리협의회 회의 시 총량제 확대 의견 제출 ○ ('22. 9.) 道 비점오염원관리 기본계획 중간보고 시 지정 우선순위 반영 및 지정요청 ○ ('22.10.) 道 비점오염원관리 기본계획 용역사 협의(우선순위 반영 방안 협의) ○ ('22.10.) 충남연구원 물환경연구센터 협의(총량제 확대 방안 협의) ○ ('23. 1.) 국립환경 과학원 방문 협의(석문호 비점오염원관리지역 지정) ○ ('23. 2.) 도시군 환경부서장회의 건의(삽교호 총량제 확대) ○ ('23. 3.) 비점영향 수질분석 의뢰(석문호 비점오염원관리지역 지정) ○ ('23. 3.) 총량제 미시행지역(홍성, 예산, 청양) 확대 방안 회의(충청남도 주관)
-----------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 삽교호 수질오염총량제 확대는 홍성, 예산, 청양의 협조가 필요함
- 석문호 비점오염원 관리지역 지정은 道 계획에 우선순위에서 포함되어야 가능

VI 향후 계획

- 삽교호 수질오염총량제 미시행 지자체를 포함한 삽교호 유역 통합 회의 추진
- 비점오염원관리지역 지정요청서 작성 후 지정요청

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	문은호(6582)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-5	산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충저류시설 설치						
-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	15%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	171,000백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 8개 산업단지 중 3개 산단

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027

○ 사업비 : 시비부담액(경상) : 611억원, 연간 30.55억원(20년간)
(시설)157,000백만원 (국70/시30) ※내역 : 사업비+건설이자+사업수익
(운영) 14,000백만원(20년간) (시100)

○ 사업내용 : 차집시설 및 완충저류시설 설치 (3개 산단)

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완충저류시설 설치	-	착공	환경청과 사전협의	사업계획 신청	사업시행자 지정	실시설계 및 계획 승인	착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
완충저류시설 설치	사업계획 협의	사업계획 협의	환경청과 사전협의	사업계획 마련

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
국비	109,900		0						109,900
도비	0		0						
시비	61,100		0						61,100
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.5.) 완충저류시설 추진계획 관련 건설사와 회의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('23.3.) 건설사 사업 추진 의사 타진
--------------------------------------	----------------------------

V 문제점 및 대책

- 최근 급격한 금리 인상과 원자재 가격 상승 등으로 건설사업에 대한 기업 신규투자 위축
- 운영비 100% 시비 부담으로 지속적인 시비부담 증가

VI 향후 계획

- 타 지자체 원인자부담 방안 수립 동향 확인 등 벤치마킹

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	이새봄(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-6	생태하천 복원사업 추진						
-----	--------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	11.7%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2017~2026	사업비	73,423백만원

I 사업 개요

- 1) 남원천 생태하천복원사업
 - 사업위치 : 순성면 신포천 합류점 ~ 신평면 오봉천 합류점
 - 사업기간 : 2017. 1 ~ 2025. 12
 - 사업비 : 45,351백만원(국2,300 도 20,375 시 22,676)
 - 사업내용 : 생태하천 조성 L=9.5km
- 2) 시곡천 생태하천복원사업
 - 사업위치 : 시곡동 윗구물천 종점 ~ 원당동 당진천 합류점
 - 사업기간 : 2021. 1 ~ 2026. 12
 - 사업비 : 28,072백만원(도 14,036 시 14,036)
 - 사업내용 : 생태하천 조성 L=4.0km

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
남원천 생태하천 복원사업	-	준공	착공	공정률 30%	공정률 60%	준공	-
시곡천 생태하천 복원사업	-	준공	기본계획 수립	착공	공정률 30%	공정률 60%	준공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
남원천생태하천	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	공사 착공
시곡천생태하천	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행	사전 행정절차 이행

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	73,423	12,394	61,029	8,966	19,850	24,707	7,506	0	0
국비	2,300	2,300	0						
도비	34,411	4,622	29,789	5,983	9,200	10,853	3,753		
시비	36,712	5,472	31,240	2,983	10,650	13,854	3,753		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.5.) 남원천 수자원관리위원회 조치계획 완료
- ('23.6.) 시곡천 생태하천 복원방안(생태습지(안) 등) 합동협의(한국환경공단, 용역)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22. 7.) 시곡천 주민설명회 개최(당진1동,당진3동,송산면) ○ ('22. 7.) 남원천 주민설명회 개최(순성면) ○ ('22. 7.) 남원천 편입토지 분할측량 실시 ○ ('22. 9.) 남원천 농지전용 및 하천구역 관련 협의(충남도청) ○ ('22.10.) 시곡천 생태하천 복원사업 기본설계 검토 ○ ('22.10.) 남원천 농지전용 관련 협의(농림축산식품부) ○ ('22.12.) 남원천 분할측량 완료 ○ ('23. 1.) 남원천 하천구역 결정(변경) 요청 ○ ('23. 2.) 남원천 경관심의 요청 ○ ('23. 3.) 시곡천 생태유량 확보 방안 부서간 회의 ○ ('23. 3.) 남원천 경관심의 조치계획 완료 ○ ('23. 3.) 시곡천 습지조성 방안 등 회의
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 하천정비기본계획 수립, 기술심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요(사업지연)
- 철저한 용역 관리, 사전 준비를 하여 계획된 일정 안에 절차 마무리

VI 향후 계획

- 남원천 사전 행정절차 완료 후 착공
- 시곡천 사전 행정절차 완료 후 착공

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	이새봄(6583) 심현성(6581)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------------------

IV 추진 실적

- ('23. 4.) 오봉저수지 자연환경보전이용시설 설치(2단계)사업 공모
- ('23. 4.) 오봉저수지-오봉천 국가생태탐방로 조성사업 공모
- ('23. 6.) 오봉저수지 생태공원 기본계획 수립 관련 환경단체와의 협의
- ('23. 6.) 공모사업 현장 확인(국비: 금강청/ 도비: 충남도)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.11.) 타당성조사 및 기본계획 수립 착수 ○ ('22.12.) 주민설명회 실시 ○ ('23. 1.) 기본계획 수립 착수보고회 ○ ('23. 3.) 사업부지내 수면위로 노출된 유지 활용을 위한 물수지분석 용역 추진
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 오봉저수지 마스터플랜 수립 추진 중 제기된 문제점(저수지 용도폐지 검토)에 따른 용역 중지
 - ⇒ 기본계획 상 확정된 1단계 구간 실시설계 추진 및 착공
- 2단계 사업비 확보
 - ⇒ 국비(국가생태탐방로 조성) 및 도비(자연환경보전이용시설 조성) 사업 신청

VI 향후 계획

- ('23. 7.) 타당성조사 및 기본계획 수립 중간보고회
- ('23. 9.) 타당성조사 및 기본계획 수립 완료
- ('23.12.) 기본 및 실시설계 완료(1단계) 및 착공

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	강남기(6561)	담 당 자	김선영(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-8	당진시·서산시·대산석유화학단지와 환경개선협의회 구성 및 운영
-----	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	5%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I

사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~

○ 사업비 : 비예산

○ 참여범위 : 주민, 기업체, 전문가, 사회단체, 의회, 공무원 등

- 상호 인접지역에 위치한 기업체(대산석유화학단지 및 당진발전본부)의 참여

- 허가·지도점검 기관인 금강유역환경청과 충남도 두 기관과 당진·서산의 참여

○ 사업내용

- 대기오염물질 발생 및 확산 방지를 위한 공동협력방안 모색

- 기업체 환경개선계획 추진 협의 및 화학 및 기름유출 사고·민원 대응체계 구축

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경개선협의회 구성 및 운영	-	구성 및 운영	유관기관 협의	구성 및 운영	지속 운영		

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
관계기관 협의	서산시 협의	상위기관 협의		
운영 주체 협의			기업체 협의	
구성				협의회 구성

IV

추진실적

○ 환경개선협의회 구성 관련 기관 지속 협의

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 서산시 협의(3가지 안 중 검토 필요) ① 기 운영 중인 협의회에 당진시(공무원) 추가 구성 [충남도, 당진시, 서산시] ② 기존 협의회 해체 후 재편성 [환경부 중심으로 구성] ③ 신규 협의회 구성 [충청남도, 당진시, 서산시] ○ 충청남도 협의 - 기존 협의회 참여보다는 금강청을 포함한 신규 협의회 구성이 타당 - 다양한 협의회 구성(안) 검토 필요
--	--

V 문제점 및 대책

- 통합인허가 제도로 인해 산업단지 내 협의체 구성 대상이 되는 대규모 사업장들의 인허가 지도점검 기관이 충청남도에서 환경부(금강청)으로 변경되어 복합적인 협의 필요

VI 향후 계획

- (~ '23. 9.) 관련기관, 기업체 협의 : 서산시, 충청남도, 대산산단 및 동서발전
- ('23.10 ~ 11.) 관련 기관 등 협의 : 금강청, 서산시, 충청남도
- ('23.12.) 추진 협의체 최종 구성(안) 협의 및 구성 <목표>

주관부서	기후환경과	부 서 장	조한영(6560)	팀 장	강남기(6561)	담 당 자	김아르미(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-9	도심 속 명품 호수공원 조성						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	1,000억원 추정

I사업개요

○ 사업위치 : 관내 도심권 일원

○ 사업기간 : 2023~2027 ※ 행정절차, 토지보상 지연 등 사업기간은 변경될 수 있음

○ 사업비 : 최소 1,000억원 추정

○ 사업내용 : 면적 - 139,000㎡ ~ 169,000㎡(42,100평 ~ 51,200평)

- 관내 도심권 인공호수 조성

- 편익시설·휴게시설·운동시설 등 공원시설물 설치

- 수목식재(교목류, 관목류), 조경시설물 설치

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
호수공원 조성	-	토지보상 착수	타당성 조사 용역발주	대상지 선정, 개발행위제한 고시 등	도시관리계획 결정 및 공원조성계획 수립 착수	실시설계, 지방재정 투자심사	토지보상 착수

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
호수공원 조성	대상지 선정을 위한 사전행위 절차 이행	개발규모·전략·컨셉등 기본구상, 대상지 선정	개발행위제한 고시, 조성계획(로드맵)수립	도시관리계획 및 공원조성계획 등 용역 발주

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	101,070	0	41,070	270	800	0	0	40,000	60,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	101,070		41,070	270	800			40,000	60,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.04.28.) 호수공원 조성을 위한 '시민공청회' 개최
- ('23.06.28) 호수공원 대상지선정 위원회 개최 및 대상지 발표

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.07.18.) 신규공원 확충 입지계획 검토 보고
	○ ('22.09.01.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 용역 심의위원회 원안결
	○ ('22.12.26.) 호수공원 대상지 선정 용역 착수
	○ ('23.01.19.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회 개최
	○ ('23.03.07.) 호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성 조사용역 중간보고회 개최

V 문제점 및 대책

- 호수공원 조성을 위하여 농업진흥구역 편입이 불가피하여 농업진흥구역 해제에 따라 협의가 지난하여 절반 정도는 다른 용도지역과 편입 검토
- 도심권 호수공원 후보지가 공개될 경우 난개발 및 투기로 인하여 향후 공원보상 및 개발에 지장이 초래될 것이 우려되어 최종후보지 발표 전까지 후보지에 대하여 각종 인허가 처리 유보 요청(건축허가·신고, 개발행위허가, 농지전용허가, 산지전용허가 등 관련부서협조)
- 호수공원 최종 후보지 확정 이후 토지가격 상승을 목적으로 토지거래 및 전용해위가 발생 될 것으로 우려되어, 최종 후보지에 대하여 개발행위제한지역으로 고시 요청(도시과 협조)

VI 향후 계획

- ('23.07.) 최종후보지 개발행위제한지역 및 토지거래허가구역 결정 고시
- ('23.11.) 호수공원 조성을 위한 타당성조사 및 도시관리계획결정(공원조성계획) 용역 발주

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	안상진(4180)	담 당 자	정의식(4181)
협조부서	도시과	부 서 장	이태환(4400)	팀 장	박정래(4401)	담 당 자	조성규(4403)

6-10	도심 속 명품 계림공원 조성						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	67%보상완료
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2020~2025	사업비	52,002백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 계림근린공원, 수청동 848-1번지 일원

○ 사업기간 : 2020~2026

○ 사업비 : 52,002백만원

○ 사업내용 :

- 계림공원 조성을 위한 토지 보상

- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진

- 충청남도 공모사업 신청(30억)

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계림공원 조성	-	착수	토지보상			토지보상 완료 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차	착수

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
계림공원 조성	공원조성계획(입안) 수립 단계	공원조성계획(입안) 및 주민의견청취 등 행정사항 진행	부서협의의견 및 주민의견 사항 조치계획 수립	당진시도시계획 위원회심의 및 공원조성계획 수립

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	52,002	16,902	34,100	6,000	8,700	8,700	8,700	2,000	1,000
국비	0		0						
도비	1,800		1,200					1,200	600
시비	50,202	16,902	32,900	6,000	8,700	8,700	8,700	800	400
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.04.) 공원조성계획(변경) 입안, 1회 추경 보상비 3,700백만원 증액 확보
- ('23.05.) 보상 협의 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.04.08.) 공원조성계획(변경) 수립 용역 착수
	○ ('22.09.03.) 대규모 투자사업 구조조정 결과에 따른 조치계획 보고 ※ 2023~2025 매년 토지보상비 8,700백만원 반영 요구
	○ ('23.01.) 계림근린공원 조성사업 편입토지 보상계획 통지, 감정평가의뢰
	○ ('23.02.~03.) 계림근린공원 편입토지 보상 협의, 토지 이전등기

V 문제점 및 대책

- 주변 도시개발로 인한 지가상승으로 공원보상비 증액이 불가피함
→ 지가상승을 감안하여 연차별 보상계획 재수립 및 조기 예산확보 추진
→ 보상계획에 따라 2023년 예산 5,000백만원에서 8,700백만원(추경 3,700백만원 확보) 증액 필요

VI 향후 계획

- ('23.07.)공원조성계획(변경) 부서 및 주민 의견 조치계획 수립, 주민설명회 개최
- ('23.10.) 당진시도시계획위원회 공원조성계획(변경) 심의
- ('23.12.) 공원조성계획(변경) 수립 고시

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	안상진(4180)	담 당 자	정의식(4181)
협조부서	도시과	부 서 장	이태환(4400)	팀 장	박정래(4401)	담 당 자	조성규(4403)

6-11	송악산 공원화 조성						
------	------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	24,100백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 송악산(중흥1호 근린공원), 송악읍 중흥리 산83-1번지 일원

○ 사업기간 : 2025~ 2029

○ 사업비 : 24,100백만원

- 토지보상비 22,100백만원
- 조성비 2,000백만원(도비 1,200, 시비 800)

○ 사업내용 :

- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성을 위한 임기내 토지 보상
- 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진
- 송악산(중흥1호 근린공원) 조성사업 착수

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송악산 공원화 조성	-	토지보상 착수				토지보상 착수	토지보상 진행

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송악산 공원화 조성	시기 미도래			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	24,100	0	12,000	0	0	0	6,000	6,000	12,100
국비	0		0						
도비	1,200		0						1,200
시비	22,900		12,000				6,000	6,000	10,900
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 시기 미도래

V 문제점 및 대책

- 중흥도시지역 총 5개 중 4개 공원이 실효되었고, 그중 송악산(중흥1호 근린공원)만 공원으로 결정되어 있어 중흥리 주민들을 위하여 반드시 공원 조성을 추진하여야 함
→ 연차별 보상계획에 따라 예산확보 추진

VI 향후 계획

- ('25.) 공원보상계획에 따라 공원보상 추진

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀	장	안상진(4180)	담 당 자	정의식(4181)
------	-------	-------	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

6-12	은봉산 자연휴양림 조성						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	26%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2028	사업비	21,800백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 당진시 정미면 수당리 산102-5번지 일원

○ 사업기간 : 2022~2028

○ 사업비 : 21,800백만원

○ 사업내용 :

- 자연휴양림 조성을 위한 입지타당성평가, 환경부 협의, 지정·고시 등 조성계획절차 추진

- 자연휴양림 → 치유의 숲 → 숲속야영장 순으로 복합적인 산림휴양시설 단계적 조성

- 지속적인 숲가꾸기사업 등을 통해 아름답고 건강한 명품 산림으로 조성

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자연휴양림 조성	-	착수	토지매입	휴양림 지정 및 기본설계	조성계획승인 및 실시설계	공사착수	공사추진

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
자연휴양림 조성	입지타당성 조사 및 사전입지조사 추진	정미 도시관리계획 결정 추진 - 분묘이전 보상	산림휴양시설 토지매입(5필지)	자연휴양림 지정 고시 신청

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	21,800	0	18,300	7,730	2,070	2,500	3,000	3,000	3,500
국비	0		0						
도비	7,500		4,875			375	2,250	2,250	2,625
시비	14,300		13,425	7,730	2,070	2,125	750	750	875
민자	0		0						
기타	0		0						

※ 2022년 이월사업(937백만원), 2023년 본예산(1,300백만원)

IV 추진 실적

- 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 약82ha 완료 (76%)
- 자연휴양림 지정을 위한 타당성평가 및 사전입지조사 용역 추진
- 산림휴양시설 도시계획도로 결정 용역 추진

그동안 추진실적 [’22.07.~ ’23.03.]	○ 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 7필지 약10ha
--------------------------------------	--------------------------------

V 문제점 및 대책

- 사업 대상지 진입로 확장 및 노선 변경 등 진·출입 대책 방안 검토 및 관련부서와 협의 필요
- 산림휴양시설 진입도로(도시계획시설) 개설을 위한 공사비 필요
- 토지보상비 7.7억원이 부족한 상황으로 2023년 추경 또는 2024년 본예산에 편성 필요
- 자연휴양림 조성을 위한 국도비 보조금이 2023년부터 지방이양 되어 보조율 변동이 예상되므로, 시비 부담을 줄이기 위해 자연휴양림 관련 절차를 앞당겨서 진행하여야 함
(2023년 휴양림 실시설계 관련 용역비 약 5억원 필요)

VI 향후 계획

- 산림휴양시설 도시관리계획(도시계획도로) 결정 추진
- 자연휴양림 타당성평가 및 사전입지조사 완료 후 지정 신청 추진
- 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 지속 추진

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	박다예(4203)
협조부서	도로과	부 서 장	하태은(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	박성환(4371)

6-13	몽산 입구 공영주차장 조성						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2024	사업비	500백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 면천면 성상리 1012번지 일원

○ 사업기간 : 2023~2024

○ 사업비 : 500백만원

○ 사업내용

- 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공
- 몽산 등산로 인근의 사유지 토지매입
- 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진
- 주차장 조성 공사 착수 및 준공

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	토지매입 및 실시설계	준공		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공영주차장 조성	대상지 선정	공유재산심의 의결	24년 본예산 편성	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	500	0	500	0	0	500	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	500		500			500			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인)
- 사업 대상지 감정평가 착수

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 사업 대상지 선정
--------------------------------------	-------------

V 문제점 및 대책

- 주차장 토지매입은 협의에 의한 취득으로, 토지 감정평가액과 토지소유자의 매도 희망가의 차가 현저히 발생하여 매도할 의사가 없을 경우 사업추진에 어려움이 있음.
- 몽산 입구 주차장 예정지는 자연녹지지역으로, 당진시 도시계획 조례에 따라 5,000㎡ 미만의 주차장을 조성할 경우 최소 도로폭 4m 이상 확보하여야 함.

VI 향후 계획

- 토지매입에 따른 공유재산심의 등 행정절차 추진
- 23년도 추경예산 편성
- 토지매입 및 실시설계용역 발주
- 사업 발주 및 준공

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	이현지(4204)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-14	구절산 등산로 공영주차장 조성						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2024	사업비	1,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 당진시 순성면 봉소리 1120번지 일원
- 사업기간 : 2023~2024
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용
 - 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공
 - 구절산 등산로 인근의 사유지 토지매입
 - 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진
 - 주차장 조성 공사 착수 및 준공

※ 1차 검토의견

- 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 시행규칙 별표3 규정에 따라 체육공원 조성 최소 규모는 1만제곱미터 이상으로 구절산 주변에 대규모의 공원조성은 많은 예산과 시간(행정절차)이 소요되고, 이곳과 1.5km 떨어진 순성면 봉소리 620-29번지 일원에 체육공원이 조성되어 있어 구절산 체육공원 조성은 신중한 검토가 필요함
- 구절산 인근에 기조성된 체육공원에 주민편의시설, 휴게시설 및 야외운동기구 등을 설치하여 체육공원의 기능을 부여

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	토지매입 및 실시설계	준공		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공영주차장 조성	토지 감정평가	토지매입 및 실시설계	준공	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,000		1,000		1,000				
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인)
- 사업 대상지 감정평가 완료 및 토지소유자와의 매매 협의

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 사업 대상지 선정
--------------------------------------	-------------

V 문제점 및 대책

- 주차장 조성 예정지는 구절산 등산로 입구에 위치해 적지로 판단되나, 토지소유자는 주택부지 분할과 진입로 확보 조건으로 매도할 의사를 밝혀 합의점 도출 난항 예상되며,
- 주차장 토지매입은 협의에 의한 취득으로, 토지 감정평가액과 토지소유자의 매도 희망가의 차가 현저히 발생하여 매도할 의사가 없을 경우 사업추진에 어려움이 있음.

VI 향후 계획

- 토지매입 및 실시설계용역 발주
- 사업 발주 및 준공

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이기종(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	이현지(4204)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-15	당진천 천변길 개선
------	------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	4,339백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진천(성북3교-당진하수처리장)

○ 사업기간 : 2022-2026

○ 사 업 비 : 4,339백만원

○ 사업내용 :

- 당진천 시설물 유지보수

- 당진천 산책로 정비

- 당진천 예초작업

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시설물 유지보수	개소	50	10	10	10	10	10
제초작업	회	24	4	5	5	5	5
산책로 개선	km	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시설물 유지보수	2개소	3개소	3개소	2개소
제초작업	-	3회	2회	-
산책로 개선	-	0.3km	0.3km	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,339	0	3,639	369	1,050	820	700	700	700
국비	0		0						
도비	735		635	135	200	100	100	100	100
시비	3,604		3,004	234	850	720	600	600	600
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 당진천 산책로 관목 식재공사 완료
 - 사업비: 19백만원
 - 위 치: 당진천(채운동, 읍내동 일원)
 - 사업량: 수목식재(영산홍) 2,550주
- 당진천 진입로 개설공사 완료
 - 사업비: 74백만원
 - 위 치: 당진천(채운동 일원)
 - 사업량: 보행데크 L=46m, B=2m
- 당진천 계단 난간 보수공사 완료
 - 사업비: 21백만원
 - 위 치: 당진천(농협하나로마트 - 갈산리 마을회관)
 - 사업량: 난간보수 L=74m
- 당진천 하도정비사업 완료
 - 사업비: 147백만원
 - 위 치: 당진천(농협하나로마트 - 갈산리 마을회관)
 - 사업량: 하천 퇴적토 준설 L=2.57km, V=12,878m³

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ’23.03.]	○ 당진천 예초 작업 정비공사(L=5.59km/4회/172백만원) ○ 당진천 산책로 조성공사(L=670m/154백만원)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2023. 08.: 당진천 예초정비공사(상반기) 준공
- 2023. 10.: 당진천 산책로 조성공사 준공
- 2023. 12.: 당진천 유지관리 용역 준공

주관부서	건설과	부 서 장	주성욱(4630)	팀 장	진호현(4650)	담 당 자	최주신(4651) 조정희(4652)
협조부서	하천과	부 서 장	이성남(635-2745)	팀 장	박상용(635-4523)	담 당 자	박기남(635-4536)

6-16	기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비						
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	52.2%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2050	사업비	270,100백만원

I 사업개요 ○ 농업기반시설(용·배수로) 정비사업 - 사업위치 : 당진시 관내 일원 - 사업기간 : 2022. ~ 2050. - 사업비 : 232,120백만원 (연 75억원) - 사업내용 : 미정비 용배수로 정비를 통한 재해예방 및 농업생산력 향상 ○ 농업기반시설(기계화경작로) 확·포장사업 - 사업위치 : 당진시 관내 일원 - 사업기간 : 2022. ~ 2050. - 사업비 : 37,980백만원 (연 30억원) - 사업량 : 기계화경작로 미포장 구간 포장을 통한 농업생산기반 확충							
II 사업목표 [확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
용·배수로 정비사업	km	250	50	50	50	50	50
기계화 경작로 확·포장사업	km	100	20	20	20	20	20
III 사업계획 [추진계획]							
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기			
용·배수로 정비사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공			
기계화 경작로 확·포장사업	본예산 설계 및 착공	본예산 준공 및 추경사업 설계	추경 사업 착공	준공			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	270,100	0	52,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	217,600
국비	0		0						
도비	36,000		10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	26,000
시비	234,100		42,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	191,600
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 용배수로 정비사업 99건 8,599백만원 [57.3km] (설계 완료 및 착공)
- 기계화경작로 확포장사업 20건 1,810백만원 [12.1km] (설계 완료 및 착공)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 용배수로 정비사업 86.1km / 13,027백만원 / 준공 ○ 기계화경작로 확포장사업 17.4km / 2,607백만원 / 준공
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- '23. 7. ~ 12.. : 하반기 설계 및 공사 추진

주관부서	건설과	부 서 장	주성욱(4630)	팀 장	김은상(4640)	담 당 자	김무기(4641)
협조부서	도농촌활력과	부 서 장	최찬재(635-2530)	팀 장	이상호(635-4061)	담 당 자	서한솔(635-2532)

6-17	신평면 거산리 축사악취 해결을 위한 농촌공간정비사업 추진
------	---------------------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	18,450백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 신평면 거산리 114-6 일원

○ 사업기간 : 2023 ~ 2027

○ 사업비 : 18,450백만원(국비 6,750 / 도비 2,025 / 시비 9,675)

○ 사업내용 : 유해시설(축사 등)을 철거 후 해당 공간을 활용하여 생활SOC 시설 구축

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공모사업 선정	-	선정		선정			
축사 철거	-	완료				착공	완료
생활SOC 시설 조성	-	착공					착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
공모사업 선정	선정			
사업비 반영		반영		
기본계획 착수			착수	

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	18,450	0	13,837.5	0	1,350	3,262.5	4,612.5	4,612.5	4,612.5
국비	6,750		5,062.5		675	1,012.5	1,687.5	1,687.5	1,687.5
도비	2,025		1,518.75		202.5	303.75	506.25	506.25	506.25
시비	4,725		3,543.75		472.5	708.75	1,181.25	1,181.25	1,181.25
민자	0		0						
기타	4,950		3,712.5			1,237.5	1,237.5	1,237.5	1,237.5

IV 추진 실적

○ '23년도 사업비 추경 반영('23. 6.)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 토지주 매각 동의서 징구('22. 10.) ○ 예비계획수립 용역 착수('22. 11.) ○ 주민설명회 개최('23. 1.11.) ○ 주민위원회 개최('23. 1.18 / 1.31.) ○ 예비계획 최종 보고('23. 2. 7.) ○ 공모신청서 제출('23. 2.27.) ○ 농식품부 대면평가('23. 3. 9.) ○ 공모사업 선정('23. 3.14.)
--	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 착수('23. 7.)

주관부서	공동체새마을과	부 서 장	정영환(3180)	팀 장	정해일(3181)	담 당 자	김병찬(3184)
------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-18	송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진
------	----------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2025	사업비	비예산

I사업개요

○ 사업위치 : 송산면 상거리(상거리지구 주거형 지구단위계획 : 295,479㎡)

○ 사업기간 : 2023. ~ 2025.

○ 사업내용 : 민간제안 지구단위계획변경(민간사업 제안시 지구단위계획변경)

건폐율(%)		용적율(%)		층수	
변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후
60%이하	60%이하	150%	200%이하	5층하	경관심의 결정

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
민간 제안, 지구단위계획 변경	-	민간 제안, 지구단위 계획변경 병행 추진	행정지원 민간사업 제안 시 지구단위계획 변경				

○ 지구단위 구역내 민간제안(공동주택건설)과 지구단위계획변경 동시 추진으로 공동주택 건설 등을 통한 쾌적한 정주기반 조성

- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 층수 상향, 가로망 정비 등)

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
민간 제안 지구단위계획 변경	민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극 검토하여 공동주택 건설사업 추진			

IV추진실적

○ 송산면 공간 정보 및 기초조사 *2023년 5월말 기준

- 인구: 11,892명(당진시 전체 169,071명, 약7.0%)

- 세대수: 6,334세대

- 교육: 유치원 3 초등학교 3 중학교 1

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 2022.09.16.: 민간 주도의 도시개발사업을 유도하기 위해 공기업과 기초조사, 사업성 분석 등 업무 협의(충남개발공사) ○ 2022.10.05.: 건축과 회의실에서 송산면 소재지 일원 개발 검토(충남개발공사)
V 문제점 및 대책 ○ 당진 동지역, 송악읍, 산업단지 주거단지와의 입지 경쟁력 부족으로 주택건설 사업성 저하로 민간제안 한계 ○ 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 층수 상향)으로 민간사업자 사업성 개선	
VI 향후 계획 ○ 민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극검토 하여 공동주택 건설사업 추진	

주관부서	도시과	부 서 장	이태환(4400)	팀 장	김종필(4425)	담 당 자	이정재(4426)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-19	학교 주변 안전 통학로 조성
------	-----------------

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	82.5%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	5,356백만원

I 사업 개요 ○ 사업명 : 통학로 개선사업 - 사업기간 : 2022~2024 - 사업비 : 총 2,830백만원(특별조정교부금 400백만원, 시비 2,430백만원) - 사업내용 : 탐동사거리 인근 보행환경개선사업 - 8억 (준공) 원당교 하부 교차로 교통사고 잦은 곳 개선사업 - 2.3억(준공) 당진정보고 ~ 당진중학교 보도개선사업 - 18억(추진중) ○ 사업명 : 초등학교 인근 보도 개설사업 - 사업기간 : 2022~2026 - 사업비 : 총 2,526백만원(시비 2,526백만원) - 사업내용 : 초등학교 인근 보도 미 개설지 보도 개설 17개소							
--	--	--	--	--	--	--	--

II 사업 목표 [확인지표]							
단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
통학로 개선사업	개소	3	1	1	1		
초등학교 인근 보도 개설사업	개소	17	4	4	4	3	2

III 사업 계획 [추진계획]				
단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
통학로개선사업	탐동사거리 개선, 원당교하부교차로 준공	당진정보고~당진중학교 보도개선 토지보상완료	당진정보고~당진중학교 보도개선 공사 착공	당진정보고~당진중학교 보도개선 공사 준공
초등학교 인근 보도 개설사업	2023년 대상지 조사	설계 및 공사 착공	공사 추진	공사 준공

[투자계획]									(단위 : 백만원)
재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	5,356	0	5,356	1,500	2,000	750	550	556	0
국비	400		400		400				
도비	0		0						
시비	4,956		4,956	1,500	1,600	750	550	556	
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 03.) 탑동사거리 개선, 원당교 하부교차로 개선 공사 준공
- ('23. 03.) 어린이보호구역 보행자 음성신호기 설치
 - 대덕초, 원당초, 탑동초, 원당교하부교차로, 당진중 인근
- 주민소통(민관협의회 1회, 주민설명회 2회) 실적 포함
- ('23. 06.) 초등학교 인근 보도개설사업 착공 추진
- ('23. 06.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 토지 매입 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(계성초, 신성대학부설유치원) ○ 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(탑동초) ○ 당진시 동지역 보행자길 정비공사 시행 완료(당진초 이면도로개선) ○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 인근 안전가드레일 설치) ○ 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 후문 하천변 도로 변경) ○ 당진시 어린이보호구역 발광형 표지판 설치 사업 시행 완료 서정초,순성초,탑동초,기지초,석문초,삼봉초,당진초,합덕초,성당초,상록초(10개 초등학교 개선) ○ 계성초 후문 이면 도로 개선 완료(1개 초등학교 개선) ○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 정비 공사 시행 완료-원당초, 서정초, 계성초, 당진초 ○ 어린이보호구역 미끄럼방지시설 보강 공사 시행 완료-기지초, 제일어린이집, 송산초, 염마산어린이집 일원 ○ 원당교 하부교차로 개선사업 시행 완료-원당교 하부교차로 개선 및 원당초 어린이보호구역 개선 ○ 탑동초등학교 인근 보행환경 개선사업 시행 착공- 탑동사거리 교통섬 제거 및 탑동초 어린이보호구역 개선 ○ 어린이보호구역 개선사업 추진 중 12월 준공 ○ 초등학교인근 보도개설 사업 1차(신평초) 착공완료, 12월준공 ○ 초등학교인근 보도개설 사업 2차(대덕초, 우강초, 북창초) 착공완료, 12월준공 ○ 당진1동 어린이보호구역 아스콘덧씌우기 사업(소화유치원) 착공완료, 12월준공 ○ 보행자 음성신호기 신설 추진(기지초, 원당초) 12월준공 ○ .탑동사거리 개선, 원당교 하부교차로 개선 공사 23. 3준공 ○ 어린이보호구역 보행자 음성신호기 설치 23. 3준공 ○ 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 토지 매입 완료 23. 6준공
--	--

V 문제점 및 대책

- 학교 통학로 개선사업(보도설치 등)을 위하여 일부 구간 보도 확장부 토지매입이 필요하지만 기존 근린생활시설 등으로 인하여 토지매입 추진 난이
- 대책1 ⇨ 교육청 및 학교와 협의하여 학교부지를 활용한 보도설치 검토추진
- 대책2 ⇨ 교통량을 조사하여 경찰서와 일방통행 지정추진(도로다이어트 적용)

VI 향후 계획

- ('23. 09.) 초등학교 인근 보도개설사업 준공 추진
- ('23. 10.) 당진정보고 ~ 당진중학교 구간 공사 착공

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	박종욱(4380) 정금호(4370)	담 당 자	성두경(4381) 오주원(4372)
------	-----	-------	-----------	-----	------------------------	-------	------------------------

6-20	국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설
------	------------------------

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	201,600백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : 정미면 봉생리 ~ 송악읍 반촌리

○ 사업기간 : 2026 ~ 2035

○ 사업비 : 201,600백만원

○ 사업내용 : L=12.4km, B=20.0m(4차로)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

○ 타당성 조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련

○ 우회도로 건설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	수요조사 제출	-	-	후보사업 확정

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총계	201,600	0	0	0	0	0	0	201,600
국비	164,600		0					164,600
도비	0		0					
시비	37,000		0					37,000
민자	0		0					
기타	0		0					

IV 추진 실적

- ('23.04.) 대전국토관리청 방문(사업설명 및 건의)
- ('23.06.) 국토부 도로정책과 방문(사업설명 및 반영 건의)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.04.]	○ ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 반영 제출(시→도)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) KDI 일괄 예타 미통과(AHP 0.436, B/C 0.44)
- 도시계획도로 및 지방도 633호선을 연계하는 경제성이 높은 노선 선정

VI 향후 계획

- 후보 사업 확정 및 기재부 일괄 예타 수행
- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-21	제2 서해안 고속도로 건설						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2032	사업비	3.6조원

I사업개요

○ 사업위치 : 당진시 송악읍 전대리 ~ 경기도 광명시 가학동

○ 사업기간 : 2024 ~ 2032

○ 사업비 : 3,600,000백만원

○ 사업내용 : L=61.4km(해저터널 L=6,945m), B=23.4m(4차로)

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료			착수	완료	
건설공사	-	착공				착공	추진

○ KDI 사업 적격성 조사 및 우선협상 대상자 선정을 통한 실시설계 추진

○ 수도권과의 접근성 향상 및 지역경제 활성화를 위한 건설공사 조기 착공

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
실시설계 용역	KDI 사업 적격성 조사			적격성조사 완료
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,600,000	0	1,010,000	0	0	10,000	500,000	500,000	2,590,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	3,600,000		1,010,000			10,000	500,000	500,000	2,590,000
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ KDI 적격성조사 추진

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.12.) 한국개발연구원(KDI) 적격성 조사 착수
	○ ('23.01.) 한국개발연구원(KDI) 방문 건의(적격성 조사 적극 검토 및 신속 추진)
	○ ('23.02.) KDI적격성조사 당진시 현장 답사

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

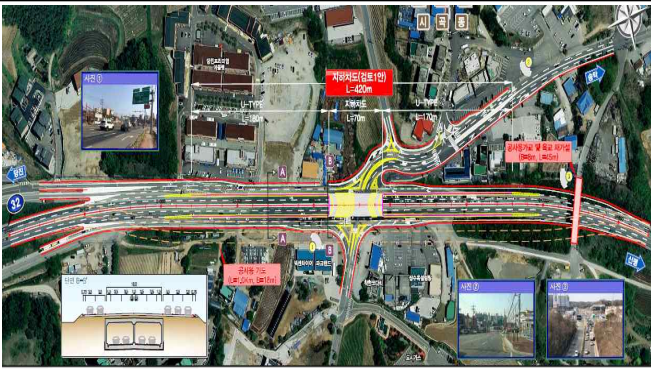
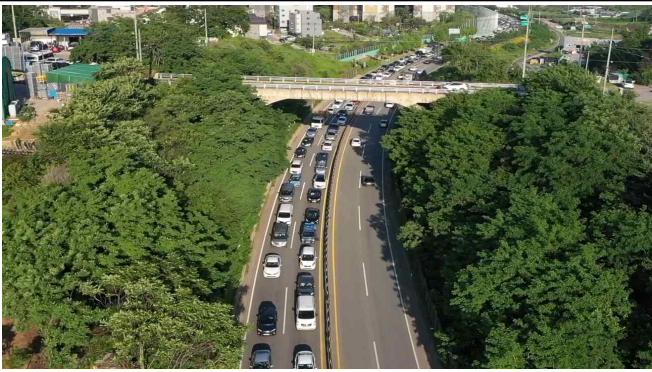
VI 향후 계획

- KDI 적격성조사 완료 및 기재부 민간투자사업 심의
- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-22	시곡교차로 지하차도 건설						
------	---------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	보류	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2025~2030	사업비	35,000백만원

I 사업 개요 ○ 사업위치 : 당진시 시곡동 시곡교차로(종합병원 앞) ○ 사업기간 : 2025~2030 ○ 사업비 : 35,000백만원 ○ 사업내용 : L=420m, B=19m(4차로)	
	
사업위치	현황사진

II

사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
병목지점 개선사업	-	선정				선정	
건설공사	-	착공					착공

○ 국도 병목지점 개선 대상사업 선정

- 행정구역 조정으로 인한 주민 불편 및 피해를 최소화하는 방향으로 주민이 납득 할 수 있도록 충분한 협의 및 주민 공감대 형성

○ 안전하고 편리한 도로 환경 제공을 위한 건설공사 조기 착공

III

사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
병목지점 개선사업	-	-	-	-
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	35,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	25,000
국비	35,000		10,000					10,000	25,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진실적 * 해당사항 없음

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.07.~09.) 행정구역 조정 회의(3회) ○ ('22.09.) 지하차도 건설계획 철회 진정서 접수 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.02.) 시곡3통 마을회관 방문 주민의견 청취(행정구역 조정 반대 의견)
-----------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 그동안 국도 병목지점 개선을 지속적으로 요청하였으나, 동지역 위임국도는 원천 제척 대상으로 미반영
- 우리시에서 관리하는 위임국도로써 시비로 추진하기에 재정부담이 큼
- 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정이 필요(시곡동 → 송악읍)하나 주민반대 집단 민원 발생
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진
(단기) 도시계획도로(구 원용선) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모

VI 향후 계획

- 주민 이해 및 공감대 형성 추진
- (장기) 국도32호 대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진
(단기) 도시계획도로(구 원용선) 조기개설을 통한 우회도로를 확보하여 시곡교차로 교통정체 해소 도모

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-23	삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	15,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 신평면 운정리(삼교호관광지)~신평면 매산리(음섬포구)
- 사업기간 : 2023~2028
- 사업비 : 15,000백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=5.6km, B=8.0m(2차로)



사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본 설계 용역	-	완료			착수	완료	
실시 설계 용역	-	완료				착수	완료
보상 추진(재결)	-	수용재결				협의보상	협의보상
건설공사	-	착공					착공

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기본 설계 용역				2024년 본예산 수립

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	15,000	0	6,100	0	0	100	3,000	3,000	8,900
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	15,000		6,100			100	3,000	3,000	8,900
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23. 03.) 시장님 사업추진 현황 보고

- 해안도로 특성상 주변 사업과 연계하여 중장기적으로 검토해야 하는 사안으로 주변 사업과 연계될 시점에 추가 검토 필요

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출 ○ ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출(부결) - 문화관광과, 기후환경과 등 관련 부서와 협의하여 보행개선 뿐만 아니라 해안도로, 데크 등과 이어져 있는 해안도로의 특수성을 고려한 기본설계 필요
--	--

V 문제점 및 대책

- 해안도로 특성에 따라 주변 관광지와 연계될 수 있도록 중장기적인 검토 필요
- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지남
- 도비 지원 방안 마련

VI 향후 계획

- 공약사항 주변 사업 추진 계획 진행 시 중장기적 검토하여 사업 추진 계획 수립
- 2024년 본예산에 기본설계용역 확보

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	박성환(4371)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-24	시곡교차로~수청동 도로 개통						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	3,747백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 시곡동 77-3번지(도) ~ 수청동 129-5번지(답)
- 사업기간 : 2019 ~ 2024년
- 사업비 : 3,747백만원
- 사업내용
 - 단절구간 도로 개설 L=0.55km, B=7.0m(2차로)
 - 기존 도로 확장 L=3.0km, B=7.0m(2차로)
- 추진배경 : 단절되어 있는 도시계획도로 소로 3-903호선을 연결하여 인근 주민들의 교통 편의 증대 및 국도32호선 교통체증 해소

사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미개설구간 연결	-	준공	공정률 20%	준공			
기개설구간 정비	-	준공	실시설계 완료	착공	준공		

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
미개설구간 연결	도로개통공사 재착공	공사 계속 추진	공사 계속 추진	공사 준공
기개설구간 정비	실시설계 추진	실시설계 추진	실시설계 추진	실시설계 완료 및 공사 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,747	1,747	2,000	100	1,000	900	0	0	0
국비	0		0						
도비	400	400	0						
시비	3,347	1,347	2,000	100	1,000	900			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23. 04.) 미개설구간 연결 공사 동절기 공사중지 해제 및 재착공
- ('23. 06.) 토공 작업 등 공사 계속 추진 공정률(30%)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.3.]	○ ('22.07.) 단절구간 공사 착공 ○ ('22.11.) 기개설 구간 확장공사 실시설계용역 발주
-------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('23. 10.) 기개설구간 정비 실시계획인가 완료
- ('23. 11.) 기개설구간 정비 공사 발주
- ('23. 12.) 미개설구간 연결 공사 완료

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	고남희(4374)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-25	시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장						
------	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	50%
사업성격	계속	사업주체	광역	사업기간	2026~2035	사업비	110,000백만원

I 사업 개요

- 사업위치 : 면천면 성하리 ~ 채운동
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 110,000백만원
- 사업내용 : L=8.3km, B=20.0m(4차로)



사업위치

II 사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30)	-	반영					반영

- 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영을 위한 타당성조사 용역 추진
- 시도1호선 확포장을 위한 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30)	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
국비	0		0						
도비	66,000		0						66,000
시비	44,000		0						44,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.04.) 지방도 노선조정(안)(시도1호→지방도609호) 승격 의견 조회(도→시)
- ('23.05.) 지방도 노선조정·변경 승인 신청(충남도→국토부)
- ('23.06.) 충청남도 방문(국토부 승인 협조 건의)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.09.) 민선8기 충청도지사 당진시 방문 건의 ○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 지방도 승격 노선(안) 충청남도 방문 건의
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- ('23.07.) 지방도 노선조정·변경 고시

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-26	합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설
------	-----------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2027	사업비	33,200백만원

I

사업개요

■ 시도7호선 확장(4차로)

○ 사업위치 : 시도3호(서야고) ~ 국지도70호(우강 대포리 마을회관)

○ 사업기간 : 2023~2027

○ 사업비 : 10,000백만원

○ 사업내용 : 도로 확장 L=2,930m, B=20.0m(4차로)

■ 중로1-308호선 개설(4차로)

○ 사업위치 : 국지도70호(우강 송산리) ~ 합덕수리박물관

○ 사업기간 : 2019~2027

○ 사업비 : 17,500백만원

○ 사업내용 : 도로 개설 L=2,792m, B=20.0m(4차로)

■ 대로3-303호선 확장(4차로)

○ 사업위치 : 합덕수리박물관 ~ 서야고

○ 사업기간 : 2019~2026

○ 사업비 : 5,700백만원

○ 사업내용 : 도로 개설 L=583m, B=25.0m(4차로)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시도7호선 확장	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	70 (공사착수)
중로1-308호선 개설	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	70 (공사착수)
대로3-303호선 확장	%	100 (공사준공)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	100 (공사준공)

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
시도7호선 확장	실시설계용역 발주	실시설계 추진 환경/재해 영향평가용역 발주	관련 인허가 추진, 주민의견 청취 및 결과 반영	실시설계용역 완료
중로1-308호선 개설	"	실시설계 추진	"	"
대로3-303호선 확장	"	실시설계 추진	"	"

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,200	1,880	20,115	4,220	470	2,120	2,100	11,205	11,205
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	33,200	1,880	20,115	4,220	470	2,120	2,100	11,205	11,205
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23. 06.) 시도7호선, 합덕 중로1-308호선, 대로3-303호선 측량, 토질조사 및 설계 추진(공정률35%)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.10.) 중로1-308호선 보상비 42.2억원 확보(추경2회) ○ ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출 ○ ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출 ○ ('23.03.) 시도7호선, 합덕중로1-308호선, 대로3-303호선 용역 발주
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지난
- 도비 지원방안 마련

VI 향후 계획

- ('23. 07.) 주민설명회 개최
- ('23. 08.) 관련 인허가 신청
- ('23. 12.) 실시설계용역 준공

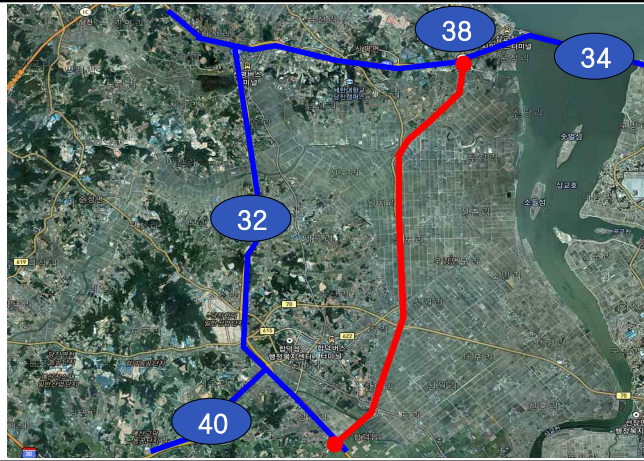
주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	오주원(4372)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-27	국도 40호선(합덕~신평) 개설						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	150,000백만원

I 사업개요

- 사업위치 : 합덕읍 신석리(국도32호) ~ 신평면 운정리(국도38호)
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 150,000백만원
- 사업내용 : L=11.3km, B=20.0m(4차로)



사업위치



노선도

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

- 타당성조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
- 국도40호(합덕~신평) 개설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

III 사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성 조사 용역	용역추진			
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	수요조사 제출	-	-	후보사업 확정

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
국비	150,000		0						150,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- ('23.04.) 대전지방국토관리청 도로계획과 방문(사업설명 및 우선순위 건의)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수 ○ ('23.03.) 국도 지선 수요조사 제출(시→도→국토관리청)
-----------------------------------	---

V 문제점 및 대책

- 국도32호선(합덕~신평)이 나란히 인접하여 불리한 요소로 작용
- 기존노선(지방도622호선, 시도7호선)을 활용한 경제성이 높은 노선 선정

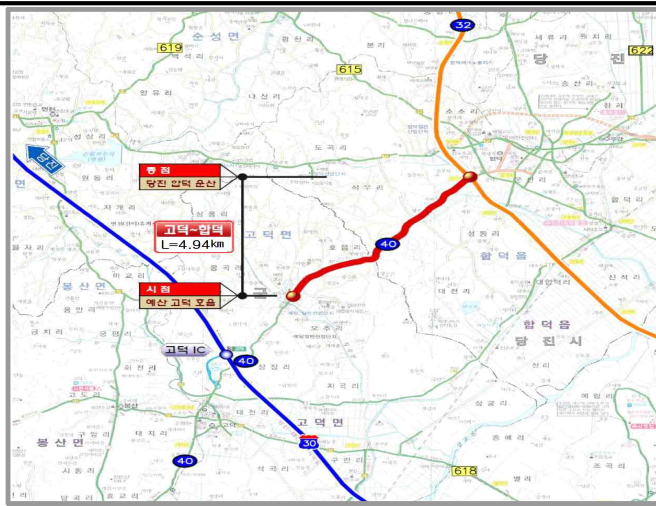
VI 향후 계획

- 道와 연계한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-28	국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장						
------	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2022~2030	사업비	47,200백만원

I 사업 개요 ○ 사업위치 : 합덕읍 운산리(국도32호) ~ 예산군 고덕면 호음리 ○ 사업기간 : 2022~2030 ○ 사업비 : 47,200백만원 ○ 사업내용 : L=4.94km, B=20.0m(4차로)	
	
사업위치	현황사진

II

사업 목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료	착수		완료		
건설공사	-	착공				착공	추진

III

사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
실시설계 용역	설계 추진			
건설공사	-	-	-	-

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	47,200	0	16,200	200	500	500	5,000	10,000	31,000
국비	47,200		16,200	200	500	500	5,000	10,000	31,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

○ ('23.05.) 노선계획(안) 공람(05.17.~ 06.07.) 및 주민 설명회(05.25.)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ ('22.08.) 착수보고 ○ ('22.12.) 노선계획 관계기관 협의 ○ ('23.01.) 설계자문(착수단계) ○ ('23.02.) 설계VE(노선선정)
--------------------------------------	---

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

○ 공사 조기 착공을 위한 건의 활동 전개

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	이영필(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-29	면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진
-------------	---

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	40%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	800백만원

I사업개요

○ 사업위치 : 송산면 소재지~송산 산단 이주단지(시도 17호선)

○ 사업기간 : 2022~2024

○ 사업비 : 총 800백만원(시비 800백만원)

○ 사업내용 : 보도 개설 L=3km, B=1.5~2.0m

1단계 - 유곡리~무수리 방면 1km,

2단계 - 무수리~삼월리 방면 1km,

3단계 - 삼월리~상거리 면소재지 방면 1km

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	km	3	1	1	1		

III사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	1단계(유곡리~무수리) 공사 추진 1km	1단계(유곡리~무수리) 공사 준공 1km	2단계(무수리~삼월리) 설계 및 공사착공 1km	2단계(무수리~삼월리) 설계 및 공사준공 1km

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	800	0	800	200	300	300	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	800		800	200	300	300			
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 시도17호선 보도개설공사 1단계 추진
- 주민설명회 1회 포함
- 2023. 6. 1단계(유곡리 ~ 무수리) 공사 준공

그동안 추진실적 [‘22.07.~ ‘23.03.]	○ 2022. 09. : 주민설명회 실시(송산면, 무수리, 유곡리 이장) ○ 2022. 11. : 공사 착공 (1단계 유곡리~무수리)
--------------------------------------	--

V 문제점 및 대책 * 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 2023. 6.~7. : 2단계(무수리 ~ 삼월리) 설계 및 공사 착공

주관부서	도로과	부 서 장	고동주(4350)	팀 장	박종욱(4380)	담 당 자	성두경(4381)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-30	복합환승센터 구축						
------	-----------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체/민간	사업기간	2023~2028	사업비	12,300백만원

I

사업개요

○ 사업위치 : (가칭)당진합덕역 인근(합덕읍 도리 일원)

○ 사업기간 : 2022-2028

○ 사업비 : 123억원

○ 사업내용 : 복합환승센터(터미널, 환승주차장, 상업시설 등) 구축(30,000㎡)

- 인접 시·군(서산, 태안) 및 당진시 관광지를 잇는 원활한 연계교통시설 제공

○ 환승센터 입지선정

구분		위치	주요 환승수단
환승센터	서해선 복선전철 (가칭)당진합덕역	합덕읍 도리 일원	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선), 전철, DRT
	당진터미널	수청동	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선)

※ 출처 : 당진시 도시교통 정비 기본 및 중기계획(당진시 고시 제2019-180호)

II

사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26~'30)	-	국가계획 반영		타당성 조사 및 개발계획 수립		개발계획 승인 및 지정	국가계획 반영

III

사업계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
타당성평가 및 개발계획 수립	-	타당성평가 및 개발계획 용역 착수	타당성평가 및 개발계획 용역 추진	타당성평가 및 개발계획 용역 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기 중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	12,300	0	300	0	300	0	0	0	12,000
국비	6,000		0						6,000
도비	150		150		150				
시비	6,150		150		150				6,000
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 충남도 제1회 추경예산 반영(도비 150백만원)

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 용역 추진을 위한 충남도 협의(용역비 집행 및 사업내용 등)
--------------------------------------	-------------------------------------

V 향후 계획

- 타당성평가 및 개발계획 수립 용역 발주(PQ)

VI 기대 효과

- 환승 시간 단축으로 대중교통 경쟁력 확보 및 이용자 편의 증가
- 이용자 중심의 최적 환승 동선 계획으로 환승 편의 획기적 개선
- 환승시설을 지역 성장의 거점으로 일자리 창출, 주민복지 증대 등 기대
- 솔뫼성지, 합덕제, 삽교천 등 시니어 시티투어 운영 기대

주관부서	교통과	부 서 장	구봉회(4520)	팀 장	이상문(4521)	담 당 자	이강민(4524)
협조부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	손명주(3590)	담 당 자	오승섭(3593)
협조부서	도시과	부 서 장	이태환(4400)	팀 장	박정래(4401)	담 당 자	김정환(4404)
협조부서	도로과	부 서 장	하태은(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	오주원(4372)

6-31	기지사 버스터미널 신설						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	1,510백만원

I 사업개요							
○ 사업위치 : 당진시 송악읍 기지시리 155-94 일원							
○ 사업기간 : 2023~2025							
○ 사업비 : 1,510백만원							
○ 사업내용 : 승객이 이용하기 편리한 접근성 및 다른 교통수단과 쉽게 연계가 가능한 기존 기지사 버스정류장 인근에 버스터미널 신설							

II 사업목표							
[확인지표]							

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025
기지사 버스터미널 신설	-	준공	2023년 본예산 반영	타당성 조사 및 개발계획 수립	토지 및 건물 매입	터미널 신축 및 운영

III 사업계획							
[추진계획]							

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
기지사 버스터미널 신설	-	2023년 추경예산 반영 (사업 구분 및 증액)	타당성 조사 및 개발계획 수립	-

[투자계획]	(단위 : 백만원)
--------	------------

재원	총계	기투자	임기 중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,510	0	1,510	0	60	1,000	450	0	0
국비	0		0						
도비	30		30		30				
시비	1,480		1,480		30	1,000	450		
민자	0		0						
기타	0		0						

IV 추진 실적

- 기지시 버스터미널 신설 용역 2023년 본예산 요구
- 2022년 제3차 용역과제 심의 완료

그동안 추진실적 ['22.07.~ '23.03.]	○ 2023년 본예산 60백만원 반영(도 30, 시 30)
--------------------------------------	----------------------------------

V 향후 계획

- 타당성조사 및 개발계획 수립 용역 발주

VI 기대 효과

- 편리한 대중교통 이용환경 조성을 통한 정주 여건 개선
- 버스터미널 신축을 통한 교통혼잡 해소 등 주행환경 개선

주관부서	교통과	부 서 장	구봉희(4520)	팀 장	정재완(4540)	담 당 자	김범석(4541)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-32	산업단지 환경감시기구 설치
------	----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 사업 개요

- 명칭 : 환경관리사업소(환경지도1·2팀)
 - 위치 : 당진시 송악읍 부곡공단4길 53-13 당진근로자종합복지관
 - 업무 : 환경오염물질 배출시설 사업장(공장)·배출업소 지도점검, 민간환경감시기구 운영, 미세먼지, 환경오염물질 측정 및 분석, 예방감시사업 등
- ⇒ 환경문제 발생 후 단속하는 방식에서 벗어나 문제 발생 전 예방을 통해 환경오염 최소화

II 사업 목표

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경관리사업소 신설 및 운영	신설 여부	신설 및 운영	신설	지속 운영			

III 사업 계획

[추진계획]

단위사업	1분기	2분기	3분기	4분기
환경관리사업소 신설 및 운영	지속 운영			

IV 추진 실적

- '시민 행복·경제도시 당진'구현을 위한 조직개편 완료('22.8.8.)
 - '환경관리사업소'신설 : 환경오염 등 문제 발생 전 사전 예방(7명 배치)
 - (주요업무)
 - 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 환경분야 특별사법경찰 업무수행
 - 환경오염피해 배상책임·구제 및 대기·수질 배출부과금 부과 등

V 문제점 및 대책

* 해당사항 없음

VI 향후 계획

- 환경오염에 대한 사전 예방 행정을 통해 환경오염 감소 및 인식 개선 추진
- 산업단지 내외 사업장에 대한 법적 절차 이행 안내 및 사전 관리체계 강화

주관부서	자치행정과	부서장	김지환(3231)	팀장	곽신근(3240)	담당자	이명희(3241)
협조부서	환경관리사업소	부서장	박재근(3750)	팀장	원영미(6760)	담당자	김홍희(6751)
