

6-1	면천권역 도시가스 공급 추진
-----	-----------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2022~2024	사업비	3,200백만원

I 추진배경

- 매년 연료비 상승 부담에 따른 면천권 지역주민 도시가스 공급 요구
- 기존 LPG보다 비교적 저렴하고 안전한 도시가스 공급을 통한 주거환경개선 추진

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
면천권역 도시가스 공급	세대	350			350		

III 사업개요

- 사업위치 : 면천면 문봉리, 성상리 일원
- 사업기간 : 2022~2024
- 사업비 : 3,200백만원
- 사업내용 : 면천권 350세대 도시가스 공급, 태영세라믹~면천면사무소 구간 약 8km 배관 공사
 - 면천권역 내 연료전지사업 등 대규모 도시가스 소비처 확보 필요
 - 면천권 도시가스 보조사업조례 검토 : 조례 적용 불가(세대당 370만원 지원 필요)



사업위치

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
면천권역 도시가스 공급	대규모 도시가스 소비처 확보 도시가스 보조사업조례 개정		면천권역 도시가스 공급 추진		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,200	0	3,200	0	0	3,200	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,600		1,600			1,600			
민자	1,600		1,600			1,600			
기타	0		0						

V 추진 실적

- 면천권 도시가스 공급을 위한 도시가스 보조사업조례 개정 검토
 - 현행 세대당 200만원 지원 → 370만원 지원으로 상향 조정 필요
 - 미래엔서해에너지 권역별 도시가스 보조사업 조례 비교 검토(당진, 서산, 예산, 홍성, 태안)
 - 서산시 도시가스 보조사업조례 개정 착수(세대당 지원금액: 200만원 → 300만원)
 - 면천면 도시가스 수급자 추가 조사를 통해 100M당 5세대 이상 확보 추진
- 미래엔서해에너지 권역별 도시가스 보조사업 조례 현황

지역구분	지원대상 (100m당 공급세대)	세대당 지원금액	공사비 지원비율	최근개정일
당진시	5세대 이상~39세대 이하	200만원	50%	21.5.14.
서산시	5세대 이상~39세대 이하	200만원	70%	20.2.28.
예산군	5세대 이상~39세대 이하	200만원	70%	19.1.01.
홍성군	5세대 이상~39세대 이하	200만원	70%	19.2.28.
태안군	39세대 이하	200만원	70%	19.6.03.

VI 문제점 및 대책

- 대규모 도시가스 소비처 확보 불가 시 도시가스 보조사업조례 개정을 통한 도시가스 공급 검토
 - (현행) 도시가스배관 100M당 5세대이상, 세대당 200만원 지원
 - (개정) 도시가스배관 100M당 5세대이상, 세대당 370만원 지원

VII 기대 효과

- 매년 상승하는 연료비에 대한 지역주민 부담완화 및 주거환경개선
- LPG보다 비교적 안전한 도시가스 공급을 통한 가스사고 사전 예방

주관부서	지역경제과	부 서 장	한영우(4011)	팀 장	이준행(4045)	담 당 자	최진영(4046)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-2	생활권 중심 미세먼지 저감 대책 수립 및 이행						
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	67,270백만원

I 추진배경

- 시민의 건강 보호를 위해 세분화된 실행계획으로 종합적이고 지속적인 관리 필요
- 우리시 지역 특성에 맞는 분야별 맞춤형 미세먼지 저감 대책 마련

II 사업목표

[확인지표]

단위사업		단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		1식	이행	수립	이행			
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	개소	2개소	완료	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	개소	13개소	시범운영	시민공개			

III 사업개요

- 「당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획」 수립
 - 사업기간 : 2021.05.~2022.10.
 - 사업비 : 191백만원(충남 서북부 미세먼지 대응 행정협의회 공동사업비로 추진)
 - 사업내용
 - 미세먼지로 인한 시민 체감 정책 추진을 위한 선제적 대응 체계 마련
 - 지역별 특성에 맞는 맞춤형 미세먼지 개선방안 수립 등
 - ※ 충남 서북부 미세먼지 대응 행정협의회 회원 : 당진, 천안, 아산, 서산
- 신뢰성 있는 대기환경 정보 제공을 위한 측정망 구축 및 시범운영
 - 사업기간 : 2022.08.~
 - 사업내용
 - 대기측정망 확충 및 마을대기측정망 검증을 통한 생활밀착형 대기정보 제공
 - 국가측정망 확충 : 2개소(총 4개소), 마을대기측정망 : 13개소

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업		2022	2023	2024	2025	2026
당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획 수립		수립	이행			
대기환경 정보제공 확대	국가측정망	완료(2개소)	정상운영(4개소)			
	마을대기 측정망	시범운영(13개소)	시민공개			

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	67,270	14,486	47,147	5,551	10,399	10,399	10,399	10,399	5,637
국비	30,584	8,129	19,376	3,208	4,042	4,042	4,042	4,042	3,079
도비	5,322	943	4,152	380	943	943	943	943	227
시비	31,364	5,414	23,619	1,963	5,414	5,414	5,414	5,414	2,331
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

① 「당진시 미세먼지 지원 및 저감 관리방안 계획」 수립

- ('21.05.06.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 시행
- ('21.07.08.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 착수보고회
- ('21.12.24.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 공정보고회
- ('22.07.26.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 중간보고회
- ('22.09.30.) 충남서북부 미세먼지 인벤토리 및 관리체계 연구용역 실무회의

② 신뢰성 있는 대기환경 정보 제공을 위한 측정망 구축 및 시범운영

- ('21.01.) 당진화력 대기측정망 운영기관 변경(당진화력 ⇨ 충남연구원)
- ('21.02.) 충청남도 마을대기측정망 시범운영(2023년 시민공개 예정)
- ('21.04.) 신규 국가대기환경측정망 2개소 설치 평가위원회 개최
- ('21.07.) 신규 국가대기환경측정망 2개소 물품 무상대부(당진시 ⇨ 충남보건환경연구원) 및 시험가동
- ('22.08.) 신규 국가대기환경측정망 2개소 정상가동 및 시민공개 (4개소 정상운영)

VI 문제점 및 대책

- 미세먼지 저감을 위한 미세먼지 저감관리방안 계획 및 이행에 따른 전부서 적극 이행 협조

VII 기대 효과

- 지역 특성과 분야별 맞춤형 계획으로 종합적이고 지속적인 관리를 통한 미세먼지 저감으로 시민의 건강 보호

주관부서	기후환경과	부 서 장	김응열(6560)	팀	장	박경서(6575)	담 당 자	함혜은(6576)
------	-------	-------	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

6-3	친환경차 보급 및 충전 인프라 확대						
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	22%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	121,750백만원

I 추진배경

- 저탄소·친환경 전환을 위한 전기·수소차 등 친환경차 보급 및 편리한 충전 여건 조성
 - 친환경차 보급 : '21년까지 1,193대
 - 충전인프라 구축 : (전기)'21년까지 43기 (수소) 2개소

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
친환경차 보급 확대	대	5,859	883	1,076	1,200	1,300	1,400
충전 인프라 확대	개소	86	45	53	64	75	86

III 사업개요

① 친환경차 보급 확대

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 97,685백만원
- 사업규모 : '26년까지 5,859대
- 사업내용 : 친환경자동차 구매 지원 차종 확대 및 보급

② 친환경차 충전 인프라 구축 유도 및 확대

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업규모 : (전기) 공용급속 80기 (수소) 6개소
- 사업내용
 - 친환경차 충전 인프라 구축을 통한 편리한 충전 여건 조성
 - 관련법률 개정에 따른 전기차 충전기 의무설치로 충전시설 구축 유도 및 확대

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
친환경차 보급	883대	1,076대	1,200대	1,300대	1,400대
충전 인프라 확대	45개소	53개소	64개소	75개소	86개소

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	121,750	24,063	97,687	19,043	19,661	19,661	19,661	19,661	0
국비	63,120	12,588	50,532	9,952	10,145	10,145	10,145	10,145	
도비	21,497	4,501	16,996	3,075.6	3,480	3,480	3,480	3,480	
시비	37,133	6,974	30,159	6,015	6,036	6,036	6,036	6,036	
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

① 친환경차 보급 확대

○ 그동안 전기자동차 보급현황

구분	계	`12년	`13년	`14년	`17년	`18년	`19년	`20년	`21년	`22년 9월
승용	1,523	50	30	20	9	56	147	289	357	566
화물	366	-	-	-	-	-	-	60	100	205
버스	9	-	-	-	-	-	3	3	2	1
합계	1,898	50	30	20	9	56	150	352	459	772

○ 그동안 수소연료전지차 보급현황

구분	계	`16년	`18년	`19년	`20년	`21년	`22년 9월
승용	110	1	1	18	12	35	43
버스	1	-	-	-	-	-	1
합계	111	1	1	18	12	35	44

※ 수소차 민간 보급사업은 2019년부터 보급

② 친환경차 충전 인프라 구축 유도 및 확대

○ ('22.前): 전기자동차 43기 및 수소충전소 2기 구축 운영

○ ('22.02.) 친환경자동차법 개정에 따른 전기차 충전구역 의무대상 알림

○ ('22.03.) '22년 환경부 공용급속충전시설 설치사업 수요대상지 제출 (1개소 4기 선정)

○ ('22.09.) 공공시설 전기차 충전구역 의무설치 대상 수요조사 (약 100여개)

VI 문제점 및 대책

- (문제점) 「친환경자동차법(개정 `22.1.25. / 시행 `22.1.28.)」 개정에 따른 `23.1.27.까지 공공건물 전기 충전기 설치 의무화에 따른 충전기 설치 예산확보 필요
- (대 책) 민간전기차 충전업체와 전기자동차 충전기 설치 및 운영관리협약(2022. 11. 08. 예정) 등을 통한 시예산 절감 및 법정 의무기한 충족 및 시민들의 불편함 해소 기대

VII 國・道 협 조 필요 사항

- 「친환경자동차법」 개정에 따른 공공기관 및 공공시설에 대한 충전기 설치기간 유예 연장
- 친환경자동차 보급 관련 지속적인 국비 지원

VIII 기대 효과

- 대기오염물질과 온실가스 배출이 없는 친환경차 보급을 통한 대기환경 개선 및 탄소중립 달성

주관부서	기후환경과	부 서 장	김응열(6560)	팀 장	박경서(6575)	담 당 자	함혜은(6576)
협조부서	전 부 서	부 서 장	-	팀 장	-	담 당 자	-

6-4	삽교호·석문호 담수호 수질개선						
-----	------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	광역시	사업기간	2023~2030	사업비	250백만원

I 추진배경

- 삽교호 수질오염총량관리제는 3개시(당진, 천안, 아산)만 시행하고 있어 미시행지역(홍성, 예산, 청양)의 총량제 참여로 효과적이고 안정적인 수질개선이 필요함
- 석문호 유역은 비점오염원이 50% 이상을 차지하고 있어 비점오염원 관리를 통한 수질개선이 효율적임

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	-	총량제 확대	확대필요건의 (시→도)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약	기본계획 착수(도)	기본계획수립 및 목표수질 설정 완료	시행계획착수 (당진시)
석문호 비점오염원 관리지역 지정	-	관리지역 지정	지정필요건의 (시→도)	지정요청 (시→도)	타당성조사완료 (당진시)	지정요청서 접수 (시·도·환경부)	지정·고시 및 관리대책 수립

III 사업개요

- 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행
 - 사업위치 : 삽교호 유역(6개시·군) ※ 당진·천안·아산·홍성·예산·청양
 - 사업기간 : 2026.~2030
 - 사업비 : 100백만원(국 70, 도 9, 시 21)
 - 사업내용
 - 삽교호 수질오염총량관리제 확대 요청 및 협의
 - 삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행에 따른 시행계획 수립
- 석문호 비점오염원 관리지역 지정
 - 사업위치 : 석문호 유역(213.6km²) ※ 당진시 구역
 - 사업기간 : 2024~2030.
 - 사업비 : 150백만원(도 75, 시 75)
 - 사업내용
 - 비점오염원 관리지역 지정 관련 타당성 조사
 - 관리지역 지정 요청서 접수
 - 관리지역 지정 고시

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
삽교호 수질오염총량관리제 확대 시행	확대 필요성 건의 (시→道)	삽교호 6개 시·군, 환경부 협약	기본계획 착수 (道)	기본계획수립 및 목표수질 설정 완료	시행계획착수 (당진시)
석문호 비점오염원 관리지역 지정	지정 필요성 건의 (시→道)	지정요청 (시→道)	타당성 조사 완료 (당진시)	지정요청서 접수 (시→道→환경부)	지정·고시 및 관리대책 수립

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	250	0	250	0	0	150	0	100	0
국비	70		70					70	
도비	84		84			75		9	
시비	96		96			75		21	
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.08.11.) 금강 중권역 이행평가 물환경관리협의회 회의 시 총량제 확대 의견 제출
- ('22.09.19.) 道 비점오염원관리 기본계획 중간보고 시 지정 우선순위 반영 및 지정요청
- ('22.10.11.) 道 비점오염원관리 기본계획 용역사 협의(우선순위 반영 방안 협의)
- ('22.10.12.) 충남연구원 물환경연구센터 협의(총량제 확대 방안 협의)

VI 문제점 및 대책

- 삽교호 수질오염총량제 확대는 흥성, 예산, 청양의 협조가 필요함
- 석문호 비점오염원 관리지역 지정은 道 계획에 우선순위에서 포함되어야 가능

VII 國·道 협 조 필요 사항

- 道 주도의 흥성, 예산, 청양 삽교호 총량제 시행 동의 및 환경부 협약
- 석문호 유역이 비점오염원 관리지역 지정(道 계획)에 석문호 선순위 반영

VIII 기대 효과

- 현재 시행되고 있는 삽교호 총량제는 삽교호 유역 중 일부 지역만 시행하고 있어 확대 시행에 따른 효과적인 수질개선과 안정적인 수질을 유지
- 석문호 유역 비점오염원관리지역 지정을 통해 석문호의 주요오염원인 축산계와 토지계의 적절한 관리를 통한 수질개선 기대

주관부서	기후환경과	부 서 장	김응열(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	문은호(6582)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-5	산업단지 수질오염사고 예방을 위한 완충저류시설 설치						
-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2027	사업비	171,000백만원

I 추진배경

- 「물환경보전법」제21조의4(완충저류시설의설치·관리)에 따라 전체 산업단지 내 완충저류시설 의무설치
- 「사회기반시설에 관한 민간투자법」개정에 따라 민간투자사업 대상이 포괄주의로 변경됨에 따라 완충저류시설 사업도 민간투자사업으로 추진 가능

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완충저류시설 설치	-	착공	환경청과 사전협의	사업계획 신청	사업시행자 지정	실시설계 및 계획 승인	착공

III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 8개 산업단지 중 3개 산단
- 사업기간 : 2023~2027
- 사업비 : 시비부담액(경상) : 611억원, 연간 30.55억원(20년간)
(시설) 157,000백만원 (국 70%, 시 30%) ※ 내역 : 사업비+건설이자+사업수익
(운영) 14,000백만원(20년간) (시 100%)
- 사업내용 : 차집시설 및 완충저류시설 설치

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
완충저류시설 설치	환경청과 사전협의	사업계획 신청	사업시행자 지정	실시설계 및 계획 승인	착공

- 산업단지 완충저류시설 설치사업(BTL사업)
 - 2022년 금강유역환경청과 사전협의(BTL사업 확정 및 사업비 부분)
 - 2023년 사업계획 신청(시→도→환경청→환경부)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
국비	109,900		0						109,900
도비	0		0						
시비	61,100		0						61,100
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.10.19.) 전국 완충저류시설 설치사업 추진 현황 보고

VI 문제점 및 대책

- 대규모 재원 소요사업 및 사업추진 방식 선정 어려움
- 재정 여건을 고려하여 연차적 투자 및 타 지자체 사례 분석 검토

VII 國·道 협조 필요 사항

- 국비지원 필요

VIII 기대 효과

- 산업단지 내 화재·폭발·누출 등으로 환경피해가 발생할 때 유출되는 유해물질을 완충저류시설로 유입하여 처리 후 방류하는 것으로 수질오염 방지 가능

주관부서	기후환경과	부 서 장	김응열(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	손보라미(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-6	생태하천 복원사업 추진						
-----	--------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	11.7%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2017~2026	사업비	73,423백만원

I 추진배경

- 수질오염, 건천화, 직강화, 구조물 설치 등에 의해 훼손된 하천의 수생태계 건강성 회복 필요
- 삽교호 및 석문호로 유입되는 지류하천인 남원천·시곡천 생태하천복원사업을 통한 담수호 수질개선 요구

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
남원천 생태하천 복원사업	-	준공	착공	공정률 30%	공정률 60%	준공	-
시곡천 생태하천 복원사업	-	준공	기본계획 수립	착공	공정률 30%	공정률 60%	준공

III 사업개요

1) 남원천 생태하천복원사업

- 사업위치 : 순성면 신포천 합류점 ~ 신평면 오봉천 합류점
- 사업기간 : 2017.01 ~ 2025.12.
- 사업비 : 45,351백만원(국2,300 도 20,375 시 22,676)
- 사업내용 : 생태하천 조성 L=9.5km

2) 시곡천 생태하천복원사업

- 사업위치 : 시곡동 윗구물천 종점 ~ 원당동 당진천 합류점
- 사업기간 : 2021.01 ~ 2026. 12
- 사업비 : 28,072백만원(도 14,036 시 14,036)
- 사업내용 : 생태하천 조성 L=4.0km

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
남원천 생태하천 복원사업	공사착공	공정률 30%	공정률 60%	공사준공	
시곡천 생태하천 복원사업	기본계획수립	공사착공	공정률 30%	공정률 60%	공사준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	73,423	12,394	61,029	8,966	19,850	24,707	7,506	0	0
국비	2,300	2,300	0						
도비	34,411	4,622	29,789	5,983	9,200	10,853	3,753		
시비	36,712	5,472	31,240	2,983	10,650	13,854	3,753		
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- 2022. 07. 01. : 시곡천 주민설명회 개최(당진1동,당진3동,송산면)
- 2022. 07. 12. : 남원천 주민설명회 개최(순성면)
- 2022. 07. 20. : 남원천 편입토지 분할측량 실시
- 2022. 09. 15. : 남원천 농지전용 및 하천구역 관련 협의(충남도청)
- 2022. 10. 05. : 시곡천 생태하천 복원사업 기본설계 검토
- 2022. 10. 13. : 남원천 농지전용 관련 협의(농림축산식품부)

VI 문제점 및 대책

- 하천정비기본계획 수립, 기술심의 등 행정절차 이행에 장기간 소요(사업지연)
- 철저한 용역 관리, 사전 준비를 하여 계획된 일정 안에 절차 마무리

VII 國·道 협조 필요 사항

- 연차별 도비 지원 필요

VIII 기대 효과

- 자정능력 개선에 따른 오염원 적정 처리로 하천 수질개선
- 종 다양성 및 개채수 증가에 따른 생태계 복원으로 친수공간 증가 및 생활환경 개선

주관부서	기후환경과	부 서 장	김응열(6560)	팀 장	엄철용(6580)	담 당 자	이한범(6581) 손보라미(6583)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-------------------------

6-7	오봉저수지 주민 쉼터 생태공원 조성
-----	---------------------

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	광역시(도)	사업기간	2021~2026	사업비	23,800백만원

I 추진배경

- 신평, 송악 주민들의 산책코스인 오봉저수지에 생태공원을 조성하여 정주여건 개선 필요
- 시민과 야생생물이 공존할 수 있는 쉼터를 제공하여 생태계건강성을 회복하고 생태체험공간을 제공

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	식	1		1			
1단계 사업	%	100			100%		
2단계 사업	%	50					50%

III 사업개요

- 사업위치 : 신평면 상오리 853번지 일원
- 사업기간 : 2021-2026 (2027년 준공 목표)
- 사업비 : 23,800백만원
- 사업내용 : 자연탐방로, 쉼터 등 여가 및 생태공간 조성
 - 자연탐방로(산책로), 생태체험공간, 오봉저수지 내 섬 확장 및 주민 휴식공간 조성

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	용역 발주 및 주민설명회 실시	용역 완료			
1단계 사업		1단계 설계완료 및 공사발주	1단계 사업준공		
2단계 사업				2단계 설계완료 부지매입 및 보상	2단계 사업착공

- 오봉저수지 생태공원 전체 청사진 작성을 위한 기본계획 수립
 - 2022.09. 타당성 조사 및 기본계획 용역 발주
 - 2022.11. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 및 주민설명회 실시
 - 2023.07. 기본계획 수립

- 1단계 사업
 - 2023.08. 1단계 사업 실시계획 수립 완료
 - 2023.12. 1단계 사업 공사발주
 - 2024.06. 1단계 사업준공
- 2단계 사업
 - 2025.06. 2단계 사업 설계 완료
 - 2025.10. 2단계 사업 부지매입 및 보상 실시
 - 2026.03. 2단계 사업 공사 착공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	23,800	200	23,600	480	1,720	8,200	6,600	6,600	0
국비	0		0						
도비	13,230	100	13,130	312	858	3,380	4,290	4,290	
시비	10,570	100	10,470	168	862	4,820	2,310	2,310	
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.07.) 오봉저수지 충남도에 추가사업비 반영 사전협의(1단계:20억, 2단계:214억)
- ('22.09.) 한국농어촌공사 충남본부 사전협의(저수지 섬 확장 등 관련)
- ('22.10.) 오봉저수지 기본계획 및 타당성 조사 용역발주 공고
 - ※ 기본계획 및 실시설계(1단계) 중지 중

VI 문제점 및 대책

- 오봉저수지 임대기간 만료 사업자 불법 점거로 추진 장애
 - 농어촌공사에서 불법점유 시설물 등에 대한 신속한 철거 및 원상복구 조치

VII 國·道 협조 필요 사항

- 2단계 사업 추가 사업비(214억원) 확보 협조 (충청남도)

VIII 기대 효과

- 쉼터 및 휴식공간 조성으로 정주여건 개선
- 자연생태체험공간 조성으로 탐방객들의 힐링 문화 및 정서 함양 기회 제공

주관부서	기후환경과	부 서 장	김응열(6560)	팀 장	이 훈(6561)	담 당 자	김아르미(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-8	당진시·서산시·대산석유화학단지와 환경개선협의회 구성 및 운영
-----	-----------------------------------

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I 추진배경

- 당진, 서산 인접지역에 위치한 당진발전본부와 대산석유화학단지의 대기질 개선을 위한 상호 협력
- 대기오염 민원 및 각종 화학사고, 유조선 해안사고 발생 시 신속한 협조 대응체계 구축

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경개선협의회 구성 및 운영	-	구성 및 운영	유관기관 협의	구성 및 운영	지속 운영		

III 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 비예산
- 참여범위 : 주민, 기업체, 전문가, 사회단체, 의회, 공무원 등
 - 상호 인접지역에 위치한 기업체(대산석유화학단지 및 당진발전본부)의 참여
 - 허가·지도점검 기관인 금강유역환경청과 충남도 두 기관과 당진·서산의 참여
- 사업내용
 - 대기오염물질 발생 및 확산 방지를 위한 공동협력방안 모색
 - 기업체 환경개선계획 추진 협의 및 화학 및 기름유출 사고·민원 대응체계 구축

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
환경개선 협의회 구성 및 운영	유관기관 협의	구성 및 운영	지속 운영		

V 추진실적

- ('22.06.) 충청남도 사전협의(환경안전관리과 서북부권환경관리팀/서산시 삼길포항 소재)
- ('22.06.) 서산시 업무협의(환경생태과 환경안전팀/대산읍사무소 소재)
- ('22.07.) 충청남도의원(이철수 의원) 협의 방문

VI 문제점 및 대책

○ 기 구성된 「대산지역 환경협의회*」 구성의 확대 추진

* 충청남도 및 서산시 공무원, 의회, 기업체, 주민, 환경단체, 전문가로 구성

⇒ 대산지역 인접지역 주민의 환경피해 감소 및 신속대응을 위한 우리시를 포함한 협의회 구성 추진

VII 國·道 협 조 필요 사항

○ (금강청) 환경오염물질 배출시설 통합관리에 따른 대형사업장 점검

○ (충남도) 협의회 구성 관련 업무협의 지원

VIII 기대 효과

○ 대기환경개선을 위한 상호협력체계 구축

○ 당진시·서산시 인접거주 시민의 환경피해 최소화

○ 환경오염사고 및 유류오염사고, 민원 발생 시 신속 대응 가능

주관부서	기후환경과	부 서 장	김응열(6560)	팀 장	이 훈(6561)	담 당 자	김아르미(6563)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	------------

6-9	도심 속 명품 호수공원 조성						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	1,200억원 추정

I 추진배경

- 도시공원은 도시민의 삶의 질과 도시의 환경적 지속가능성을 높이는 도시계획시설임
- 도시화에 따라 시민들의 휴식처 및 여가활동 공간에 대한 수요가 확대되고 있어 이에 따라 쾌적한 도시환경·시민의 휴식과 정서 함양·정주여건 개선을 위하여 도심 속 호수공원 조성이 필요함

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
호수공원 조성	-	토지보상 착수	타당성 조사 용역발주	대상지 선정 도시관리계획 결정	공원 조성계획 수립	지방재정 투자심사	토지보상 착수

III 사업개요

- 사업위치 : 관내 도심권
- 사업규모 : 약 20만평(66만㎡)
- 사업기간 : 2023~2028
- 사업비 : 최소 1,200억원 ~ 최대 3,700억원 추정
- 사업내용
 - 관내 도심권 인공호수 조성
 - 편익시설·휴게시설·운동시설 등 공원시설물 설치
 - 수목식재(교목류, 관목류), 조경시설물 설치

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
호수공원 조성	타당성 조사 용역발주	대상지선정 도시관리계획 결정 (12개월)	공원 조성계획 수립 (10개월)	지방재정투자심사 (6개월)	토지보상 착수

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	121,970	0	11,970	270	700	1,000	0	10,000	110,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	121,970		11,970	270	700	1,000		10,000	110,000
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.09.01.) 호수공원 대상지 선정을 위한 기본구상 및 타당성 용역 심의위원회 원안의결
- ('22.10.12.) 용역비 270백만원 확보(2회 추경)

VI 문제점 및 대책

- 호수공원 조성을 위하여 농업진흥구역 편입이 불가피하여 농업진흥구역 해제에 따라 협의가 지난하여 절반 정도는 다른 용도지역과 편입 검토
- 토지보상비 및 조성비에 많은 예산이 소요되어 여러 각도에서 개발방식에 대한 검토 필요

VII 國·道 협조 필요 사항

- [國 농림축산식품부] 농업진흥구역 해제 관련 검토 협조
- [道 건설정책과] 도시관리계획 결정(행정절차 포함) 긍정적 검토 협조

VIII 기대 효과

- 쾌적한 도시환경 조성, 시민들의 휴식과 정서 함양에 이바지
- 도심권 생활환경개선을 통한 정주 여건 개선으로 시민 삶의 질 향상

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	박정래(4180)	담 당 자	정의식(4181)
협조부서	도시과	부 서 장	안병환(4400)	팀 장	이영필(4401)	담 당 자	조성규(4403)

6-10	도심 속 명품 계림공원 조성						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	60%보상완료
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2020~2025	사업비	52,002백만원

I 추진배경

- 도심 속 중앙의 장기 미집행 도시계획시설인 계림공원을 명품공원으로 조성하여 시민들에게 휴식처 제공 및 정서 함양
- 2022년 6월 기준으로 278,718㎡ 중 167,513㎡(60%) 보상 완료

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계림공원 조성	-	착수	토지보상			토지보상 완료 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차	착수

III 사업개요

- 사업위치 : 계림근린공원, 수청동 848-1번지 일원
- 사업면적 : 278,718㎡(최초결정일 1962.10.21.)
- 사업기간 : 2020~2026
- 사업비 : 52,000백만원
 - 토지보상비 49,000백만원
 - 조성비 3,000백만원(도비 1,800, 시비 1,200)
- 사업내용
 - 계림공원 조성을 위한 토지 보상
 - 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진
 - 충청남도 공모사업 신청(30억)

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
계림공원 조성	토지보상			토지보상 완료 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차	착수

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	52,002	16,902	34,100	6,000	8,700	8,700	8,700	2,000	1,000
국비	0		0						
도비	1,800		1,200					1,200	600
시비	50,202	16,902	32,900	6,000	8,700	8,700	8,700	800	400
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.04.08.) 공원조성계획(변경) 수립 용역 착수

VI 문제점 및 대책

- 주변 도시개발로 인한 지가상승으로 공원보상비 증액이 불가피함
→ 지가상승을 감안하여 연차별 보상계획 재수립 및 조기 예산확보 추진

VII 國·道 협조 필요 사항

- [道 산림자원과] 계림공원 조성사업비 확보를 위한 공모사업 선정(3,000백만원)

VIII 기대 효과

- 장기 미집행 도시공원 보상사업을 통한 사유재산 관련 민원 해소
- 도시지역 공원 조성으로 인한 생활환경개선 및 여가활동 공간 확보

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	박정래(4180)	담 당 자	정의식(4181)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-11	송악산 공원화 조성						
------	------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2025~2029	사업비	24,100백만원

I 추진배경

- 장기미집행 도시계획시설인 송악산(중흥 1호 근린공원)에 대한 토지 보상을 완료하여 시민들에게 휴식처 제공 및 정서 함양에 기여

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송악산 공원화 조성	-	토지보상 착수				토지보상 착수	토지보상 진행

III 사업개요

- 사업위치 : 송악산(중흥1호 근린공원), 송악읍 중흥리 산83-1번지 일원
- 사업면적 : 223,923㎡(최초결정일 2009.11.30.)
- 사업기간 : 2025~ 2029
- 사업비 : 24,100백만원
 - 토지보상비 22,100백만원
 - 조성비 2,000백만원(도비 1,200, 시비 800)
- 사업내용
 - 송악산(중흥1호 근린공원) 조성을 위한 임기내 토지 보상
 - 공원 조성을 위한 실시설계 및 실시계획인가 등 행정절차 추진
 - 송악산(중흥1호 근린공원) 조성사업 착수

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
송악산 공원화 조성				토지보상 착수	토지보상 진행

- 송악산(중흥1호 근린공원) 토지 보상
 - 2025~2027년 : 사유지 토지 보상 및 개발 가능지 부분 착수
 - 2028~2029년 : 국유지 토지 보상 및 공원 조성 착수 및 준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	24,100	0	12,000	0	0	0	6,000	6,000	12,100
국비	0		0						
도비	1,200		0						1,200
시비	22,900		12,000				6,000	6,000	10,900
민자	0		0						
기타	0		0						

V 문제점 및 대책

- 중흥도시지역 총 5개 중 4개 공원이 실효되었고, 그중 송악산(중흥1호 근린공원)만 공원으로 결정되어 있어 중흥리 주민들을 위하여 반드시 공원 조성을 추진하여야 함
→ 연차별 보상계획에 따라 예산확보 추진

VI 國·道 협조 필요 사항

- [道 산림자원과] 송악산(중흥1호 근린공원) 조성사업비 확보를 위한 공모사업 선정(2,000백만원)

VII 기대 효과

- 장기 미집행 도시공원 보상사업을 통한 사유재산 관련 민원 해소
- 도시지역 공원 조성으로 인한 생활환경개선 및 여가활동 공간 확보

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	박정래(4180)	담 당 자	정의식(4181)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-12	은봉산 자연휴양림 조성						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	26%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2028	사업비	19,800백만원

I 추진배경

- 충청남도 지차제 중 당진시가 유일하게 산림휴양시설이 없고 산업단지 등 도시화·산업화 급속화에 따라 자연경관이 수려한 산림에서 휴식·체험·산림치유 등이 어우러진 복합개념의 산림휴양시설 조성이 필요

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자연휴양림 조성	-	착수	토지매입	휴양림 지정 및 기본설계	조성계획승인 및 실시설계	공사착수	공사추진

III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 정미면 수당리 산102-5번지 일원
- 사업기간 : 2022~2028
- 사업비 : 17,800백만원
- 사업내용
 - 자연휴양림 조성을 위한 입지타당성평가, 환경부 협의, 지정·고시 등 조성계획절차 추진
 - 자연휴양림 → 치유의 숲 → 숲속야영장 순으로 복합적인 산림휴양시설 단계적 조성
 - 지속적인 숲가꾸기사업 등을 통해 아름답고 건강한 명품 산림으로 조성

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
자연휴양림 조성	토지매입	휴양림 지정 및 기본설계	조성계획승인 및 실시설계	공사착수	공사추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	17,800	0	16,300	7,730	2,070	500	3,000	3,000	1,500
국비	0		0						
도비	6,000		4,875			375	2,250	2,250	1,125
시비	11,800		11,425	7,730	2,070	125	750	750	375
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- 산림휴양시설 조성을 위한 부지매입 약 70ha 완료(70%)
- 토지보상비 17.7억원 2023년 본예산 요청(대규모 투자사업 구조조정에 따른 감액)
- 자연휴양림 지정·기본계획 등의 용역비 2023년 본예산 요청(3억원)

VI 문제점 및 대책

- 사업 대상지 진입로 확장 및 노선 변경 등 진·출입 대책 방안 검토 및 관련부서와 협의 필요
- 토지보상비 20.7억원이 부족한 상황으로 2023년 본예산 편성하여 토지매입 필요
- 자연휴양림 조성을 위한 국도비 보조금이 2023년부터 지방이양 되어 보조율 변동이 예상되므로, 시비 부담을 줄이기 위해 자연휴양림 관련 절차를 앞당겨서 진행하여야 함
(2023년 휴양림 설계 관련 용역비 약 5억원 필요)

VII 國·道 협조 필요 사항

- (道 산림녹지과) 2023년 지방이양에 따른 도비 지원 및 시비 부담률 최소화 요청

VIII 기대 효과

- 당진시민이 가까워서 누릴 수 있는 관내 산림휴양시설 조성으로 시민 삶의 질 향상

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	박다예(4203)
협조부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	최주신(4371)

6-13	몽산 입구 공영주차장 조성						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2024	사업비	650백만원

I 추진배경

- 코로나19 영향으로 산림휴양 공간에 대한 시민들의 수요가 증가함에 따라 등산로(숲길) 주차장 등 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	토지매입 및 실시설계	준공		

III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 면천면 성상리 1012번지 일원
- 사업기간 : 2023~2024
- 사업비 : 650백만원
- 사업내용
 - 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공
 - 몽산 등산로 인근의 사유지 토지매입
 - 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진
 - 주차장 조성 공사 착수 및 준공

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	매입토지 후보 선정	토지매입 및 실시설계	준공		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	650	0	650	0	450	200	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	650		650		450	200			
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진실적

- 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인)

VI 문제점 및 대책

- 주차장 토지매입은 협의에 의한 취득으로, 토지 감정평가액과 토지소유자의 매도 희망가의 차가 현저히 발생하여 매도할 의사가 없을 경우 사업추진에 어려움이 있음.
- 몽산 입구 주차장 예정지는 자연녹지지역으로, 당진시 도시계획 조례에 따라 5,000㎡ 미만의 주차장을 조성할 경우 최소 도로폭 4m 이상 확보하여야 함.

VII 기대효과

- 시민 누구나 이용할 수 있는 공영주차장 확대로 주차부족 문제 해결
- 시민에게 쾌적하고 안전한 산림문화·휴양 서비스를 제공

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	송재훈(4200)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-14	구절산 등산로 공영주차장 조성						
------	------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2024	사업비	1,000백만원

I 추진배경

- 코로나19 영향으로 산림휴양공간에 대한 시민들의 수요가 증가함에 따라 등산로(숲길) 주차장 등 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공
- 등산로 주차장 조성과 더불어 시민들을 위한 휴게시설 및 운동시설 설치로 산림문화 휴양 환경에 도모

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	-	준공	매입토지 후보 선정	토지매입 및 실시설계	준공		

III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 순성면 봉소리 1120번지 일원
- 사업기간 : 2023~2024
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용
 - 코로나19 이후 등산로(숲길) 및 산림에 대한 수요가 증가함에 따라 등산로 인근에 편의시설 확충으로 양질의 산림서비스 제공
 - 구절산 등산로 인근의 사유지 토지매입
 - 주차장 조성을 위한 실시설계 및 관련 법률 추진
 - 주차장 조성 공사 착수 및 준공
- ※ 1차 검토의견

○ 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」 시행규칙 별표3 규정에 따라 체육공원 조성 최소 규모는 1만제곱미터 이상으로 구절산 주변에 대규모의 공원조성은 많은 예산과 시간(행정절차)이 소요되고, 이곳과 1.5km 떨어진 순성면 봉소리 620-29번지 일원에 체육공원이 조성되어 있어 구절산 체육공원 조성은 신중한 검토가 필요함 ○ 구절산 인근에 기조성된 체육공원에 주민편의시설, 휴게시설 및 야외운동기구 등을 설치하여 체육공원의 기능을 부여

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 조성	매입토지 후보 선정	토지매입 및 실시설계	준공 및 체육공원 시설 설치		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,000		1,000		1,000				
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- 사업 대상지 선정 완료(토지매도 의사 확인)

VI 문제점 및 대책

- 주차장 조성 예정지는 구절산 등산로 입구에 위치해 적지로 판단되나, 토지소유자는 주택부지 분할과 진입로 확보 조건으로 매도할 의사를 밝혀 합의점 도출 난항 예상되며,
- 주차장 토지매입은 협의에 의한 취득으로, 토지 감정평가액과 토지소유자의 매도 희망가의 차가 현저히 발생하여 매도할 의사가 없을 경우 사업추진에 어려움이 있음.

VII 기대 효과

- 시민 누구나 이용할 수 있는 공영주차장 확대로 주차 부족 문제 해결
- 시민에게 쾌적하고 안전한 산림문화·휴양 서비스를 제공

주관부서	산림녹지과	부 서 장	이병구(4150)	팀 장	송재훈(4200)	담 당 자	송재훈(4200)
------	-------	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-15	당진천 천변길 개선						
------	------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	20%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	4,399백만원

I 추진배경

- 당진천 산책로 정비 및 시설물 보수를 통한 친수공간 접근성 강화 및 안전한 보행환경 조성

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시설물 유지보수	개소	50	10	10	10	10	10
제초작업	회	24	4	5	5	5	5
산책로 개선	km	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

III 사업개요

- 당진천 도심지역 예초 및 시설물 유지관리 용역
 - 사업위치 : 당진천 도심지역 일원
 - 사업기간 : 2022~2026
 - 사업비 : 2,279백만원
 - 사업내용: 산책로 내 시설물 상시 보수 및 L=5km, 연5회 제초작업
 - 민간에 연간 위수탁을 추진하여 당진천 시설물 상시 관리
 - 대상지 발견 또는 민원 접수 후 5일 이내 보수 처리
 - 당진천 도심지역 L=6km, 연5회 제초작업
 - 대규모 정비가 필요한 경우 하천의 고유 기능을 훼손하지 않는 범위 내에서 재정비
- 산책로 개선
 - 사업위치 : 당진시 채운동 261-7 ~ 우두동 187-1번지(원우교) 일원
 - 사업기간 : 2022~2025
 - 사업비 : 1,320백만원
 - 사업내용 : 산책로 추가 개설(L=3km) 및 진입로 8개소 개설

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
시설물 유지보수	10개소	10개소	10개소	10개소	10개소
제초작업	4회	5회	5회	5회	5회
산책로 개선	0.6km	0.6km	0.6km	0.6km	0.6km

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,399	0	3,599	399	800	800	800	800	800
국비	0		0						
도비	635		535	135	100	100	100	100	100
시비	3,764		3,064	264	700	700	700	700	700
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

○ 당진천 예초 정비공사 완료

- 사업위치 : 당진천(대덕4교 ~ 당진하수처리장) 일원
- 사업량 : 예초작업 L=5.59km 4회
- 사업비 : 172백만원(도급 172백만원)

○ 당진천 산책로 조성공사 완료

- 사업위치 : 당진천(당진배수펌프장 ~ 푸르지오아파트) 일원
- 사업기간 : '22.04.18.~07.16.
- 사업량 : 산책로 포장 L=670m, 사각수로관 L=96m
- 사업비 : 154백만원(도급 106백만원, 관급 48백만원)

○ 당진천 계단 및 보도 보수공사 완료

- 사업위치 : 당진천 행동교(대덕4교-당진하수처리장) 일원
- 사업기간 : '22.03.04.~05.02.
- 사업량 : 계단보수 250㎡, 콘크리트 포장 227㎡
- 사업비 : 94백만원(도급 74백만원, 관급 19백만원)

○ 당진천 시설물 유지보수 추진

- 사업위치 : 당진천 산책로 일원
- 사 업 비 : 50백만원
- 사업내용 : 벤치보수, 배수로 정비, 인도교 보수 등

VI 문제점 및 대책

- 공공시설물의 소규모 파손 등은 민원 접수 후 수리·수선에 따른 처리 지연 발생
→ 하천유지관리 감시원 및 공공근로 등을 활용한 수시 점검 및 시설물 유지보수에 대한 민간위탁을 추진하여 신속 처리할 수 있도록 개선

VII 國·道 협조 필요 사항

- 당진천 지방하천으로 유지관리비 등의 30% 지원

VIII 기대 효과

- 산책로 추가 조성 및 개선하여 주민들에게 안전한 하천환경 및 쾌적한 친수공간 제공

주관부서	건설과	부 서 장	이태환(4630)	팀 장	진호현(4650)	담 당 자	신수정(4652)
협조부서	道 하천과	부 서 장	이성남(635-2190)	팀 장	박상용(635-4705)	담 당 자	강석모(635-3580)

6-16	기계화 경작로 확·포장 및 용·배수로 정비						
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	52.2%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	270,100백만원

I 추진배경

- 농업기반시설 확충 및 정비를 통한 기계화 영농의 편익 도모, 안정적 용수공급으로 농업 생산성 향상 및 농가 소득 증대 기반 마련

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기계화 경작로 확·포장사업	km	100	20	20	20	20	20
용·배수로 정비사업	km	250	50	50	50	50	50

- 농업기반시설 정비사업 중장기계획에 따라 연차적으로 예산을 확보하여 정비 추진

III 사업개요

- 농업기반시설(기계화 경작로) 확·포장사업
 - 사업위치 : 당진시 관내 일원
 - 사업기간 : 2022~2026
 - 사업비 : 150억원(年 30억원)
 - 사업내용 : 기계화 경작로 미포장 구간 포장을 통한 농업기반시설 확충
- 농업기반시설(용·배수로) 정비사업
 - 사업위치 : 당진시 관내 일원
 - 사업기간 : 2022~2026
 - 사업비 : 375억원(年 75억원)
 - 사업내용 : 미정비 용·배수로 정비를 통한 재해예방 및 농업생산력 향상

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
기계화 경작로 확·포장사업	20km	20km	20km	20km	20km
용·배수로 정비사업	50km	50km	50km	50km	50km

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	270,100	0	52,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	217,600
국비	0		0						
도비	36,000		10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	26,000
시비	234,100		42,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	191,600
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- 농업기반시설(기계화 경작로) 확·포장사업
 - '21년까지 총 863km 중 617km 정비, 정비율 71.5%
 - '22년부터 17.4km 정비 / 2,607백만원 집행
- 농업기반시설(용·배수로) 정비사업
 - '21년까지 총 3,132km 중 1,471km 정비, 정비율 46.9%)
 - '22년부터 86.1km 정비 / 13,027백만원 집행

VI 문제점 및 대책

- 농업생산기반시설 조기 정비를 위한 재정확보 필요에 따른 국·도비 확보 노력

VII 國·道 협조 필요 사항

- [道 농촌활력과] 지역 현안 사업(기계화 경작로, 용·배수로) 도비 지원 확충

VIII 기대 효과

- 토공수로의 구조물화를 통한 양질의 농업용수 공급 및 배수로 수해 피해 방지
- 농기계 기계화에 따른 미포장 구간 포장을 통한 농업생산력 증대

주관부서	건설과	부 서 장	이태환(4630)	팀 장	하태은(4640)	담 당 자	김무기(4641)
협조부서	道농촌활력과	부 서 장	조원태(635-2530)	팀 장	구자승(635-4061)	담 당 자	이은진(635-2531)

6-17

신평면 거산리 축산악취의 근본적인 대책 마련을 위한 도시개발사업

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체·민간	사업기간	2022~2026	사업비	비예산

I추진배경

- 신평면 거산리 주거밀집지역 인근 혐오시설(축사) 철거로 주민 숙원사업 해소
- 계획적이고 체계적인 도시개발로 쾌적한 도시환경 조성 및 정주 여건 향상에 기여
- 신평면, 읍 승격을 위한 도심 시가지 확장 기반 마련

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
거산리 도시개발사업 검토	-	개발계획 수립	10 기초조사 및 구역계 구상	25 타당성(경제성) 검토	50 사업시행자 유치	75 구역 지정 및 개발계획 신청	100 구역 지정 및 개발계획 수립

- 도시개발사업 검토
 - 거산리 축사 및 거산공원을 포함한 도시개발 구역계 구상
 - 2035년 도시기본계획상 시가화 예정용지 물량 및 인구 배분계획 등 종합검토
- 행정절차 이행
 - 구역 지정 제안시 수용 여부 결정, 구역지정 및 개발계획 수립 등 절차 이행

III사업개요

- 사업위치 : 당진시 신평면 거산리 114-6번지 일원
- 사업규모 : A=330,000㎡ (추후 결정)
- 사업방식 : 도시개발사업
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 축산현황

위치	부지면적(㎡)	건물연면적(㎡)	동수	사육규모	축주	축산업 신고일자	인근 주거단지(아파트) 거리
신평면 거산리 114-6	24,816	6,395	8동	돼지 2,850두	최강봉	2004.11.08	350m (자연녹지지역)

- 사업내용
 - 수용·사용방식(공기업, 토목건설사업자 등) 형식의 민간 도시개발사업 제안 추진
 - 2035년 도시기본계획상 시가화 예정용지 물량 및 인구 배분계획 등 종합검토를 통해 시행방안 (도시개발사업, 지구단위계획 등) 결정

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
거산리 도시개발사업 검토	기초조사 및 구역계 구상	타당성(경제성) 검토	사업시행자 유치	행정지원 (구역 지정 및 개발계획 신청)	행정지원 (구역 지정 및 개발계획 수립)

- 사업 제안 및 행정절차 진행 시, 추진상황 보고
- 2035년 도시기본계획상 시가화 예정용지 물량 및 인구 배분 계획 등 검토
- 사업계획/ 시행방안/ 인구밀도/ 토지이용계획 등 검토

V 추진 실적

- 신평면 공간 정보 및 기초조사(현황 분석) 실시
 - 인구: 15,814명(당진시 전체 166,249명, 약9.5%)(전입 2,107명/전출2,414명, 증감률-2.28%)
 - 주택: 아파트 3,442호(15평, 27평 70% 분포)(매매가1.6억(34평), 평균 평당가격 약 500만원/평)
 - 교육: 유치원 4, 초등학교 3, 중학교 1, 고등학교 1
- 2022.09.16.: 도시개발사업 시행자 유치를 위하여 사업 구역계 설정 및 기초조사 실시, 경제성(사업성) 분석 등 업무 협의(충남개발공사)
- 2022.10.05.: 신평면 거산리 일원 사업 후보지 2개안 검토(충남개발공사)
 - 제1안) A=862,991㎡(약 261,054평), 제2안) A=412,913㎡(약 124,906평)
 - 개략적 검토 결과 경제성 측면에서 제2안) 유리하며 2차 세부검토 실시

VI 문제점 및 대책

- 공영개발은 市 재정 여건이 열악하여 직접 도시개발 시행이 어려운 실정임.
- 수용·사용방식(공기업, 토목건설사업자 등) 형식의 민간 주도의 도시개발사업 유도.
- 거산리 및 남산리 일원 소규모 축사가 산재 되어 지속적인 민원 발생 소지가 다분함에 따라 도시개발사업 외 지속적인 축사 약취 저감 대책 추진이 필요

VII 國·道 협 조 필요 사항

- [道 건설정책과] 구역 지정 및 개발계획 수립 등 행정절차 이행기간 단축 필요

VIII 기대 효과

- 녹색 도시개발로 쾌적한 도시환경 조성 및 정주 여건 향상에 기여
- 혐오시설(축사) 철거로 축산악취의 근본적인 해결 및 주민 숙원사업 해소

주관부서	도시과	부 서 장	안병환(4400)	팀 장	이찬주(4410)	담 당 자	조원희(4412)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-18	송산면 소재지 정주기반 조성사업 추진						
------	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	계속	사업주체	민간	사업기간	2023~2025	사업비	비예산

I 추진배경

- 시가지(당진,송악)와 산업단지의 중간지역에 위치한 송산면 소재지가 지방도633호선(당진IC~송산2일반산업단) 개통에 따른 접근성 향상, 서북부 산업단지 활성화로 산단 주변 정주기반 개선 필요

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
민간 제안, 지구단위계획 변경	-	민간 제안, 지구단위 계획변경 병행 추진	행정지원 민간사업 제안 시 지구단위계획 변경				

- 지구단위 구역내 민간제안(공동주택건설)과 지구단위계획변경 동시 추진으로 공동주택 건설 등을 통한 쾌적한 정주기반 조성
 - 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 총수 상향, 가로망 정비 등)

III 사업개요

- 사업위치 : 송산면 상거리(상거리 지구 주거형 지구단위계획 : 295,479㎡)
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업내용 : 민간 제안 지구단위계획변경(민간사업 제안 시 지구단위계획변경)

건폐율(%)		용적율(%)		층수	
변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후
60%이하	60%이하	150%	200%이하	5층하	경관심의 결정

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
민간 제안 지구단위계획 변경	행정지원	행정지원	행정지원	행정지원	행정지원

- 민간사업자 지구단위계획 변경 제안 시 적극검토 하여 공동주택 건설사업 추진

V 추진 실적

- 송산면 공간 정보 및 기초조사
 - 인구 : 11,817명(당진시 전체 167,553명, 약7.1%) * 2022년 9월말 기준
 - 세대수 : 6,125세대 * 2022년 9월말 기준
 - 사업체수 및 종사자수 : 사업체수 735개, 종사자수 5,774명 * 2019년 기준
 - 교육: 유치원 3, 초등학교 3, 중학교 1
- ('22.09.16.) 민간 주도의 도시개발사업을 유도하기 위해 공기업과 기초조사, 사업성 분석 등 업무 협의(충남개발공사)
- ('22.10.05.) 건축과 회의실에서 송산면 소재지 일원 개발 검토(충남개발공사)

VI 문제점 및 대책

- 당진 동지역, 송악읍, 산업단지 주거단지와의 입지 경쟁력 부족으로 주택건설 사업성 저하로 민간 제안 한계
- 지구단위계획 변경(건폐율, 용적률 총수 상향)으로 민간사업자 사업성 개선

VII 기대효과

- 송산초, 송산중, 주민자치센터, 종합사회복지관 등 공공시설이 밀집된 송산면 소재지 중심지역의 정주환경 개선을 통해 농촌 중심지역으로 육성

주관부서	도시과	부 서 장	안병환(4400)	팀 장	김종필(4425)	담 당 자	이정재(4426)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-19	학교 주변 안전 통학로 조성						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	10%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	4,126백만원

I 추진배경

- 보행자가 많은 학교 주변 통학로와 어린이보호구역 내에 보도 미설치 구간이 다수 존재하고 있음.
- 보행로 개선사업 추진으로 보행 약자 교통사고 예방 및 보행 안전성 향상

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
통학로 개선사업	개소	3	1	1	1		
초등학교 인근 보도 개설사업	개소	17	4	4	4	3	2

III 사업개요

- 통학로 개선사업
 - 사업기간 : 2022~2024
 - 사업비 : 1,600백만원
 - 사업내용 : 탑동사거리 개선, 원당교 하부 교차로 개선, 당진정보고~당진중학교 보도개선
- 초등학교 인근 보도 개설사업
 - 사업기간 : 2022~2026
 - 사업비 : 2,526백만원
 - 사업내용 : 초등학교 인근 보도 미 개설지 보도 개설 17개소
(국유지 및 학교부지 활용, 이면도로 보행자 우선도로 도입 추진)

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
통학로 개선사업	1개소	1개소	1개소		
초등학교 인근 보도 개설사업	4개소	4개소	4개소	3개소	2개소

- 당진3-4지구 육교 설치 추진(도시개발사업 시 반영)

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	4,126	1,500	2,626	0	750	750	550	576	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	4,126	1,500	2,626		750	750	550	576	
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(계성초, 신성대학 부설 유치원)
- 어린이보호구역 통합 및 확대 사업 시행 완료(탑동초)
- 당진시 동지역 보행자길 정비공사 시행 완료(당진초 이면도로 개선)
- 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 인근 안전가드레일 설치)
- 어린이보호구역 개선 시행 완료(탑동초 후문 하천변 도로 변경)
- 당진시 어린이보호구역 발광형 표지판 설치 사업 시행 완료
 - 서정초·순성초·탑동초·기지초·석문초·삼봉초·당진초·합덕초·성당초·상록초 일원(10개 초등학교 개선)
- 계성초 후문 이면도로 개선 완료(1개 초등학교 개선)
- 어린이보호구역 보행자 음성신호기 정비공사 시행 완료- 원당초, 서정초, 계성초, 당진초
- 어린이보호구역 미끄럼 방지시설 보강 공사 시행 완료-기지초, 제일어린이집, 송산초, 엄마손어린이집 일원
- 원당교 하부교차로 개선사업 시행 완료- 원당교 하부교차로 개선 및 원당초 어린이보호구역 개선
- 탑동초등학교 인근 보행환경 개선사업 시행 착공- 탑동사거리 교통섬 제거 및 탑동초 어린이보호구역 개선
- 어린이보호구역 개선사업 추진 중 12월 준공
- 초등학교 인근 보도 개설사업 1차(신평초) 착공 완료, 12월 준공
- 초등학교 인근 보도 개설사업 2차(대덕초·우강초·북창초) 착공 완료, 12월 준공
- 당진1동 어린이보호구역 아스콘 덧씌우기 사업(소화유치원) 착공 완료, 12월 준공
- 보행자 음성신호기 신설 추진(기지초, 원당초) 12월 준공

VI 문제점 및 대책

- 학교 통학로 개선사업(보도설치 등)을 위하여 일부 구간 보도 확장부 토지매입이 필요하지만 기존 근린생활시설 등으로 인하여 토지매입 추진 난이
- 대책1 ⇨ 교육청 및 학교와 협의하여 학교부지를 활용한 보도설치 검토추진
- 대책2 ⇨ 교통량을 조사하여 경찰서와 일방통행 지정추진(도로다이어트적용)

VII 國・道 협 조 필요 사항

- 정부예산 및 도비 예산 지원

VIII 기 대 효 과

- 통학로 교통안전시설 강화를 통한 어린이 보호 및 교통사고 발생 저감
- 안심하고 아이를 키울 수 있는 사회적 환경과 기반조성

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	박종욱(4360)	담 당 자	성두경(4364)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-20	국도 32호선(당진~송악) 우회도로 건설						
------	------------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	153,900백만원

I 추진배경

- 서해안고속도로 서해대교 남단과 국도32호선 서산~당진 구간의 상습 정체로 교통혼잡비용 발생
- 현 국도32호선은 도시부 생활교통을 담당하고, 신설 대체우회도로는 서해안고속도로의 우회교통을 처리하는 국도 본연의 기능 확보 필요

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

- 타당성 조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
- 우회도로 건설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

III 사업개요

- 사업위치 : 채운동~송악읍 반촌리
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 153,900백만원
- 사업내용 : L=11.48km, B=20.0m(4차로)



IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	건의활동				반영

- 지역 국회의원 및 충청남도·국토부와 긴밀한 협의 대응 및 건의 활동 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	153,900	0	0	0	0	0	0	0	153,900
국비	122,300		0						122,300
도비	0		0						
시비	31,600		0						31,600
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.09.) 민선8기 충남도지사 당진시 방문 건의
- ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수

VI 문제점 및 대책

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) KDI 일괄예타 미통과(AHP 0.436, B/C 0.44)
- 시곡교차로~수청동 도로 개통('23년 상반기)에 따른 우회도로 효과 기대

VII 道 협 조 필요 사항

- 제6차 국도·국지도 건설계획(26~30) 반영을 위한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

VIII 기대 효과

- 산업단지 접근성 향상 및 기업입지 증가로 일자리 창출과 지역경제 활성화
- 이동시간 단축에 따른 교통기능 향상 및 지역주민 생활 여건 개선

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	윤수혁(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-21

제2 서해안 고속도로 건설

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	민간	사업기간	2024~2032	사업비	3조원

I추진배경

- 충남 서북부 산업단지 개발 및 서해안 관광객 급증 등 통행량 증가로 서해안고속도로 등 충남 서북권 주요 도로망 상습 정체 발생
- 확장 불가능한 서해안고속도로 서해대교의 대체 및 우회 노선으로 교통 분산 및 상습지·정체 해소

II사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료			착수	완료	
건설공사	-	착공				착공	추진

- KDI 사업 적격성 조사 및 우선협상 대상자 선정을 통한 실시설계 추진
- 수도권과의 접근성 향상 및 지역경제 활성화를 위한 건설공사 조기 착공

III사업개요

- 사업위치 : 당진시 송악읍 전대리 ~ 경기도 광명시 가학동
- 사업기간 : 2024~2032
- 사업비 : 3,000,000백만원
- 사업내용 : L=61.4km(해저터널 L=6,945m), B=23.4m(4차로)



노선도

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	KDI 사업 적격성 조사		착수	완료	
건설공사				착공	추진

- 지역 국회의원 및 충청남도·국토부와 긴밀한 협의 대응 및 건의 활동 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	3,000,000	0	1,010,000	0	0	10,000	500,000	500,000	1,990,000
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	3,000,000		1,010,000			10,000	500,000	500,000	1,990,000
기타	0		0						

V 道 협 조 필 요 사 항

- 제2 서해안 고속도로 조기 착공을 위한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

VI 기대 효과

- 서해대교 확장 한계성 극복 및 이용자 안전성 확보
- 수도권과 우리시 접근성 향상 및 기업입지 증가로 일자리 창출과 지역경제 활성화

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	윤수혁(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-22	시곡교차로 지하차도 건설						
------	---------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2025~2030	사업비	35,000백만원

I 추진배경

- 기형적인 교차로와 선형 불균형에 따른 교통사고 위험이 높고 통행량 과중으로 상습지정체 발생
- 동지역 대규모 개발계획에 따른 국도 32호 교통량 증가 및 서해안 고속도로의 대체 기능 수행으로 교차로 상습 정체 해소가 절실함

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
병목지점 개선사업	-	선정				선정	
건설공사	-	착공					착공

- 국도 병목지점 개선 대상사업 선정
 - 행정구역 조정으로 인한 주민 불편 및 피해를 최소화하는 방향으로 주민이 납득 할 수 있도록 충분한 협의 및 주민 공감대 형성
- 안전하고 편리한 도로 환경 제공을 위한 건설공사 조기 착공

III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 시곡동 시곡교차로(종합병원 앞)
- 사업기간 : 2025~2030
- 사업비 : 35,000백만원
- 사업내용 : L=420m, B=19m(4차로)



사업위치

현황사진

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
병목지점 개선사업		건의활동		선정	
건설공사					착공

- 국도 병목지점 개선 7단계(23~27) 대상 사업 반영을 위한 행정구역 조정 등 기반 마련
- 국도 병목지점 개선 7단계(23~27) 대상 사업(변경) 반영 및 건설공사 조기 착공
- 지역 국회의원 및 충청남도·국토부와 긴밀한 협의 대응 및 건의 활동 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	35,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	25,000
국비	35,000		10,000					10,000	25,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.07.~09.) 행정구역 조정 회의(3회)
- ('22.09.) 지하차도 건설계획 철회 진정서 접수(시곡3통장, 연명 1,694명) 및 회신
- ('22.11.) 사전 타당성 조사 용역 착수

VI 문제점 및 대책

- 그동안 국도 병목지점 개선을 지속적으로 요청하였으나, 동지역 위임국도는 원천 제척 대상으로 미반영
- 우리시에서 관리하는 위임국도로써 시비로 추진하기에 재정부담이 큼
- 국가사업 반영을 위한 행정구역 조정 필요(시곡동 → 송악읍)
- ※ 도로법 제23조제2항3호 : 市 관할구역의 洞 지역에 있는 일반국도는 해당 시장이 관리

VII 道 협조 필요 사항

- 국도 병목지점 개선 7단계(23~27) 대상사업 반영을 위한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

VIII 기대 효과

- 교차로 사고위험 및 상습 지·정체 해소

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	윤수혁(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
협조부서	자치행정과	부 서 장	김종현(3231)	팀 장	박미혜(3232)	담 당 자	김문수(3233)

6-23	삼교천~음섬 2차선 도로 확·포장						
------	--------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2028	사업비	15,000백만원

I 추진배경

- 삼교호 관광지과 맷돌포, 음섬을 연결하는 해양관광벨트 조성
- 지역주민 및 관광객에게 안전하고 편리한 도로 환경을 제공하고 지역경제 활성화 도모

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료		착수 및 완료			
보상 추진(재결)	-	수용재결			협약보상	수용재결	
건설공사	-	착공				착공	추진

III 사업개요

- 사업위치 : 신평면 운정리(삼교호관광지)~신평면 매산리(음섬포구)
- 사업기간 : 2023~2028
- 사업비 : 15,000백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=5.6km, B=8.0m(2차로)



IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역		착수 및 완료			
보상 추진(재결)			협의보상	수용재결	
건설공사				착공	추진

- 실시설계 용역 추진
 - 주민설명회를 통한 주민 의견 수렴 및 최적노선 선정
- 2025년 건설공사 착공을 위한 실시설계 및 보상 추진상황 점검

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	15,000	0	9,100	0	100	3,000	3,000	3,000	5,900
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	15,000		9,100		100	3,000	3,000	3,000	5,900
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출
- ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출

VI 문제점 및 대책

- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지난
- 도비 지원 방안 마련

VII 國·道 협 조 필요 사항

- 특별조정교부금 등 도비 지원

VIII 기대 효과

- 관광지와 어항을 연결하는 관광벨트(해안도로) 조성을 통한 지역경제 활성화 및 주민 소득 증대

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	최주신(4371)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-24	시곡교차로~수청동 도로 개통						
------	-----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	30%
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2024	사업비	3,747백만원

I 추진배경

- 단절되어 있는 도시계획도로 소로 3-903호선을 연결하여 인근 주민들의 교통 편의 증대
- 국도 32호선의 교통체증 해소 및 주변 지역개발 여건 마련

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
미개설구간 연결	-	준공	공정률 20%	준공			
기개설구간 정비	-	준공	실시설계 완료	착공	준공		

- 공사추진으로 2023년 상반기 내 개통 목표 및 기개설구간 정비 추진

III 사업개요

- 사업위치 : 시곡동 77-3번지(도) ~ 수청동 129-5번지(답)
- 사업기간 : 2019~2024
- 사업비 : 3,747백만원
- 사업내용 : 단절구간 도로 개설 L=0.55km, B=7.0m(2차로)
기존 도로 확장 L=3.0km, B=7.0m(2차로)



IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
미개설구간 연결	공정률 20%	준공	-	-	-
기개설구간 정비	실시설계 완료	착공	준공		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	3,747	1,747	2,000	100	1,900	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	400	400	0						
시비	3,347	1,347	2,000	100	1,900				
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.07.) 단절구간 공사 착수
- ('22.10.) 기개설 구간 확장공사 실시설계용역 발주
- ('23.06.) 단절구간 공사 준공
- ('23.07.) 기개설 구간 확장공사 착수
- ('24.07.) 기개설 구간 확장공사 준공

VI 기대 효과

- 주말 등 국도 32호선 정체 시 우회도로 역할 기대
- 수청동·대덕동 지역과 송악읍 소재지 간 접근성 강화로 지역발전 도모

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	고남희(4374)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-25	시도 1호선 지방도 승격 및 확·포장						
------	----------------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	계속	사업주체	광역(도)	사업기간	2026~2035	사업비	110,000백만원

I 추진배경

- 석문국가산단·대산석유화학단지와 당진~영덕 고속도로, 국도32호선 국도38호선의 연계교통 체계를 구축하여 간선도로기능 강화 필요
- 지역 산단 및 인접 시와 접근성을 제고하여 물류비 절감 및 산업단지활성화를 통해 국가와 지역의 발전 도모

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30)	-	반영					반영

- 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영을 위한 타당성조사 용역 추진
- 시도1호선 확포장을 위한 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영

III 사업개요

- 사업위치 : 면천면 성하리 ~ 채운동
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 110,000백만원
- 사업내용 : L=8.3km, B=20.0m(4차로)



IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	착수	추진	완료	-	-
제4차 충청남도 도로건설·관리계획 (26~30)	건의활동				반영

- 지역 국회의원 및 충청남도·국토부와 긴밀한 협의 대응 및 건의 활동 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
국비	0		0						
도비	66,000		0						66,000
시비	44,000		0						44,000
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.09.) : 민선8기 충청남도지사 당진시 방문 건의
- ('22.11.) : 사전 타당성 조사 용역 착수

VI 문제점 및 대책

- 현행 시도로서 자체재원으로 추진하기에 재정부담이 큼(추진 불가)
- 제3차 충청남도 도로건설·관리계획('21~'25) 수립 시 道 재정여건 등의 사유로 도내 지방도 승격 건의 노선(9개) 전체 미반영
- 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영 적극 노력

VII 道 협조 필요 사항

- 제4차 충청남도 도로건설·관리계획('26~'30) 반영

VIII 기대 효과

- 당진영덕고속도로(면천IC)와 당진시, 석문국가산업단지를 최단거리로 연결하여 접근성 향상 및 교통물류 개선 등 지역발전에 기여

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	윤수혁(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-26	합덕역 활성화를 위한 도시계획도로 개설
-------------	------------------------------

임기구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	계속	사업주체	자체	사업기간	2019~2027	사업비	33,200백만원

I 추진배경

○ 당진합덕역 개통 예정에 따라 역 이용의 활성화를 위해 도로망 확충이 필요함

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시도7호선 확장	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	70 (공사착수)
중로1-308호선 개설	%	70 (공사착수)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	70 (공사착수)
대로3-303호선 확장	%	100 (공사준공)	-	20 (실시설계)	30 (보상추진)	50 (보상완료)	100 (공사준공)

III 사업개요

■ **시도7호선 확장(4차로)**


- 사업위치 : 시도3호(서야고) ~ 국지도70호(우강 대포리 마을회관)
- 사업기간 : 2023~2027
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업내용 : 도로 확장 L=2,930m, B=20.0m(4차로)

■ **중로1-308호선 개설(4차로)**

- 사업위치 : 국지도70호(우강 송산리) ~ 합덕수리박물관
- 사업기간 : 2019~2027
- 사업비 : 17,500백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=2,792m, B=20.0m(4차로)

■ **대로3-303호선 확장(4차로)**

- 사업위치 : 합덕수리박물관 ~ 서야고
- 사업기간 : 2019~2026
- 사업비 : 5,700백만원
- 사업내용 : 도로 개설 L=583m, B=25.0m(4차로)

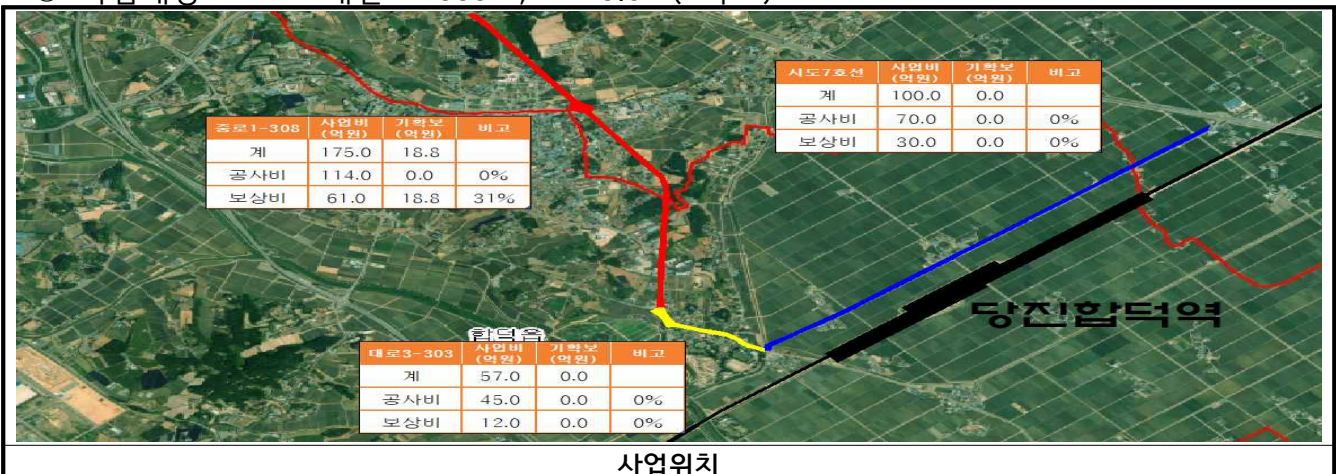

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
시도7호선 확장		실시설계완료	보상추진	보상완료	공사착수
중로1-308호선 개설		실시설계완료	보상추진	보상완료	공사착수
대로3-303호선 확장		실시설계완료	보상추진	보상완료	공사준공

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	33,200	1,880	20,115	4,220	490	2,100	2,100	11,205	11,205
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	33,200	1,880	20,115	4,220	490	2,100	2,100	11,205	11,205
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.10.) 중로1-308호선 보상비 42.2억원 확보(추경2회)
- ('22.10.) 2022년 제3차 용역과제심의 심의 안건 제출
- ('22.10.) 2022년 제4차 투자심사 자료 제출

VI 문제점 및 대책

- 사업비가 과다 소요됨에 따라 재원 확보 지난
- 도비 지원방안 마련

VII 國·道 협조 필요 사항

- 특별조정교부금 등 도비 지원

VIII 기대 효과

- 당진 합덕역의 원활한 교통체계 확립으로 물류단지 조성 등 투자여건 마련
- 솔뫼성지, 합덕제 등 납부권 관광 활성화에 기여

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	윤종근(4372)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-27	국도 40호선(합덕~신평) 개설						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	국가	사업기간	2026~2035	사업비	150,000백만원

I 추진배경

- 석문·아산국가산업단지, 당진철강산업단지 등 산업지대와 산업철도를 직접 연결하는 광역도로망 구축으로 교통·물류비용 절감 및 당진 합덕역 활성화
- 충남 서북부 산업지대와 서해안을 연결하는 간선도로 확충

II 사업목표


[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	-	완료	착수		완료		
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	-	반영					반영

- 타당성조사 용역을 통한 최적노선 선정 상위계획 반영을 위한 기반 마련
- 국도40호(합덕~신평) 개설을 위한 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

III 사업개요

- 사업위치 : 합덕읍 신석리(국도32호) ~ 신평면 운정리(국도38호)
- 사업기간 : 2026~2035
- 사업비 : 150,000백만원
- 사업내용 : L=11.3km, B=20.0m(4차로)

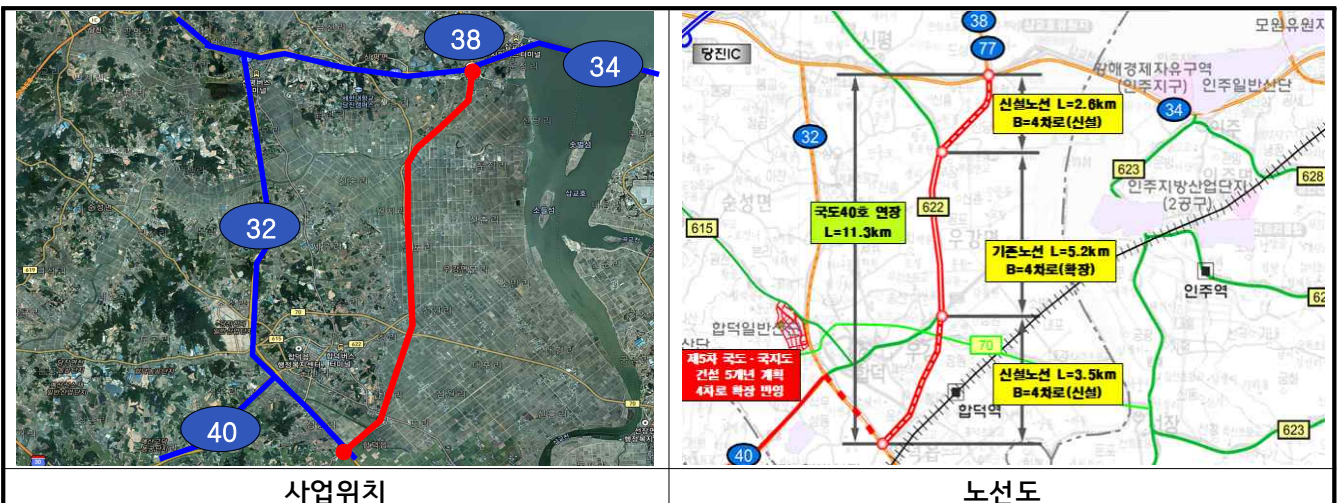

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
타당성 조사 용역	착수	-	완료	-	-
제6차 국도·국지도 건설계획(26~30)	건의활동				반영

- 지역 국회의원 및 충청남도·국토부와 긴밀한 협의 대응 및 건의 활동 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
국비	150,000		0						150,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.10.) 사전 타당성 조사 용역 착수

VI 문제점 및 대책

- 타당성조사결과 종합평가(AHP), 경제성분석(B/C)이 낮게 평가될 경우 사업추진에 지장 초래
- 기존노선(지방도622호선, 시도7호선)을 활용한 노선계획 검토 등 경제성 향상 방안 마련

VII 道 협 조 필요 사항

- 제6차 국도·국지도 건설계획(26~30) 반영을 위한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

VIII 기대 효과

- 국도38호선과 국도40호선 연결도로망 건설로 당진합덕역 교통물류 네트워크 조성 및 물류 수송 비용시간 절감
- 국도의 간선도로 기능 회복 및 지역 균형발전 도모

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	윤수혁(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-28	국도 40호선(고덕~합덕) 확·포장						
------	---------------------	--	--	--	--	--	--

임지구분	임기내	추진목표	착수	추진상황	정상	추진율	1%
사업성격	계속	사업주체	국가	사업기간	2022~2030	사업비	47,200백만원

I 추진배경

- 내포신도시(충남도청)~고덕IC~합덕(국도32호) 간 도로망 확충으로 지역 균형발전 도모
- 충남 서북부 산업지대와 서해안을 연결하는 간선도로 확충
- 대전~당진 고속도로 개통으로 교통량 증가에 따른 교통사고 방지

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	-	완료	착수		완료		
건설공사	-	착공				착공	추진

III 사업개요

- 사업위치 : 합덕읍 운산리(국도32호) ~ 예산군 고덕면 호음리
- 사업기간 : 2022~2030
- 사업비 : 47,200백만원
- 사업내용 : L=4.94km, B=20.0m(4차로)

사업위치	현황사진

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 용역	착수		완료		
건설공사				착공	추진

- 지역 국회의원 및 충청남도·국토부와 긴밀한 협의 대응 및 건의 활동 추진

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	47,200	0	16,200	200	500	500	5,000	10,000	31,000
국비	47,200		16,200	200	500	500	5,000	10,000	31,000
도비	0		0						
시비	0		0						
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.07.) 기본 및 실시설계용역 착수(2년 간)

VI 道 협 조 필 요 사 항

- 공사 조기 착공 및 정부예산 확보를 위한 긴밀한 협조 대응 및 건의 활동 전개

VII 기대 효과

- 합덕지역 산업단지의 교통물류 개선 및 지역경제 활성화
- 지역주민의 교통사고 위험 해소

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	윤수혁(4351)	담 당 자	맹창재(4352)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-29

면 소재지(송산권)~이주단지 간 보도 등 이동권 환경개선사업 추진

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022~2026	사업비	800백만원

I추진배경

- 현대제철, 송산산업단지 등 출퇴근 교통량이 많으나 통학생, 출퇴근 직장인 등 보행자가 많아 교통사고 예방을 위한 보도 설치 등 보행환경 개선이 필요함.

II사업목표


[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	km	3	1	1	1		

III사업개요

- 사업위치 : 송산면 소재지~송산 산단 이주단지(시도 17호선)
- 사업기간 : 2022~2024
- 사업비 : 총 800백만원(시비 800백만원)
- 사업내용 : 보도 개설 L=3km, B=1.5~2.0m
 - 유곡리~무수리 방면 1km, 무수리~삼월리 방면 1km, 삼월리~상거리 면소재지 방면 1km

보도 등 이동권 환경개선
 L=3.0km, 보행권 개선

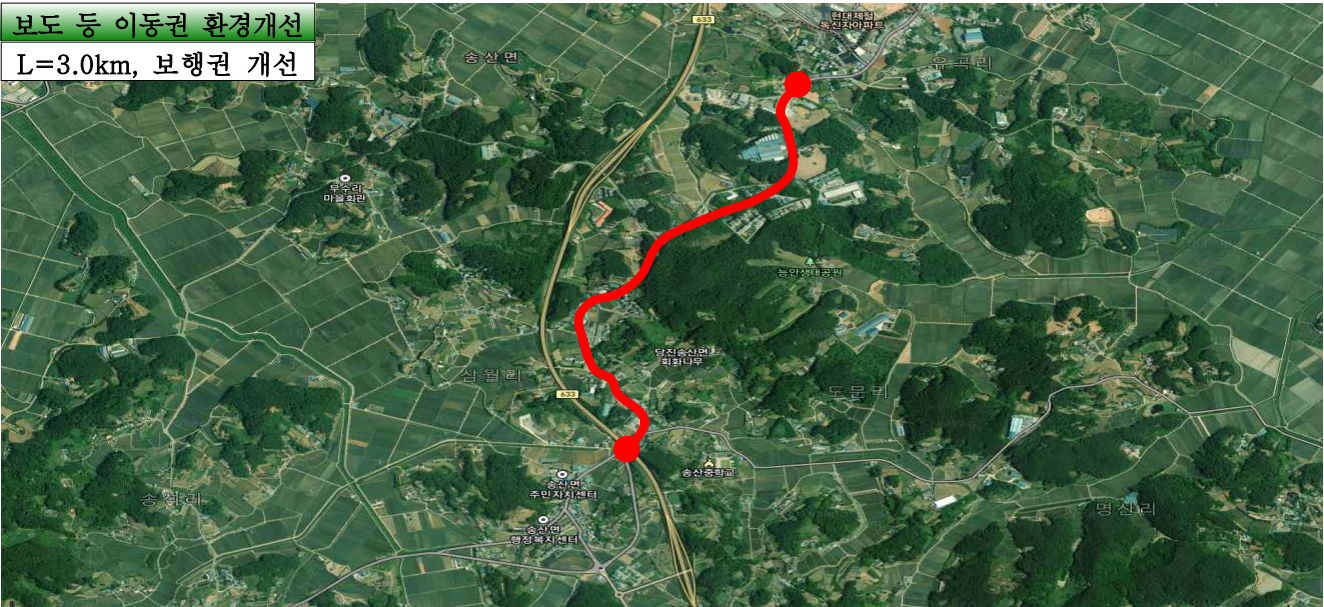

IV 추진 계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
송산 상거리 인근 ~ 유곡리 이주단지 간 보행환경개선	1km (유곡리~무수리)	1km (무수리~삼월리)	1km (삼월리~상거리)		

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	800	0	800	200	300	300			0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	800		800	200	300	300			
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- ('22.10.) 특별교부세 신청(800백만원)

VI 기대 효과

- 산업단지 등 출퇴근 차량과 보행자 간 교통혼잡을 방지하고 지역주민의 교통사고 예방

주관부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	박종욱(4360)	담 당 자	성두경(4364)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-30	복합환승센터 구축					
------	-----------	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	기반조성	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체/민간	사업기간	2022~2028	사업비	12,200백만원

I 추진배경

- 시내버스, 시외 및 고속버스, 택시 등의 대중교통 운행 중 각 수단간 연계 체계 미흡
- 서해선 복선전철 개통 예정 및 석문산단인입철도 계획추진으로 향후 철도 수송 부담률이 증가할 것으로 기대되며, 연계 교통체계 구축 필요
- ※ 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030) 반영 국비 확보

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26~'30)	-	반영		타당성 조사 및 개발계획 수립		개발계획 승인 및 지정	반영

- 복합환승센터 구축을 위한 사전 행정절차 이행으로 대중교통 경쟁력 제고

III 사업개요

- 사업위치 : 당진합덕역(가칭)(합덕읍 도리), 당진터미널(수청동)
- 사업기간 : 2022~2028
- 사업비 : 122억원
- 사업내용 : 복합환승센터(터미널, 환승주차장, 상업시설 등) 구축(30,000㎡)
- 인접 시·군(서산, 태안) 및 당진시 관광지를 잇는 원활한 연계교통시설 제공
- 환승센터 입지선정

구분		위치	주요 환승수단
환승센터	서해선 복선전철 당진합덕역(가칭)	합덕읍 도리 일원	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선), 전철, DRT
	당진터미널	수청동	시외버스, 시내버스(급행, 간선, 지선)

※ 출처 : 당진시 도시교통 정비 기본 및 중기계획(당진시 고시 제2019-180호)

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025	2026
제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획('26~'30)		타당성 조사 및 개발계획 수립		개발계획 승인 및 지정	반영

- 타당성 조사 및 개발계획 수립
 - 현황조사 및 분석, 관련 법규 검토, 환승시설의 적정규모, 기본구상 및 경제적 파급효과 분석
- 개발계획 승인 및 지정
 - 관계기관 협의 및 복합환승센터 승인·지정 고시
- 국가계획 반영
 - 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030) 신규사업 반영
- ※ 도로망 구축 등 도시계획시설 검토 및 민자유치

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	12,200	0	200	0	200	0	0	0	12,000
국비	6,000		0						6,000
도비	0		0						
시비	6,200		200		200				6,000
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- 타당성 조사 및 개발계획 수립 용역 2023년 본예산 요구
- 2022년 제3차 용역과제 심의 완료

VI 國·道 협 조 필요 사항

- 국토 지역균형발전 실현을 위해 「제4차 국가계획(2026~2030)」 신규사업 반영 요청
- 복합환승센터 승인·지정 등 신속한 행정절차 이행을 위한 원활한 협조 요청

VII 기대 효과

- 환승 시간 단축으로 대중교통 경쟁력 확보 및 이용자 편의 증가
- 이용자 중심의 최적 환승 동선 계획으로 환승 편의 획기적 개선
- 환승시설을 지역 성장의 거점으로 일자리 창출, 주민복지 증대 등 기대
- 솔뫼성지, 합덕제, 삽교천 등 시니어 시티투어 운영 기대

주관부서	교통과	부 서 장	최선묵(4520)	팀 장	이상문(4521)	담 당 자	이강민(4524)
협조부서	문화관광과	부 서 장	이종우(3570)	팀 장	신현숙(3590)	담 당 자	김윤희(3593)
협조부서	도시과	부 서 장	안병환(4400)	팀 장	이영필(4401)	담 당 자	양훈성(4404)
협조부서	도로과	부 서 장	김창민(4350)	팀 장	정금호(4370)	담 당 자	윤종근(4372)



6-31	기지사 버스터미널 신설						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	정상	추진율	-
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2023~2025	사업비	1,500백만원

I 추진배경

- 송악읍 도심권 확장에 따른 대중교통 수요 증가로 기지사 버스정류장 및 인근 도로가 상시 혼잡한 상황으로, 안전하고 편리한 대중교통 이용환경 조성을 위한 터미널 시설 필요

II 사업목표

[확인지표]

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025
기지사 버스터미널 신설	-	준공	2023년 본예산 반영	타당성 조사 및 개발계획 수립	토지 및 건물 매입	터미널 신축 및 운영

- 접근성, 기존 버스노선과 및 타 교통수단과의 연계 등을 고려한 사업대상지 선정
- 이용자수, 노선 횡수 등을 고려한 터미널 시설의 적정규모, 자원 조달

III 사업개요

- 사업위치 : 당진시 송악읍 기지시리 155-94 일원
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 1,500백만원
- 사업내용 : 승객이 이용하기 편리한 접근성 및 다른 교통수단과 쉽게 연계가 가능한 기존 기지사 버스정류장 인근에 버스터미널 신설

IV 추진계획

[추진계획]

단위사업	2022	2023	2024	2025
기지사 버스터미널 신설	2023년 본예산 반영	타당성 조사 및 개발계획 수립	토지 및 건물 매입	터미널 신축 및 운영

[투자계획]

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획						임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	1,500	0	1,500	0	50	1,000	450	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
시비	1,500		1,500		50	1,000	450		
민자	0		0						
기타	0		0						

V 추진 실적

- 기지시 버스터미널 신설 용역 2023년 본예산 요구
- 2022년 제3차 용역과제 심의 완료

VI 國·道 협 조 필요 사항

- 터미널 조성 시 도비 지원 및 행정절차 등 협조

VII 기대 효과

- 편리한 대중교통 이용환경 조성을 통한 정주 여건 개선
- 버스터미널 신축을 통한 교통혼잡 해소 등 주행환경 개선

주관부서	교통과	부 서 장	최선묵(4520)	팀 장	강충복(4540)	담 당 자	박상길(4543)
------	-----	-------	-----------	-----	-----------	-------	-----------

6-32	산업단지 환경감시기구 설치						
------	----------------	--	--	--	--	--	--

임기구분	임기내	추진목표	완료	추진상황	완료	추진율	100%
사업성격	신규	사업주체	자체	사업기간	2022	사업비	비예산

I 추진배경

- 환경문제 발생 후 단속하는 방식에서 벗어나 문제 발생 전 예방을 통해 환경오염 최소화
- 산업단지 등의 공장·기업 등을 대상으로 법적 절차 위반사항이 발생하지 않도록 안내·지도

II 사업목표

[확인지표] ('22.08.08. 완료)

단위사업	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경관리사업소 신설 및 운영	신설 여부	신설 및 운영	신설	지속운영			

III 사업개요

- 명칭 : 환경관리사업소(환경지도1·2팀)
- 위치 : 당진시 송악읍 부곡공단4길 53-13 당진근로자종합복지관
- 업무 : 환경오염물질 배출시설 사업장(공장)·배출업소 지도점검, 민간환경감시기구 운영, 미세먼지, 환경오염물질 측정 및 분석, 예방감시사업 등

IV 추진실적

- '시민 행복·경제도시 당진'구현을 위한 조직개편 완료('22.8.8.)
 - '환경관리사업소' 신설 : 환경오염 등 문제 발생 전 사전 예방(7명 배치)
 - (주요업무)
 - 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 환경분야 특별사법경찰 업무수행
 - 환경오염피해 배상책임·구제 및 대기·수질 배출부과금 부과 등

V 기대효과

- 환경오염에 대한 사전 예방 행정을 통해 환경오염 감소 및 인식 개선
- 산업단지 내외 사업장에 대한 법적 절차 이행 안내 및 사전 관리체계 강화

주관부서	자치행정과	부서장	김종현(3231)	팀장	곽신근(3240)	담당자	이명희(3241)
협조부서	환경관리사업소	부서장	박재근(3750)	팀장	원영미(6760)	담당자	김홍희(6751)
